

Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 4ª MEDIÇÃO CONTRATO 124/2025

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **4 medição do contrato para construção de uma U.E de seis salas no povoado tabuleiro dos batistas, no município de chapadinha.**

São Luís, MA – 17 de DEZEMBRO de 2025

BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:014291
13308

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2025.12.18
15:32:57 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
				QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	ATUAL	ACUM.
1			R\$ 34.598,47								R\$ 23.390,23
1.1	6,00	R\$ 5.604,12	R\$ 33.624,72	3,00	50%	1,00	17%	4,00	67%	R\$ 5.604,12	R\$ 22.416,48
1.2	240,00	R\$ 4,06	R\$ 973,75	240,00	100%	0,00	0%	240,00	100%	R\$ 973,75	R\$ 9.922,29
2			R\$ 9.922,29								R\$ 9.922,29
2.1	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	R\$ 750,00	R\$ 750,00
2.2	526,38	R\$ 4,64	R\$ 2.439,88	526,38	100%	0,00	0%	526,38	100%	R\$ 2.439,88	R\$ 2.439,88
2.3	8,00	R\$ 465,21	R\$ 3.721,70	8,00	100%	0,00	0%	8,00	100%	R\$ 3.721,70	R\$ 3.721,70
2.4	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69
2.5	1,00	R\$ 1.334,02	R\$ 1.334,02	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	R\$ 1.334,02	R\$ 1.334,02
3			R\$ 32.715,54								R\$ 32.715,54
3.1	31,50	R\$ 51,33	R\$ 1.616,90	31,50	100%	0,00	0%	31,50	100%	R\$ 1.616,90	R\$ 1.616,90
3.2	39,17	R\$ 80,09	R\$ 3.137,11	39,17	100%	0,00	0%	39,17	100%	R\$ 3.137,11	R\$ 3.137,11
3.3	53,00	R\$ 30,94	R\$ 1.640,02	53,00	100%	0,00	0%	53,00	100%	R\$ 1.640,02	R\$ 1.640,02
3.4	303,34	R\$ 86,77	R\$ 26.321,51	303,34	100%	0,00	0%	303,34	100%	R\$ 26.321,51	R\$ 26.321,51
4			R\$ 69.756,44								R\$ 69.756,44
4.1	25,40	R\$ 329,46	R\$ 8.368,39	25,40	100%	0,00	0%	25,40	100%	R\$ 8.368,39	R\$ 8.368,39
4.1.1			R\$ 8.368,39								R\$ 8.368,39
4.2			R\$ 42.977,14								R\$ 42.977,14
4.2.1	228,00	R\$ 117,34	R\$ 26.753,79	228,00	100%	0,00	0%	228,00	100%	R\$ 26.753,79	R\$ 26.753,79
4.2.2	31,36	R\$ 37,16	R\$ 1.165,44	31,36	100%	0,00	0%	31,36	100%	R\$ 1.165,44	R\$ 1.165,44
4.2.3	39,20	R\$ 46,45	R\$ 1.820,72	39,20	100%	0,00	0%	39,20	100%	R\$ 1.820,72	R\$ 1.820,72
4.2.4	380,94	R\$ 14,69	R\$ 5.596,44	380,94	100%	0,00	0%	380,94	100%	R\$ 5.596,44	R\$ 5.596,44
4.2.5	15,68	R\$ 487,29	R\$ 7.640,75	15,68	100%	0,00	0%	15,68	100%	R\$ 7.640,75	R\$ 7.640,75
4.3			R\$ 18.410,91								R\$ 18.410,91
4.3.1	52,98	R\$ 48,00	R\$ 2.543,11	52,98	100%	0,00	0%	52,98	100%	R\$ 2.543,11	R\$ 2.543,11
4.3.2	331,78	R\$ 14,69	R\$ 4.874,22	331,78	100%	0,00	0%	331,78	100%	R\$ 4.874,22	R\$ 4.874,22
4.3.3	132,59	R\$ 19,51	R\$ 2.586,88	132,59	100%	0,00	0%	132,59	100%	R\$ 2.586,88	R\$ 2.586,88
4.3.4	6,30	R\$ 487,29	R\$ 3.069,94	6,30	100%	0,00	0%	6,30	100%	R\$ 3.069,94	R\$ 3.069,94
4.3.5	6,30	R\$ 287,27	R\$ 1.809,81	6,30	100%	0,00	0%	6,30	100%	R\$ 1.809,81	R\$ 1.809,81
4.3.6	130,19	R\$ 27,09	R\$ 3.526,95	130,19	100%	0,00	0%	130,19	100%	R\$ 3.526,95	R\$ 3.526,95
5			R\$ 42.973,72								R\$ 42.973,72
5.1			R\$ 28.705,75								R\$ 28.705,75

5.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	64,49	R\$ 46,51	R\$	2.999,43	64,49	100%	0,00	0%	0,00	64,49	100%	R\$	-	R\$	2.999,43
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	971,65	R\$ 12,24	R\$	11.895,52	971,65	100%	0,00	0%	0,00	971,65	100%	R\$	-	R\$	11.895,52
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	241,11	R\$ 14,71	R\$	3.547,82	241,11	100%	0,00	0%	0,00	241,11	100%	R\$	-	R\$	3.547,82
5.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	13,25	R\$ 487,29	R\$	6.456,63	10,60	80%	2,65	20%	2,65	13,25	100%	R\$	1.291,33	R\$	6.456,63
5.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	13,25	R\$ 287,27	R\$	3.806,35	10,60	80%	2,65	20%	2,65	13,25	100%	R\$	761,27	R\$	3.806,35
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR			R\$	14.267,97								R\$	3.719,46	R\$	14.267,97
5.2.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	38,44	R\$ 48,00	R\$	1.845,17	38,44	100%	0,00	0%	0,00	38,44	100%	R\$	-	R\$	1.845,17
5.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	376,97	R\$ 12,24	R\$	4.615,09	376,97	100%	0,00	0%	0,00	376,97	100%	R\$	-	R\$	4.615,09
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	127,84	R\$ 19,51	R\$	2.494,20	127,84	100%	0,00	0%	0,00	127,84	100%	R\$	-	R\$	2.494,20
5.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	6,86	R\$ 487,29	R\$	3.342,83	2,06	30%	4,80	70%	4,80	6,86	100%	R\$	2.339,98	R\$	3.342,83
5.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	6,86	R\$ 287,27	R\$	1.970,68	2,06	30%	4,80	70%	4,80	6,86	100%	R\$	1.379,48	R\$	1.970,68
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES			R\$	123.521,00								R\$	15.908,35	R\$	123.521,00
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	1.003,05	R\$ 119,21	R\$	119.569,61	902,75	90%	100,31	10%	100,31	1.003,05	100%	R\$	11.956,96	R\$	119.569,61
6.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS, AF. 03/2016	30,60	R\$ 48,28	R\$	1.477,28		0%	30,60	100%	30,60	30,60	100%	R\$	1.477,28	R\$	1.477,28
6.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM, AF. 03/2024	46,70	R\$ 52,98	R\$	2.474,11		0%	46,70	100%	46,70	46,70	100%	R\$	2.474,11	R\$	2.474,11
7	COBERTURA METÁLICA			R\$	123.446,11								R\$	-	R\$	-
7.1	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03			R\$	48.964,45								R\$	-	R\$	-
7.1.1	ESTRUTURA TRELIXADA DE COBERTURA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 PSA	182,32	R\$ 119,06	R\$	19.326,25		0%		0%	0,00	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
7.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	1.574,83	R\$ 18,82	R\$	29.638,20		0%		0%	0,00	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
7.2	EDIFICAÇÃO			R\$	74.481,66								R\$	-	R\$	-
7.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	6,00	R\$ 1.145,26	R\$	6.871,56		0%		0%	0,00	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
7.2.2	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUIPIM INCOLOR OU SIMILAR	420,21	R\$ 85,62	R\$	35.979,81		0%		0%	0,00	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
7.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	420,21	R\$ 50,04	R\$	21.027,32		0%		0%	0,00	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
7.2.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	70,70	R\$ 58,90	R\$	4.163,94		0%		0%	0,00	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
7.2.6	Peitoni de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	18,60	R\$ 46,48	R\$	864,61		0%		0%	0,00	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
8	REVESTIMENTO			R\$	124.421,18								R\$	42.675,38	R\$	42.675,38
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	2.006,10	R\$ 7,76	R\$	15.561,18		0%	1.805,48	90%	1.805,48	1.805,48	90%	R\$	14.005,06	R\$	14.005,06
8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	1.637,77	R\$ 38,90	R\$	63.711,83		0%	737,00	45%	737,00	737,00	45%	R\$	28.670,32	R\$	28.670,32

8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	129,40	R\$ 37,17	R\$ 4.810,34	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	129,40	R\$ 79,53	R\$ 10.290,88	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓLOGOS, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 - P/ FACHADAS	238,87	R\$ 95,75	R\$ 22.871,10	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
8.6	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) PARA FACHADAS	238,87	R\$ 30,04	R\$ 7.175,85	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
9	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 50.385,94							R\$
9.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 P/ CONTRAPISO INTERNO	14,82	R\$ 703,18	R\$ 10.421,14	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	446,62	R\$ 72,96	R\$ 32.585,95	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
9.3	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0,34	R\$ 758,59	R\$ 257,92	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm	7,35	R\$ 703,18	R\$ 5.168,38	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
9.5	SOLEIRA DE GRANITO L = 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	20,60	R\$ 94,79	R\$ 1.952,65	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
10	FORRO			R\$ 29.952,78							R\$
10.1	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar.	344,80	R\$ 86,87	R\$ 29.952,78	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11	ESQUADRIAS			R\$ 65.490,21							R\$
11.1	PORTAS			R\$ 41.492,75							R\$
11.1.1	Porta em madeira de lei, almotofada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	1,00	R\$ 1.443,10	R\$ 1.443,10	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.1.2	Porta em madeira de lei, almotofada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	14,00	R\$ 1.568,32	R\$ 21.956,48	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.1.3	Porta em madeira de lei, almotofada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	1,00	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.1.4	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	R\$ 327,12	R\$ 327,12	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.1.5	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	5,40	R\$ 418,27	R\$ 2.258,66	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.1.6	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	9,50	R\$ 484,73	R\$ 4.604,96	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.1.7	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	4,20	R\$ 2.162,10	R\$ 9.080,83	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.2	JANELAS			R\$ 14.374,32							R\$
11.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	14,25	R\$ 761,28	R\$ 10.848,21	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.2.2	Peitoil granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	28,15	R\$ 125,26	R\$ 3.526,11	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO			R\$ 9.623,14							R\$
11.3.1	Grade em metalon	37,76	R\$ 254,85	R\$ 9.623,14	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 44.660,49							R\$
12.1	QUADROS E DISJUNTORES			R\$ 1.072,64							R\$
12.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	R\$ 178,94	R\$ 178,94	0%	0,00	0%	R\$	R\$	-	R\$

14.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	R\$ 74,19	R\$ 74,19	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	R\$ 35,20	R\$ 35,20	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	R\$ 17,97	R\$ 17,97	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1,00	R\$ 32,97	R\$ 32,97	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.6	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	1,00	R\$ 34,52	R\$ 34,52	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.7	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	1,00	R\$ 1.225,30	R\$ 1.225,30	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	100,00	R\$ 5,08	R\$ 507,55	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12,00	R\$ 16,94	R\$ 203,25	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	15,00	R\$ 26,74	R\$ 401,09	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.1.11	REGISTRO DE GAVETA C/CAINOPLA CROMADA D= 25mm (1")	5,00	R\$ 127,78	R\$ 638,88	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$ 18.847,22	R\$ 18.847,22					R\$	R\$
14.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	18,00	R\$ 231,52	R\$ 4.167,36	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	R\$ 44,92	R\$ 179,66	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	100,00	R\$ 31,72	R\$ 3.171,62	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,00	R\$ 22,79	R\$ 683,64	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.5	CAIXA DE PASSAGEM CPT-060 (40X40X60CM)	4,00	R\$ 317,73	R\$ 1.270,92	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.6	CAIXA DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	1,00	R\$ 379,00	R\$ 379,00	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.7	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/MATERIAL)	4,00	R\$ 63,28	R\$ 253,14	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	12,00	R\$ 47,48	R\$ 569,76	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.9	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL.: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	R\$ 4.721,67	R\$ 4.721,67	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.2.10	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	R\$ 3.450,45	R\$ 3.450,45	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.3	DRENO AR CONDICIONADO		R\$ 926,56	R\$ 926,56					R\$	R\$

14.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	58,00	R\$ 14,59	R\$ 846,43	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
14.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13,00	R\$ 6,16	R\$ 80,13	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		R\$ 23.432,60						R\$	R\$
15.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	1,00	R\$ 327,12	R\$ 327,12	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	R\$ 363,52	R\$ 727,04	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.3	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2" , DE *56 X 33 X 12* CM	1,00	R\$ 212,30	R\$ 212,30	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	3,00	R\$ 76,69	R\$ 230,08	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.5	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	6,00	R\$ 656,77	R\$ 3.940,61	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.6	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA.	17,00	R\$ 11,99	R\$ 203,86	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.7	TORNEIRA P/PIA COZINHA D=12" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159- C39 OU SIMILAR)	6,00	R\$ 721,34	R\$ 4.328,03	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.8	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO. 1/2 X 1/2 OU SIMILAR.	1,00	R\$ 168,85	R\$ 168,85	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.9	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	1,00	R\$ 384,80	R\$ 384,80	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.10	DIVISÓRIA DE LOUÇA BRANCA com sifão integrado - engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto de fixação	6,42	R\$ 553,53	R\$ 3.553,65	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.11	Mictório de louça branca com sifão integrado - engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto de fixação	18,54	R\$ 470,04	R\$ 8.714,45	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
15.12	Mictório de louça branca com sifão integrado - engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto de fixação	1,00	R\$ 641,81	R\$ 641,81	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16	PINTURAS E ACABAMENTOS		R\$ 33.794,80						R\$	R\$
16.1	PINTURA INTERNA		R\$ 14.940,72						R\$	R\$
16.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	446,78	R\$ 4,73	R\$ 2.112,38	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.1.2	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	446,78	R\$ 14,79	R\$ 6.609,70	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	446,78	R\$ 13,92	R\$ 6.218,64	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.2	PINTURA EXTERNA		R\$ 13.661,26						R\$	R\$
16.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF. 06/2014	408,52	R\$ 4,73	R\$ 1.931,48	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.2.2	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL	408,52	R\$ 14,79	R\$ 6.043,67	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	408,52	R\$ 13,92	R\$ 5.686,11	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.3	PINTURA DE ESQUADRIAS		R\$ 5.192,82						R\$	R\$
16.3.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	77,95	R\$ 21,11	R\$ 1.645,78	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	77,95	R\$ 18,43	R\$ 1.281,01	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
16.3.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	77,95	R\$ 29,07	R\$ 2.266,03	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA		R\$ 5.866,67						R\$	R\$
17.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 479,10						R\$	R\$
17.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1.50M	3,07	R\$ 51,33	R\$ 157,58	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	2,56	R\$ 80,09	R\$ 205,03	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.1.3	REATERRO APOIADO	2,56	R\$ 45,51	R\$ 116,49	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2	INFRAESTRUTURA		R\$ 2.481,99						R\$	R\$
17.2.1	ALICERCE		R\$ 418,42						R\$	R\$
17.2.1.1	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	1,27	R\$ 329,46	R\$ 418,42	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.2	BLOCOS DE FUNDACÃO		R\$ 1.394,70						R\$	R\$
17.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	0,64	R\$ 37,16	R\$ 23,78	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$

17.2.2.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	3,20	R\$ 48,88	R\$ 156,43	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	61,44	R\$ 14,69	R\$ 902,62	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	0,64	R\$ 487,29	R\$ 311,87	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR		R\$	669,97					R\$	R\$
17.2.3.1	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	1,00	R\$ 33,58	R\$ 33,58	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	15,80	R\$ 14,69	R\$ 232,12	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	6,81	R\$ 19,51	R\$ 132,87	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	0,36	R\$ 723,76	R\$ 260,55	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.2.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	0,36	R\$ 27,09	R\$ 9,75	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		R\$	1.234,36					R\$	R\$
17.3.1	PILARES		R\$	569,77					R\$	R\$
17.3.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	1,16	R\$ 46,51	R\$ 53,95	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	16,66	R\$ 12,24	R\$ 203,96	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	2,98	R\$ 14,71	R\$ 43,85	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	0,55	R\$ 487,29	R\$ 268,01	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.2	VIGAS		R\$	664,59					R\$	R\$
17.3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	1,00	R\$ 92,01	R\$ 92,01	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	15,80	R\$ 14,69	R\$ 232,12	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	5,54	R\$ 19,51	R\$ 108,09	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	0,30	R\$ 487,29	R\$ 146,19	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	0,30	R\$ 287,27	R\$ 86,18	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.4	LAJE		R\$	1.671,22					R\$	R\$
17.4.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	6,25	R\$ 200,47	R\$ 1.252,96	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
17.4.2	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	6,25	R\$ 66,92	R\$ 418,26	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$	5.881,54					R\$	R\$
18.1	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	5,85	R\$ 119,06	R\$ 696,52	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
18.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUIDOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020. PSA	56,76	R\$ 18,82	R\$ 1.068,22	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
18.3	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) cortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos, - fornecimento e montagem	5,32	R\$ 635,85	R\$ 3.382,72	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
18.4	DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. AF. 07/2019	4,00	R\$ 53,22	R\$ 212,86	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$

Lucas de B. Monteles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

18.5	Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar.	6,00	R\$ 86,87	R\$	521,22		0%			0%	0,00		R\$	
19	SERVICOS FINAIS			R\$	1.238,77								R\$	
19.1	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACRILICO	1,00	R\$ 285,38	R\$	285,38		0%			0%	0,00		R\$	
19.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	476,16	R\$ 2,00	R\$	953,39		0%			0%	0,00		R\$	
	VALOR TOTAL SEM DBI			R\$	852.626,96		32,26%			8,21%	40,47%		R\$	69.959,91 R\$ 344.954,60
	BDI 28,82%			R\$	245.727,09								R\$	20.162,45 R\$ 99.415,92
	VALOR TOTAL:			R\$	1.098.354,05								R\$	90.122,36 R\$ 444.370,51
VALOR DA OBRA: R\$ 1.098.354,05 (UM MILHÃO E NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)														
VALOR DA 4ª MEDIÇÃO R\$ 90.122,36 (NOVENTA MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)														
SALDO DA PROPOSTA: R\$ 653.983,54														


Lucas de B. Monteles
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico para 4ª medição realizada "in loco" na escola de 6 salas NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS, no município Chapadinda - MA, 65500-000.

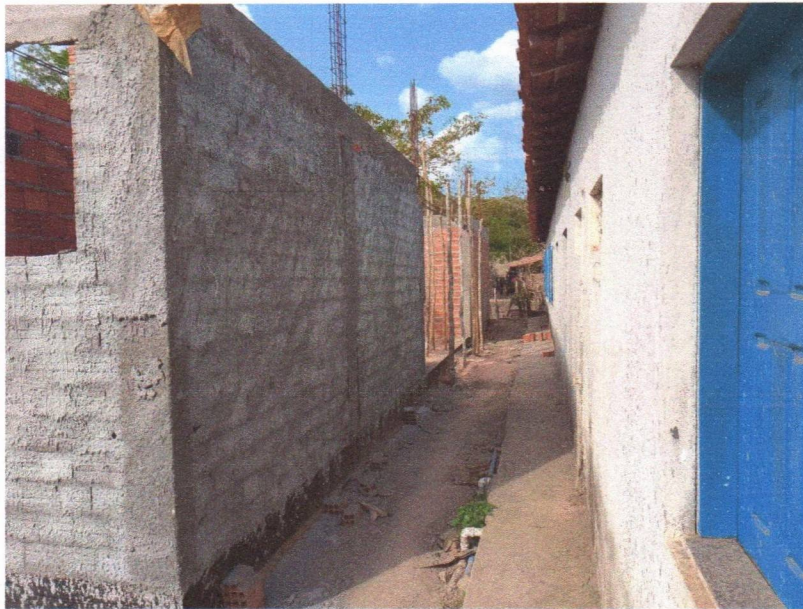


Imagem 1 – Execução da alvenaria, concretagem dos pilares e chapisco.



Imagem 2 – Execução da viga superior e calçada.



Imagem 3 – Execução da viga superior.



Imagem 4 – Execução da viga superior e do chapisco.



Imagem 5 – Execução da viga superior e do chapisco.

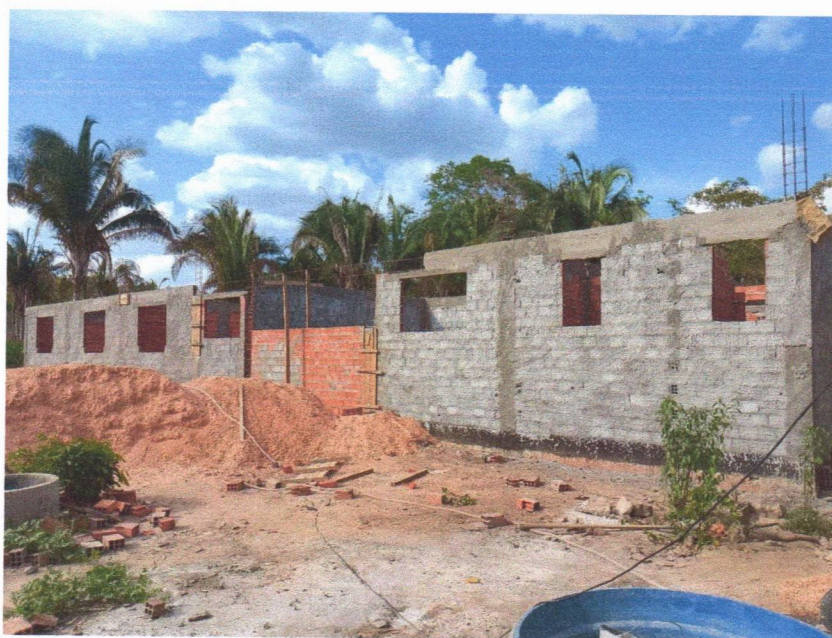


Imagem 6 – Execução da viga superior e do chapisco.



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS
 QUARTA
 19/11 A 17/12
 17/12/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 34.598,47			
1.1	COMP 001	Composições Especiais	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	R\$ 5.604,12	R\$ 33.624,72	3,00	R\$ 16.812,36	R\$ 11.208,24
1.2	240101	CAEIMA	DESENCAMAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	240,00	R\$ 4,06	R\$ 973,75	240,00	R\$ 973,75	R\$ 0,00
2			REVENHOS PRELIMINARES				R\$ 9.922,29			
2.1	S11387	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DE 10 X 2,00M INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00
2.2	C3528	SEINFRA	MULTIÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	526,38	R\$ 4,64	R\$ 2.439,88	526,38	R\$ 2.439,88	R\$ 0,00
2.3	COMP - 1310	Composições Especiais	BARRACÃO DA OBRA	M2	8,00	R\$ 465,21	R\$ 3.721,70	8,00	R\$ 3.721,70	R\$ 0,00
2.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 0,00
2.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	UN	1,00	R\$ 1.334,02	R\$ 1.334,02	1,00	R\$ 1.334,02	R\$ 0,00
3			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA				R\$ 32.715,54			
3.1	S02497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m	m3	31,50	R\$ 51,33	R\$ 1.616,90	31,50	R\$ 1.616,90	R\$ 0,00
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO, AF_02/2021	M3	39,17	R\$ 80,09	R\$ 3.137,11	39,17	R\$ 3.137,11	R\$ 0,00
3.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	M2	53,00	R\$ 30,94	R\$ 1.640,02	53,00	R\$ 1.640,02	R\$ 0,00
3.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	M3	303,34	R\$ 86,77	R\$ 26.321,51	303,34	R\$ 26.321,51	R\$ 0,00
4			INFRAESTRUTURA				R\$ 69.756,44			
4.1			ALICERCE				R\$ 8.368,39			
4.1.1	C3529	SEINFRA	MULTIÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,40	R\$ 329,46	R\$ 8.368,39	25,40	R\$ 8.368,39	R\$ 0,00
4.2			SAPATAS ISOLADAS				R\$ 45.977,14			
4.2.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	M	228,00	R\$ 117,34	R\$ 26.753,79	228,00	R\$ 26.753,79	R\$ 0,00
4.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	31,36	R\$ 37,16	R\$ 1.165,44	31,36	R\$ 1.165,44	R\$ 0,00
4.2.3	S11657	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	39,20	R\$ 46,45	R\$ 1.820,72	39,20	R\$ 1.820,72	R\$ 0,00
4.2.4	96546	SINAPI	ARMADA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	380,94	R\$ 14,69	R\$ 5.596,44	380,94	R\$ 5.596,44	R\$ 0,00
4.2.5	S94984S	ORSE	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2018	m3	15,68	R\$ 487,29	R\$ 7.640,75	15,68	R\$ 7.640,75	R\$ 0,00
4.3			CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR				R\$ 19.410,81			
4.3.1	S11652	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	52,98	R\$ 48,00	R\$ 2.543,11	52,98	R\$ 2.543,11	R\$ 0,00
4.3.2	96546	SINAPI	ARMADA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	331,78	R\$ 14,69	R\$ 4.874,22	331,78	R\$ 4.874,22	R\$ 0,00
4.3.3	96543	SINAPI	ARMADA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	132,59	R\$ 19,51	R\$ 2.586,88	132,59	R\$ 2.586,88	R\$ 0,00
4.3.4	94984	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	6,30	R\$ 487,29	R\$ 3.069,94	6,30	R\$ 3.069,94	R\$ 0,00
4.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	6,30	R\$ 287,27	R\$ 1.809,81	6,30	R\$ 1.809,81	R\$ 0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS
 QUARTA
 Nº DA MEDIÇÃO: 19/11 A 17/12
 PERÍODO: 17/12/2023
 DATA:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO	
4.3.6	S04953	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOES DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO, DA VEDACÃO OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACÃO	m2	130,19	R\$ 27,09	R\$ 3.526,95	130,19	R\$ 3.526,95	R\$ 0,00	0,00%
5			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 42.973,72				
5.1			PILARES				R\$ 28.705,75				
5.1.1	S07463	ORSE	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	64,49	R\$ 46,51	R\$ 2.999,43	64,49	R\$ 2.999,43	R\$ 0,00	0,00%
5.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	971,65	R\$ 12,24	R\$ 11.895,52	971,65	R\$ 11.895,52	R\$ 0,00	0,00%
5.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	241,11	R\$ 14,71	R\$ 3.547,82	241,11	R\$ 3.547,82	R\$ 0,00	0,00%
5.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	13,25	R\$ 487,29	R\$ 6.456,63	13,25	R\$ 6.456,63	R\$ 0,00	0,00%
5.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M3	13,25	R\$ 287,27	R\$ 3.806,35	13,25	R\$ 3.806,35	R\$ 0,00	0,00%
5.2			CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR				R\$ 14.267,97				
5.2.1	S11652	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	m2	38,44	R\$ 48,00	R\$ 1.845,17	38,44	R\$ 1.845,17	R\$ 0,00	0,00%
5.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	376,97	R\$ 12,24	R\$ 4.615,09	376,97	R\$ 4.615,09	R\$ 0,00	0,00%
5.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	127,84	R\$ 19,51	R\$ 2.494,20	127,84	R\$ 2.494,20	R\$ 0,00	0,00%
5.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	6,86	R\$ 487,29	R\$ 3.342,83	6,86	R\$ 3.342,83	R\$ 0,00	0,00%
5.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M3	6,86	R\$ 287,27	R\$ 1.970,68	6,86	R\$ 1.970,68	R\$ 0,00	0,00%
6			ALVENARIA E VEDAÇÕES				R\$ 123.521,00				
6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	1.003,05	R\$ 119,21	R\$ 119.599,61	1.003,05	R\$ 119.599,61	R\$ 0,00	0,00%
6.2	S931995	ORSE	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS, AF. 03/2016	m	30,60	R\$ 48,28	R\$ 1.477,28	30,60	R\$ 1.477,28	R\$ 0,00	0,00%
6.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM, AF. 03/2024	M	46,70	R\$ 52,96	R\$ 2.474,11	46,70	R\$ 2.474,11	R\$ 0,00	0,00%
7			COBERTURA METÁLICA				R\$ 123.446,11				
7.1	S09075	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapézoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	m2	162,32	R\$ 119,06	R\$ 19.326,25	162,32	R\$ 19.326,25	R\$ 0,00	100,00%
7.1.2	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRILICADA DE COBERTURA METÁLICA, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020, PSA	KG	1.574,83	R\$ 18,82	R\$ 29.638,20	1.574,83	R\$ 29.638,20	R\$ 0,00	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POÇADO TABULEIRO DOS BATISTAS												
QUARTA												
19/11 A 17/12												
17/12/2025												
PLANILHA ORÇAMENTARIA												
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO EDIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO		
7.2						R\$	R\$ 74.481,86					
7.2.1	92588	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	R\$ 1.145,26	R\$ 6.871,56	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.871,56	100,00%
7.2.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	420,21	R\$ 85,62	R\$ 35.979,81	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.979,81	100,00%
7.2.3	S03864	ORSE	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUIPIM INCOLOR OU SIMILAR	M2	420,21	R\$ 13,27	R\$ 5.574,42	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.574,42	100,00%
7.2.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	420,21	R\$ 50,04	R\$ 21.027,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.027,32	100,00%
7.2.5	S100327S	ORSE	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m	70,70	R\$ 58,90	R\$ 4.183,94	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.183,94	100,00%
7.2.6	S03410	ORSE	Petiroll de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	18,60	R\$ 46,48	R\$ 864,61	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 864,61	100,00%
8			REVESTIMENTO			R\$	124.421,18					
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.006,10	R\$ 7,76	R\$ 15.561,18	1805,49	R\$ -	R\$ 14.005,06	R\$ 1.556,12	10,00%
8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 8M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.637,77	R\$ 38,90	R\$ 63.711,83	737,00	R\$ -	R\$ 28.670,32	R\$ 35.041,51	55,00%
8.3	87532	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	129,40	R\$ 37,17	R\$ 4.810,34	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.810,34	100,00%
8.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	129,40	R\$ 79,53	R\$ 10.290,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.290,88	100,00%
8.5	S07607	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓLOGOS, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV.04 - P/ FACHADAS	m2	238,67	R\$ 95,75	R\$ 22.871,10	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.871,10	100,00%
8.6	C1877	SEINFRA	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U) PARA FACHADAS	M	238,67	R\$ 30,04	R\$ 7.175,85	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.175,85	100,00%
9			PAVIMENTAÇÃO			R\$	50.385,94					
9.1	S94981S	ORSE	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 P/ CONTRAPISO INTERNO	m3	14,82	R\$ 703,18	R\$ 10.421,14	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.421,14	100,00%
9.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	446,62	R\$ 72,96	R\$ 32.585,85	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.585,85	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

QUARTA

19/11 A 17/12

17/12/2025

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO
9.3	S94960S	ORSE	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m3	0,34	R\$ 756,59	R\$ 257,92	0,00	R\$ -	R\$ 257,92
9.4	S94991S	ORSE	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm	m3	7,35	R\$ 703,18	R\$ 5.168,38	0,00	R\$ -	R\$ 5.168,38
9.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/BANHEIROS E LAVABOS	M	20,60	R\$ 94,79	R\$ 1.952,65	0,00	R\$ -	R\$ 1.952,65
10			FORRO				R\$ 29.952,78			
10.1	S04726	ORSE	Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e 12mm de espessura em fita PVC, marca MCD- LINE, modelo Lirio ou similar, instalado	m2	344,80	R\$ 86,87	R\$ 29.952,78	0,00	R\$ -	R\$ 29.952,78
11			ESQUADRIAS				R\$ 65.490,21			
11.1			PORTAS				R\$ 41.492,75			
11.1.1	S03539	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	R\$ 1.443,10	R\$ 1.443,10	0,00	R\$ -	R\$ 1.443,10
11.1.2	S03540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	14,00	R\$ 1.568,32	R\$ 21.956,48	0,00	R\$ -	R\$ 21.956,48
11.1.3	S03541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	0,00	R\$ -	R\$ 1.821,60
11.1.4	100974	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 327,12	R\$ 327,12	0,00	R\$ -	R\$ 327,12
11.1.5	00004917	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	M2	5,40	R\$ 418,27	R\$ 2.258,66	0,00	R\$ -	R\$ 2.258,66
11.1.6	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	M2	9,50	R\$ 484,73	R\$ 4.604,96	0,00	R\$ -	R\$ 4.604,96
11.1.7	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 2000x210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	4,20	R\$ 2.162,10	R\$ 9.080,83	0,00	R\$ -	R\$ 9.080,83
11.2			JANELAS				R\$ 14.374,32			
11.2.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,25	R\$ 761,28	R\$ 10.848,21	0,00	R\$ -	R\$ 10.848,21
11.2.2	S01988	ORSE	Pelotini granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,15	R\$ 125,26	R\$ 3.526,11	0,00	R\$ -	R\$ 3.526,11
11.3			GRADE DE PROTEÇÃO				R\$ 9.623,14			
11.3.1	I04406	ORSE	Grade em metalon	m2	37,76	R\$ 254,85	R\$ 9.623,14	0,00	R\$ -	R\$ 9.623,14
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 44.660,49			
12.1			QUADROS E DISJUNTORES				R\$ 1.072,64			
12.1.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 178,94	R\$ 178,94	0,00	R\$ -	R\$ 178,94
12.1.2	00013595	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 440,10	R\$ 440,10	0,00	R\$ -	R\$ 440,10
12.1.3	C1131	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 90A	UN	1,00	R\$ 142,30	R\$ 142,30	0,00	R\$ -	R\$ 142,30
12.1.4	S09041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	R\$ 85,92	R\$ 85,92	0,00	R\$ -	R\$ 85,92
12.1.5	96655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	R\$ 12,52	R\$ 137,73	0,00	R\$ -	R\$ 137,73



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO		CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POÇADO TABULEIRO DOS BATISTAS	
Nº DA MEDIÇÃO	QUARTA		
PERÍODO	19/11 A 17/12		
DATA	17/12/2025		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				VALORES				SALDO			
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO	
12.1.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	7,00	R\$ 12,52	R\$ 87,65	0,00	R\$ -	R\$ 87,65	100,00%
12.2		ORSE	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO			R\$ 20.528,56					
12.2.1	S13148	ORSE	Refleitor Slim LED 100W de potência branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar.	un	10,00	R\$ 81,80	R\$ 817,97	0,00	R\$ -	R\$ 817,97	100,00%
12.2.2	97989	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020.	UN	52,00	R\$ 53,22	R\$ 2.767,33	0,00	R\$ -	R\$ 2.767,33	100,00%
12.2.3	S03398	ORSE	Ponto de tomada 2x4 ABNT, 10 A, de uso geral, em peças, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	55,00	R\$ 255,81	R\$ 14.069,53	0,00	R\$ -	R\$ 14.069,53	100,00%
12.2.4	S03287	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00	R\$ 202,23	R\$ 1.415,64	0,00	R\$ -	R\$ 1.415,64	100,00%
12.2.5	S03282	ORSE	Ponto de interruptor 02-seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	6,00	R\$ 243,02	R\$ 1.458,11	0,00	R\$ -	R\$ 1.458,11	100,00%
12.3		ORSE	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			R\$ 13.264,57					
12.3.1	S03801	ORSE	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SEÇÃO 18MM², 450/750V / 70°C	m	60,00	R\$ 20,50	R\$ 1.229,88	0,00	R\$ -	R\$ 1.229,88	100,00%
12.3.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², PARA CHAMAS 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	M	600,00	R\$ 3,05	R\$ 1.832,70	0,00	R\$ -	R\$ 1.832,70	100,00%
12.3.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², PARA CHAMAS 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	M	800,00	R\$ 4,47	R\$ 3.573,30	0,00	R\$ -	R\$ 3.573,30	100,00%
12.3.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO	M	680,00	R\$ 9,75	R\$ 6.628,69	0,00	R\$ -	R\$ 6.628,69	100,00%
12.4		ORSE	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS			R\$ 8.343,14					
12.4.1	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	750,00	R\$ 10,62	R\$ 7.962,18	0,00	R\$ -	R\$ 7.962,18	100,00%
12.4.2	S00355	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 40MM (1 1/4")	m	20,00	R\$ 19,05	R\$ 380,96	0,00	R\$ -	R\$ 380,96	100,00%
12.5		SEINFRA	SISTEMA DE ATERRAMENTO			R\$ 1.451,90					
12.5.1	C0328	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	2,00	R\$ 322,67	R\$ 645,34	0,00	R\$ -	R\$ 645,34	100,00%
12.5.2	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	20,00	R\$ 23,63	R\$ 472,56	0,00	R\$ -	R\$ 472,56	100,00%
12.5.3	S00553	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diam = 25mm (3/4")	m	15,00	R\$ 11,15	R\$ 167,19	0,00	R\$ -	R\$ 167,19	100,00%
12.5.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	1,00	R\$ 138,57	R\$ 138,57	0,00	R\$ -	R\$ 138,57	100,00%
12.5.5	H1179	ORSE	Conector em laço tipo minigar para cabos 16 - 50 mm²	un	1,00	R\$ 27,90	R\$ 27,90	0,00	R\$ -	R\$ 27,90	100,00%
13		ORSE	COMPOSIÇÃO DE CORDATE ATENDIMENTO A S. URSULA			R\$ 3.378,25					
13.1	S03598	ORSE	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUERRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 11/2022 P/ TOMADAS ALTA	pt	10,00	R\$ 246,90	R\$ 2.469,05	0,00	R\$ -	R\$ 2.469,05	100,00%
13.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	10,00	R\$ 18,30	R\$ 183,04	0,00	R\$ -	R\$ 183,04	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVODADO TABULEIRO DOS BATISTAS												
QUARTA												
19/11 A 17/12												
17/12/2025												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO	100.00%	100.00%
13.3	137556S	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	2,00	R\$ 22,65	R\$ 45,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,30	100,00%
13.4	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020, PE	UN	2,00	R\$ 239,68	R\$ 479,36	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 479,36	100,00%
13.5	I12721	ORSE	Placa indicativa de "SAÍDA", adesiva, dim.: 20 x 30 cm	Un	10,00	R\$ 20,15	R\$ 201,50	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,50	100,00%
14			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 27.190,16					
14.1			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 7.416,38					
14.1.1	C:1948	SEINFRA	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	17,00	R\$ 249,73	R\$ 4.245,46	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.245,46	100,00%
14.1.2	94462	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2016	UN	1,00	R\$ 74,19	R\$ 74,19	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,19	100,00%
14.1.3	94469	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	1,00	R\$ 35,20	R\$ 35,20	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,20	100,00%
14.1.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2016	UN	1,00	R\$ 17,97	R\$ 17,97	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,97	100,00%
14.1.5	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2016	UN	1,00	R\$ 32,97	R\$ 32,97	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,97	100,00%
14.1.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 34,52	R\$ 34,52	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,52	100,00%
14.1.7	00034640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.225,30	R\$ 1.225,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.225,30	100,00%
14.1.8	89446	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS, PARA AF_10/2015	M	100,00	R\$ 5,08	R\$ 507,55	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,55	100,00%
14.1.9	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	12,00	R\$ 16,94	R\$ 203,25	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,25	100,00%
14.1.10	103979	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS, AF_10/2015	M	15,00	R\$ 26,74	R\$ 401,09	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,09	100,00%
14.1.11	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA, CROMADA D= 25mm (1")	UN	5,00	R\$ 127,78	R\$ 638,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 638,88	100,00%
14.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 18.947,22					
14.2.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	R\$ 231,52	R\$ 4.167,36	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.167,36	100,00%
14.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	4,00	R\$ 44,92	R\$ 179,66	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,66	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO FOYVADO TABULEIRO DOS BATISTAS

QUARTA

19/11 A 17/12

17/12/2025

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO	
14.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	100,00	R\$ 31,72	R\$ 3.171,62	0,00	R\$ -	R\$ 3.171,62	100,00%
14.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	30,00	R\$ 22,79	R\$ 683,64	0,00	R\$ -	R\$ 683,64	100,00%
14.2.5	S05396	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CPT-1050,(40X40X60CM)	un	4,00	R\$ 317,73	R\$ 1.270,92	0,00	R\$ -	R\$ 1.270,92	100,00%
14.2.6	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	R\$ 379,00	R\$ 379,00	0,00	R\$ -	R\$ 379,00	100,00%
14.2.7	C3738	SEINFRA	INSTALACAO DE TUBO DE VENTILACAO 50MM/CM L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C)	UN	4,00	R\$ 63,28	R\$ 253,14	0,00	R\$ -	R\$ 253,14	100,00%
14.2.8	89954	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 47,48	R\$ 569,76	0,00	R\$ -	R\$ 569,76	100,00%
14.2.9	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3459 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 4.721,67	R\$ 4.721,67	0,00	R\$ -	R\$ 4.721,67	100,00%
14.2.10	98052	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020, PA	UN	1,00	R\$ 3.450,45	R\$ 3.450,45	0,00	R\$ -	R\$ 3.450,45	100,00%
14.3			DRENO AR CONDICIONADO			R\$ 926,96					
14.3.1	89885	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	58,00	R\$ 14,59	R\$ 846,43	0,00	R\$ -	R\$ 846,43	100,00%
14.3.2	89886	SINAPI	JELOHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 6,16	R\$ 80,13	0,00	R\$ -	R\$ 80,13	100,00%
15			LOUCAS, ACESSÓRIOS E METAIS			R\$ 23.432,60					
15.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 327,12	R\$ 327,12	0,00	R\$ -	R\$ 327,12	100,00%
15.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 363,52	R\$ 727,04	0,00	R\$ -	R\$ 727,04	100,00%
15.3	00001747	SINAPI	CLUBA ACO INOX (ANSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3/12" DE 46 X 33 X 12" CM	UN	1,00	R\$ 212,30	R\$ 212,30	0,00	R\$ -	R\$ 212,30	100,00%
15.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUISE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 76,69	R\$ 230,08	0,00	R\$ -	R\$ 230,08	100,00%
15.5	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUCA BRANCA, CAIXA ACORRIADA, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 656,77	R\$ 3.940,61	0,00	R\$ -	R\$ 3.940,61	100,00%
15.6	86885	SINAPI	CLUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE, 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	un	17,00	R\$ 11,99	R\$ 203,86	0,00	R\$ -	R\$ 203,86	100,00%
15.7	S04768	ORSE	CLUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE, 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	un	6,00	R\$ 721,34	R\$ 4.328,03	0,00	R\$ -	R\$ 4.328,03	100,00%
15.8	I02258	ORSE	TORNEIRA PIA COZINHA D=1127 (LINHA STANDARD, DECA, REF 1459-C38 OU SIMILAR)	un	1,00	R\$ 168,85	R\$ 168,85	0,00	R\$ -	R\$ 168,85	100,00%
15.9	I02016	ORSE	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE DECA, REF. 1860.C112, ACABAMENTO CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" OU SIMILAR	un	1,00	R\$ 384,80	R\$ 384,80	0,00	R\$ -	R\$ 384,80	100,00%
15.10	S10759	ORSE	BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, F=22CM	m2	6,42	R\$ 553,53	R\$ 3.553,65	0,00	R\$ -	R\$ 3.553,65	100,00%
15.11	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=22cm	M2	18,54	R\$ 470,04	R\$ 8.714,45	0,00	R\$ -	R\$ 8.714,45	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVÃO TABULEIRO DOS BATISTAS												
QUARTA												
19/11 A 17/12												
17/12/2025												
PLANILHA ORÇAMENTARIA												
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO	100,00%	
15.12	S10345	ORSE	Módulo de buça branca com selo integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com caropla cromada acabamento simples e conjunto de fixação.	un	1,00	R\$ 641,81	R\$ 641,81	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 641,81	100,00%
16			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 33.794,80					
16.1			PINTURA INTERNA				R\$ 14.940,72					
16.1.1	89415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_03/2024	M2	446,78	R\$ 4,73	R\$ 2.112,38	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,38	100,00%
16.1.2	S02283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	446,78	R\$ 14,79	R\$ 6.609,70	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.609,70	100,00%
16.1.3	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	446,78	R\$ 13,92	R\$ 6.218,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.218,64	100,00%
16.2			PINTURA EXTERNA				R\$ 13.661,26					
16.2.1	89415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, AF_06/2014	M2	408,52	R\$ 4,73	R\$ 1.931,48	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,48	100,00%
16.2.2	S02283	ORSE	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA AGRÍLICA EM FACHADA FRONTAL	m2	408,52	R\$ 14,79	R\$ 6.043,67	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.043,67	100,00%
16.2.3	89489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	408,52	R\$ 13,92	R\$ 5.686,11	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.686,11	100,00%
16.3			PINTURA DE ESQUADRIAS				R\$ 5.192,82					
16.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	M2	77,95	R\$ 21,11	R\$ 1.645,78	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645,78	100,00%
16.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	77,95	R\$ 18,43	R\$ 1.281,01	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281,01	100,00%
16.3.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	77,95	R\$ 29,07	R\$ 2.266,03	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,03	100,00%
17			BASE PARA CAIXA D'ÁGUA				R\$ 5.699,87					
17.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 479,10					
17.1.1	S02497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m3	3,07	R\$ 51,33	R\$ 157,58	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 157,58	100,00%
17.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	M3	2,56	R\$ 80,09	R\$ 205,03	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,03	100,00%
17.1.3	C0096	SEINFRA	REATERRO APOILO	M3	2,56	R\$ 45,51	R\$ 116,49	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,49	100,00%
17.2			ALICERCE				R\$ 418,42					
17.2.1	C3529	SEINFRA	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CI/REGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,27	R\$ 329,46	R\$ 418,42	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,42	100,00%
17.2.2			BLOCOS DE FUNDAÇÃO				R\$ 1.394,70					
17.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	0,64	R\$ 37,16	R\$ 23,78	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,78	100,00%
17.2.2.2	S07595	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	3,20	R\$ 48,88	R\$ 156,43	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,43	100,00%
17.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	61,44	R\$ 14,58	R\$ 902,62	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,62	100,00%
17.2.2.4	94984	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	0,64	R\$ 487,29	R\$ 311,87	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,87	100,00%
17.2.3			CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR				R\$ 668,87					
17.2.3.1	S07519	ORSE	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	1,00	R\$ 33,58	R\$ 33,58	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,58	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

QUARTA

Nº DA MEDIÇÃO PERÍODO DATA

19/11 A 17/12

17/12/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE			VALORES			SALDO
17.2.3.2	86546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	15,80	R\$ 14,69	R\$ 232,12	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,12	100,00%
17.2.3.3	86543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	6,81	R\$ 19,51	R\$ 132,87	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,87	100,00%
17.2.3.4	86555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	M3	0,36	R\$ 723,76	R\$ 260,55	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,55	100,00%
17.2.3.5	S04953	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	0,36	R\$ 27,09	R\$ 9,75	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,75	100,00%
17.3			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 1.234,36							
17.3.1			PILARES				R\$ 599,77							
17.3.1.1	S07463	ORSE	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	1,16	R\$ 46,51	R\$ 53,95	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,95	100,00%
17.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	16,66	R\$ 12,24	R\$ 203,96	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,96	100,00%
17.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2,88	R\$ 14,71	R\$ 43,85	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,85	100,00%
17.3.1.4	94864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/APEIA MÉDIA) BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,55	R\$ 487,29	R\$ 268,01	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,01	100,00%
17.3.2			VIGAS				R\$ 664,59							



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UFE ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVONDO TABULEIRO DOS BATISTAS

QUARTIL

19/11/2023

17/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO		
17.3.2.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,00	R\$ 92,01	R\$ 92,01	0,00	R\$ -	R\$ 92,01	100,00%	
17.3.2.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,80	R\$ 14,69	R\$ 232,12	0,00	R\$ -	R\$ 232,12	100,00%	
17.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM. - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,54	R\$ 19,51	R\$ 108,09	0,00	R\$ -	R\$ 108,09	100,00%	
17.3.2.4	94984	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,30	R\$ 487,29	R\$ 146,19	0,00	R\$ -	R\$ 146,19	100,00%	
17.3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,30	R\$ 287,27	R\$ 86,18	0,00	R\$ -	R\$ 86,18	100,00%	
17.4			LAJE			R\$ 1.671,22						
17.4.1	S04254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intervão 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capessamento 4cm.	M2	6,25	R\$ 200,47	R\$ 1.252,96	0,00	R\$ -	R\$ 1.252,96	100,00%	
17.4.2	S04849	ORSE	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m2	6,25	R\$ 66,92	R\$ 418,26	0,00	R\$ -	R\$ 418,26	100,00%	
18			SERVICOS COMPLEMENTARES			R\$ 5.881,54						
18.1	S09075	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	m2	5,85	R\$ 119,06	R\$ 696,52	0,00	R\$ -	R\$ 696,52	100,00%	
18.2	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. PISA	KG	56,76	R\$ 18,82	R\$ 1.068,22	0,00	R\$ -	R\$ 1.068,22	100,00%	
18.3	112737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 mx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m2	5,32	R\$ 635,85	R\$ 3.382,72	0,00	R\$ -	R\$ 3.382,72	100,00%	
18.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,00	R\$ 53,22	R\$ 212,86	0,00	R\$ -	R\$ 212,86	100,00%	
18.5	S04726	ORSE	Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MCD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado.	m2	6,00	R\$ 86,87	R\$ 521,22	0,00	R\$ -	R\$ 521,22	100,00%	
19			SERVICOS FINAIS			R\$ 1.238,77						
19.1	S03239	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	un	1,00	R\$ 285,38	R\$ 285,38	0,00	R\$ -	R\$ 285,38	100,00%	
19.2	99803	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	476,16	R\$ 2,00	R\$ 953,39	0,00	R\$ -	R\$ 953,39	100,00%	
							VALOR DO ORÇAMENTO	R\$ 852.626,96				
							BDI	R\$ 245.727,09				
							VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 1.098.354,05				
							VALOR DO ORÇAMENTO	R\$ 274.994,68	R\$ 69.959,91	R\$ 344.954,60	R\$ 507.672,36	60%
							VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 79.253,47	R\$ 20.162,45	R\$ 99.415,91	R\$ 146.311,18	
							VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 354.248,15	R\$ 90.122,36	R\$ 444.370,51	R\$ 653.983,54	

SÃO LUIS, MA 17 DEZEMBRO DE 2023

Ativado de forma digital por
BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2023.12.18 15:29:56 -0700

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
Sócia Proprietária
CPF 014.291.133 - 08

A Sra.
NARA DA SILVA MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAPADINHA-MA

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 90.122,36** (NOVENTA MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) referente a construção de uma U.E de seis salas no povoado tabuleiro dos batistas.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 0178
Conta Corrente: 5883701
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO SAFRA

São Luís, MA - 18 de DEZEMBRO de 2025

BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:014291
13308

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2025.12.18
15:31:21 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000060

Data e Hora da Emissão
18/12/2025 15:03:11

Competência da NFS-e
12/2025

Código de Verificação
464D.9900.96DB.9790.BC37.9BDB.628E.4789



Chave de Acesso da NFS-e
2111300120051323300019800000000006025129442880091

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98** Inscrição Municipal: **550000**

Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE 3 - BAIRRO RENASCENCA - CEP:**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **trinta.contabilidade@hotmail.** Telefone: **(98) 88373415**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA/MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

Município: **CHAPADINHA** UF: **MA** Email: **atendimento@vrcontabilidade.** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA U.E DE SEIS SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVGAO TABULEIRO DOS BATISTAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA MA. CONTRATO 124/2025. AGENCIA: 0178 CONTA: 5883701 BANCO SAFRA . VALOR: R\$ 90.122,36

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DE SERVIÇOS.	1	54,073,42	54,073,42
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	36,048,94	36,048,94

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 1.080,99
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,00%): R\$ 0,00	CBS (0,00%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.122,36

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 36.048,94	Base Cálculo: R\$ 90.082,36	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 4.504,12
--	---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICIPIO
 Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA
 Recolhimento: RETIDO
 Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS



Serviço: 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
 Mês de

Atestado que:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 18 / 12 / 2025

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Montes
Lucas de B. Monteles
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.513.233/0001-98

Certidão n°: 47277961/2025

Expedição: 15/08/2025, às 09:09:30

Validade: 11/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/12/2025 a 14/01/2026

Certificação Número: 2025121609300036292055

Informação obtida em 16/12/2025 09:30:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:50:41 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2026.

Código de controle da certidão: **B850.AA47.C1CF.2FC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 400934/25

Data da

16/12/2025 11:43:46

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 11:43:46



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 118540/25

Data da

16/12/2025 11:44:37

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 11:44:37



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012103532025

Validade: 06/04/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento: JARDIM DE ALAH
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 08 de outubro de 2025 as 16:18, sob o código de autenticidade nº 8A57D59823769A1FF2802C8A1E00F07E.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."
