

LOTE 4
3ª medição

OFICIO Nº 052/2026-GAB. SINURB

Chapadinha MA, 10 de fevereiro de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição dos serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadinha, executados pela empresa ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo, processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **3ª medição** de serviços executados pela empresa **ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA**, sob CNPJ nº 03.720.572/0001-33, referente a **serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadinha** (LOTE 1. U.I. Agustinho Ribeiro, LOTE 2. U.I. José Sousa dos Santos, Pov. Canto do Ferreira, LOTE 3. U.E. Dr. Otavio Passos, Pov. Brejo do Meio, LOTE 4. U.I. Prof. Oliveira Roma) conforme: **Contrato nº 231/2024**,

Apenso ao Proc. Adm. nº 1900/2024,

Concorrência nº 018/2024,

Referência: LOTE 4.: U.I. Prof. Oliveira Roma,

NF nº 05,

Valor R\$ 420.905,19.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM 10/02/2026
HORÁRIO: 10:40
Janaína Sales
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Caxias/MA, em 27 de Janeiro de 2026..

Ilmo. Senhor

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinha-MA

Nesta

Eu, Karllyson Carvalho Moura, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 0315375220061 SESP/MA, inscrito no CPF no 053.774.783-47, representante legal da Empresa ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na rua 13 de Maio, nº 339, Bairro centro, CEP :65608-480, Cidade de Caxias, Estado do Maranhão, vem requerer a Vossa Senhoria o pagamento a confirmação da medição dos serviços já executados, referente a 3ª (Terceira) medição da **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA NA U.I PROFESSOR OLIVEIRA ROMA BAIRRO CORRENTE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. LOTE 04, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1900/2024, CONCORRENCIA 018/2024**, e especificações constantes o Projeto Básico de Engenharia em anexo no processo licitatório.

Karllyson Carvalho Moura

KARLLYSON CARVALHO MOURA

ENG. CIVIL – CONFEA 1118602986

CPF Nº 053.774.783-47

Representante Legal



ARCANJO CONSTRUCOES LTDA
 R TREZE DE MAIO Nº 339 – CENTRO
 CNPJ.: 03.720.572/0001-33
 CAXIAS – MA CEP.: 65.606-180
 Email: arcanjoconstrucoes23@hotmail.com

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA NA UI PROFESSOR OLIVEIRA ROMA BAIRRO CORRENTE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. LOTE 04

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1900/2024

Nº DO CONTRATO: Nº 231/2024

EMPRESA EXECUTORA: ARCANJO CONSTRUCOES LTDA CNPJ.: 03.720.572/0001-33

3º MEDIÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 26/09/2025 A 27/01/2026 DATA DA MEDIÇÃO: 27/01/2026

R\$ 420.905,19

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO			VALOR FINAL			
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	%	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%	ATUAL	ACUM.	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							42.254,28												12.703,79	42.254,28	100,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							42.254,28												12.703,79	42.254,28	100,00%
1.1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	66,00	98,99	6.533,34	33,00	50%		50%	33,00	66,00	100%		66,00	100%		R\$ 3.266,67	R\$ 6.533,34	100,00%	
1.1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	704,00	26,81	18.874,24	352,00	50%		50%	352,00	704,00	100%		704,00	100%		R\$ 9.437,12	R\$ 18.874,24	100,00%	
1.2	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	750,00	750,00	1,00	100%		0%	0,00	1,00	100%		1,00	100%		R\$ -	R\$ 750,00	100,00%	
1.3	104884	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_01/2024_PE	SINAPI	M2	9,00	1.206,93	10.862,37	9,00	100%		0%	0,00	9,00	100%		9,00	100%		R\$ -	R\$ 10.862,37	100,00%	
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	SEINFRA	M2	655,75	5,10	3.344,33	655,75	100%		0%	0,00	655,75	100%		655,75	100%		R\$ -	R\$ 3.344,33	100,00%	
1.5	809937	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	ORSE	M2	1.000,00	1,89	1.890,00	1.000,00	100%		0%	0,00	1.000,00	100%		1.000,00	100%		R\$ -	R\$ 1.890,00	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							22.032,27												0,00	22.032,27	100,00%
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS).AF_01/2024	SINAPI	M3	23,24	95,16	2.211,52	23,24	100%		0%	0,00	23,24	100%		23,24	100%		R\$ -	R\$ 2.211,52	100,00%	
2.2	101617	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	SINAPI	M2	97,01	2,86	277,45	97,01	100%		0%	0,00	97,01	100%		97,01	100%		R\$ -	R\$ 277,45	100,00%	
2.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROSCAVADEIRA	SINAPI	M3	50,52	11,14	562,79	50,52	100%		0%	0,00	50,52	100%		50,52	100%		R\$ -	R\$ 562,79	100,00%	
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE.MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	196,73	96,48	18.980,51	196,73	100%		0%	0,00	196,73	100%		196,73	100%		R\$ -	R\$ 18.980,51	100,00%	
3	FUNDAÇÕES							54.901,36												0,00	54.901,36	100,00%
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS							35.799,66												0,00	35.799,66	100,00%
3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA 5CM - FUNDO DE VALA	SINAPI	M2	39,47	36,58	1.443,81	39,47	100%		0%	0,00	39,47	100%		39,47	100%		R\$ -	R\$ 1.443,81	100,00%	
3.1.2	96635	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	34,53	127,21	4.392,56	34,53	100%		0%	0,00	34,53	100%		34,53	100%		R\$ -	R\$ 4.392,56	100,00%	
3.1.3	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	481,26	11,85	5.702,93	481,26	100%		0%	0,00	481,26	100%		481,26	100%		R\$ -	R\$ 5.702,93	100,00%	
3.1.4	96558	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	29,82	813,56	24.280,36	29,82	100%		0%	0,00	29,82	100%		29,82	100%		R\$ -	R\$ 24.280,36	100,00%	

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL				
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%		
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – VIGAS BALDRAMES										18.101,70								0,00	19.101,70	100,00%
3.2.1	C3529	MULTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO 15) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	23,24	290,69	6.755,64	23,24	100%		0,00		23,24	100%		R\$	R\$	6.755,64	100,00%		
3.2.2	96536	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	38,74	66,92	2.669,96	38,74	100%		0,00		38,74	100%		R\$	R\$	2.669,96	100,00%		
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACÃO	SINAPI	KG	246,48	13,53	3.334,87	246,48	100%		0,00		246,48	100%		R\$	R\$	3.334,87	100,00%		
3.2.4	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACÃO	SINAPI	KG	112,73	16,00	1.803,68	112,73	100%		0,00		112,73	100%		R\$	R\$	1.803,68	100,00%		
3.2.5	96557	CONCRETO BOMBADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	5,81	780,99	4.537,55	5,81	100%		0,00		5,81	100%		R\$	R\$	4.537,55	100,00%		
4	SUPERESTRUTURA										346.084,71								90.533,63	346.084,71	100,00%
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES										26.848,21								0,00	26.848,21	100,00%
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	45,66	47,33	2.161,09	45,66	100%		0,00		45,66	100%		R\$	R\$	2.161,09	100,00%		
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	407,22	10,98	4.471,28	407,22	100%		0,00		407,22	100%		R\$	R\$	4.471,28	100,00%		
4.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	543,13	9,24	5.018,52	543,13	100%		0,00		543,13	100%		R\$	R\$	5.018,52	100,00%		
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	181,10	13,60	2.462,96	181,10	100%		0,00		181,10	100%		R\$	R\$	2.462,96	100,00%		
4.1.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES; FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	SINAPI	M3	13,07	974,32	12.734,36	13,07	100%		0,00		13,07	100%		R\$	R\$	12.734,36	100,00%		
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS										14.372,58								0,00	14.372,58	100,00%
4.2.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	44,38	73,12	3.245,07	44,38	100%		0,00		44,38	100%		R\$	R\$	3.245,07	100,00%		
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	451,64	10,98	4.959,01	451,64	100%		0,00		451,64	100%		R\$	R\$	4.959,01	100,00%		

CONTRATO																				
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				ACUMULADO				VALOR FINAL				
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%	ATUAL	ACUM.	%		
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	105,34	13,60	1.432,62	105,34	100%	0,00	0%	105,34	100%	0,00	0%	105,34	100%	R\$ 1.432,62	100,00%	
4.2.4	103882	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,78	990,77	4.735,88	4,78	100%	0,00	0%	4,78	100%	0,00	0%	4,78	100%	R\$ 4.735,88	100,00%	
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS											280,06	0,00	0,00	280,06	100,00%	0,00	0,00	280,06	100,00%
4.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTA CONTRAVERGA	SINAPI	M	6,01	38,01	228,44	6,01	100%	0,00	0%	6,01	100%	0,00	0%	6,01	100%	R\$ 228,44	100,00%	
4.3.2	93194	JANELA	SINAPI	M	1,03	50,12	51,62	1,03	100%	0,00	0%	1,03	100%	0,00	0%	1,03	100%	R\$ 51,62	99,99%	
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE											784,80	0,00	0,00	784,80	100,00%	0,00	0,00	784,80	100,00%
4.4.1	101964	LAJE DE VIGOTA TRELICHADA H=13CM	SINAPI	M2	4,00	196,20	784,80	4,00	100%	0,00	0%	4,00	100%	0,00	0%	4,00	100%	R\$ 784,80	100,00%	
4.5	CONCRETO ARMADO - PISO											86.464,12	0,00	0,00	86.464,12	100,00%	0,00	0,00	86.464,12	100,00%
4.5.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	6,32	40,36	255,08		0%	6,32	100%	6,32	100%			6,32	100%	R\$ 255,08	100,00%	
4.5.2	C2862	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	SEINFRA	M3	34,00	137,96	4.690,64		0%	34,00	100%	34,00	100%			34,00	100%	R\$ 4.690,64	100,00%	
4.5.3	C1631	LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DA QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS	SEINFRA	M2	680,00	6,91	4.698,80		0%	680,00	100%	680,00	100%			680,00	100%	R\$ 4.698,80	100,00%	
4.5.4	97088	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	KG	680,00	13,91	9.458,80		0%	680,00	100%	680,00	100%			680,00	100%	R\$ 9.458,80	100,00%	
4.5.5	101747	PISO EM CONCRETO 20MPa USINADO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO SELANTE A BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1M, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO)	SINAPI	M2	680,00	99,06	67.360,80		0%	680,00	100%	680,00	100%			680,00	100%	R\$ 67.360,80	100,00%	
4.6	ESTRUTURA METÁLICA											213.265,43	0,00	0,00	213.265,43	100,00%	0,00	0,00	213.265,43	100,00%
4.6.1	100775	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS E PINTURA	SINAPI	KG	16.205,58	13,16	213.265,43	16.205,58	100%	0,00	0%	16.205,58	100%			16.205,58	100%	R\$ 213.265,43	100,00%	
4.7	CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DA ARQUIBANCADA											4.069,51	0,00	0,00	4.069,51	100,00%	0,00	0,00	4.069,51	100,00%
4.7.1	C2862	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	SEINFRA	M3	1,90	137,96	262,12		0%	1,90	100%	1,90	100%			1,90	100%	R\$ 262,12	100,00%	
4.7.2	C1631	LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DA QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS	SEINFRA	M2	31,76	6,91	219,46		0%	31,76	100%	31,76	100%			31,76	100%	R\$ 219,46	100,00%	
4.7.3	97088	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	KG	31,76	13,91	441,78		0%	31,76	100%	31,76	100%			31,76	100%	R\$ 441,78	100,00%	
4.7.4	101747	PISO EM CONCRETO 20MPa USINADO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO SELANTE A BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1M, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO)	SINAPI	M2	31,76	99,06	3.146,15		0%	31,76	100%	31,76	100%			31,76	100%	R\$ 3.146,15	100,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE E/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
9.2	87529	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:2:9 - PREPARO MECANICO - ESPESSURA 2,0 CM	SINAPI	M2	982,42	35,68	35.052,75	982,42	100%		0,00	0%	982,42	100%		R\$	R\$	35.052,75	100,00%
CONTRATO																			
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
9.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 32 X 45CM - INCL. REJUNTE	SINAPI	M2	12,78	74,04	946,23		0%	12,78	100%		12,78	100%		R\$	R\$	946,23	100,00%
9.4	C4411	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - VERMELHA	SEINFRA	M2	0,80	147,34	117,87		0%	0,80	100%		0,80	100%		R\$	R\$	117,87	100,00%
9.5	C4411	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - AZUL	SEINFRA	M2	0,80	147,34	117,87		0%	0,80	100%		0,80	100%		R\$	R\$	117,87	100,00%
10		SISTEMAS DE PISOS					35.776,84										35.776,84		
10.1	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 4 CM - ÁREAS MOLHADAS	SINAPI	M2	50,00	38,36	1.918,00		0%	50,00	100%		50,00	100%		R\$	R\$	1.918,00	100,00%
10.2	102464	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI AF_05/2021	SINAPI	M2	481,25	56,36	27.123,25		0%	481,25	100%		481,25	100%		R\$	R\$	27.123,25	100,00%
10.3	104606	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEIV - 45 X 45 CM - INCL. REJUNTE	SINAPI	M2	4,00	74,76	299,04		0%	4,00	100%		4,00	100%		R\$	R\$	299,04	100,00%
10.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	SINAPI	M	2,80	118,43	331,60		0%	2,80	100%		2,80	100%		R\$	R\$	331,60	100,00%
10.5	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	8,02	750,77	6.021,18		0%	8,02	100%		8,02	100%		R\$	R\$	6.021,18	100,00%
10.6	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	8,95	9,36	83,77		0%	8,95	100%		8,95	100%		R\$	R\$	83,77	100,00%
11		PINTURAS E ACABAMENTOS					29.365,33										29.365,33		
11.1	88497	EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	4,00	16,07	64,28		0%	4,00	100%		4,00	100%		R\$	R\$	64,28	100,00%
11.2	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	988,04	16,07	15.556,40		0%	988,04	100%		988,04	100%		R\$	R\$	15.556,40	100,00%
11.3	88489	PINTURA EM ACRILICO SOBRE TETO, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	4,00	14,14	56,56		0%	4,00	100%		4,00	100%		R\$	R\$	56,56	100,00%
11.4	88489	PINTURA EM LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELO, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	988,04	14,14	13.688,09		0%	988,04	100%		988,04	100%		R\$	R\$	13.688,09	100,00%
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					1.913,44										1.913,44		
12.1	89446	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	SINAPI	M	12,00	4,93	59,16		100%	12,00	100%		12,00	100%		R\$	R\$	59,16	100,00%
12.2	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	SINAPI	M	3,00	16,63	49,89		100%	3,00	100%		3,00	100%		R\$	R\$	49,89	100,00%
12.3	94656	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSAS-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4"	SINAPI	UN	4,00	5,62	22,48		100%	4,00	100%		4,00	100%		R\$	R\$	22,48	100,00%
12.4	88596	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSAS-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/2"	SINAPI	UN	2,00	9,08	18,16		100%	2,00	100%		2,00	100%		R\$	R\$	18,16	100,00%
12.5	89605	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM-25MM	SINAPI	UN	1,00	18,05	18,05		100%	1,00	100%		1,00	100%		R\$	R\$	18,05	100,00%
12.6	89362	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM	SINAPI	UN	6,00	8,27	49,62		100%	6,00	100%		6,00	100%		R\$	R\$	49,62	100,00%
12.7	89501	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM	SINAPI	UN	1,00	12,45	12,45		100%	1,00	100%		1,00	100%		R\$	R\$	12,45	100,00%
12.8	89605	LUVA SOLDÁVEL 25MM	SINAPI	UN	6,00	18,05	108,30		100%	6,00	100%		6,00	100%		R\$	R\$	108,30	100,00%
12.9	89605	LUVA SOLDÁVEL 50MM	SINAPI	UN	2,00	18,05	36,10		100%	2,00	100%		2,00	100%		R\$	R\$	36,10	100,00%

CONTRATO										PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
15.3	96544	PORTA HIGIÊNICO, PAPEL MELHORAMENTO OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	77,30	77,30			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
15.4	96547	PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO, MELHORAMENTO OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	115,35	115,35			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
15.5	C1151	DUCHA HIGIÊNICA, COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	SEINFRA	UN	1,00	65,23	65,23			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
15.6	86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM AÇONAMENTO POR LAVANCA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	106,94	106,94			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
15.7	96547	DISPENSER SARONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	115,35	115,35			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
15.8	96547	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	115,35	115,35			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
15.9	S03708	CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE	ORSE	UN	1,00	113,46	113,46			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
15.10	100866	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	2,00	324,32	648,64			0%		2,00	100%		2,00	100%		2,00	100,00%
15.11	100868	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	2,00	359,27	718,54			0%		2,00	100%		2,00	100%		2,00	100,00%
16		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				2.584,98	2.584,98											2.584,98	100,00%
16.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	SINAPI	UN	8,00	21,39	171,12			0%		8,00	100%		8,00	100%		8,00	100,00%
16.2	S07860	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, TIPO REFLETOR	ORSE	UN	2,00	295,75	591,50			0%		2,00	100%		2,00	100%		2,00	100,00%
16.3	S12514	KIT BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA	ORSE	UN	2,00	794,09	1.588,18			0%		2,00	100%		2,00	100%		2,00	100,00%
16.4	S13580	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	ORSE	UN	18,00	13,01	234,18			0%		18,00	100%		18,00	100%		18,00	100,00%
17		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				29.572,61	29.572,61											29.572,61	100,00%
17.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				638,65	638,65											638,65	100,00%
17.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	SINAPI	UN	1,00	511,58	511,58			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
17.1.2	101898	QUADRO DE MEDIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	127,07	127,07			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
17.2		DISJUNTORES				480,69	480,69											480,69	100,00%
17.2.1	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A	SINAPI	UN	12,00	123,48	123,48			0%		12,00	100%		12,00	100%		12,00	100,00%
17.2.2	93654	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 13A	SINAPI	UN	1,00	10,88	10,88			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
17.2.3	93657	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 32A	SINAPI	UN	8,00	13,51	108,08			0%		8,00	100%		8,00	100%		8,00	100,00%
17.2.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A	SINAPI	UN	1,00	86,64	86,64			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%
17.2.5	C4530	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A	SEINFRA	UN	1,00	151,61	151,61			0%		1,00	100%		1,00	100%		1,00	100,00%



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				VALOR FINAL			
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%				
17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																							
17.3.1	91834	ELETRÓDUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	270,40	17,82	4.818,53		0%			270,40	100%				10.458,59			10.458,59	R\$ 4.818,53	R\$ 10.458,59	100,00%
17.3.2	91873	ELETRÓDUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø40MM (DN 1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	11,70	20,85	243,95		0%			11,70	100%				243,95			243,95	R\$ 243,95	R\$ 243,95	100,00%
17.3.3	93011	ELETRÓDUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3"), INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	60,00	45,21	2.712,60		0%			60,00	100%				2.712,60			2.712,60	R\$ 2.712,60	R\$ 2.712,60	100,00%
17.3.4	91884	LUBA PVC ROSCA 3/4"	SINAPI	UN	2,00	11,12	22,24		0%			2,00	100%				22,24			22,24	R\$ 22,24	R\$ 22,24	100,00%
17.3.5	91886	LUBA PVC ROSCA 1 1/4"	SINAPI	UN	103,00	15,39	1.585,17		0%			103,00	100%				1.585,17			1.585,17	R\$ 1.585,17	R\$ 1.585,17	100,00%
17.3.6	93016	LUBA PVC ROSCA 3"	SINAPI	UN	13,00	38,74	503,62		0%			13,00	100%				503,62			503,62	R\$ 503,62	R\$ 503,62	100,00%
17.3.7	91920	CURVA 90° LONGA 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00	24,25	24,25		0%			1,00	100%				24,25			24,25	R\$ 24,25	R\$ 24,25	100,00%
17.3.8	91943	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	SINAPI	UN	17,00	22,03	374,51		0%			17,00	100%				374,51			374,51	R\$ 374,51	R\$ 374,51	100,00%
17.3.9	92865	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREFOR NO TETO AÇO PINTADA, 100X100X80MM	SINAPI	UN	2,00	13,74	27,48		0%			2,00	100%				27,48			27,48	R\$ 27,48	R\$ 27,48	100,00%
17.3.10	C0627	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 150X150X68MM	SEINFRA	UN	2,00	40,55	81,10		0%			2,00	100%				81,10			81,10	R\$ 81,10	R\$ 81,10	100,00%
17.3.11	C0628	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 250X323X74MM	SEINFRA	UN	1,00	65,14	65,14		0%			1,00	100%				65,14			65,14	R\$ 65,14	R\$ 65,14	100,00%
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)																							
17.4.1	91926	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	850,50	4,02	3.419,01		0%			850,50	100%				3.419,01			3.419,01	R\$ 3.419,01	R\$ 3.419,01	100,00%
17.4.2	91928	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	66,00	6,21	409,86		0%			66,00	100%				409,86			409,86	R\$ 409,86	R\$ 409,86	100,00%
17.4.3	91930	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	286,75	8,69	2.491,86		0%			286,75	100%				2.491,86			2.491,86	R\$ 2.491,86	R\$ 2.491,86	100,00%
17.4.4	91934	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	231,50	22,49	5.206,44		0%			231,50	100%				5.206,44			5.206,44	R\$ 5.206,44	R\$ 5.206,44	100,00%
17.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS																							
17.5.1	91986	TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	UN	5,00	35,09	175,45		0%			5,00	100%				175,45			175,45	R\$ 175,45	R\$ 175,45	100,00%
17.5.2	91953	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SINAPI	UN	2,00	29,97	59,94		0%			2,00	100%				59,94			59,94	R\$ 59,94	R\$ 59,94	100,00%
17.5.3	97587	LUMINÁRIAS LED SOBREPOR 270X1250MM, 18W	SINAPI	UN	3,00	309,24	927,72		0%			3,00	100%				927,72			927,72	R\$ 927,72	R\$ 927,72	100,00%
17.5.4	S12808	REFLETOR LED 200W	ORSE	UN	20,00	285,22	5.304,40		0%			20,00	100%				5.304,40			5.304,40	R\$ 5.304,40	R\$ 5.304,40	100,00%
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)																							
18.1	C3483	CONECTOR TIPO TERMINAL OLHAL PARA CABO #50 MMF	SEINFRA	UN	15,00	7,21	108,15		0%			15,00	100%				108,15			108,15	R\$ 108,15	R\$ 108,15	100,00%
18.2	98463	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO U COM DUPLA ROSCA	SINAPI	UN	18,00	25,16	452,88		0%			18,00	100%				452,88			452,88	R\$ 452,88	R\$ 452,88	100,00%
18.3	96985	HASTE DE COBRE 2,4 M X 5/8" COPPERWELD	SINAPI	UN	18,00	84,22	1.515,96		0%			18,00	100%				1.515,96			1.515,96	R\$ 1.515,96	R\$ 1.515,96	100,00%
18.4	96974	CABO DE COBRE NU 50MMF	SINAPI	M	255,00	84,00	21.420,00		0%			255,00	100%				21.420,00			21.420,00	R\$ 21.420,00	R\$ 21.420,00	100,00%
18.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	SINAPI	UN	4,00	53,74	214,96		0%			4,00	100%				214,96			214,96	R\$ 214,96	R\$ 214,96	100,00%
18.6	98463	PARAFUSO 5/16" INOX CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA	SINAPI	UN	15,00	25,16	377,40		0%			15,00	100%				377,40			377,40	R\$ 377,40	R\$ 377,40	100,00%

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL					
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%			
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
19.1	C4068	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	M2	0,14	386,96	54,17		0%		0,14	100%			0,14	100%		R\$ 54,17	RS 54,17	100,00%		
19.2	C1869	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA= 19CM E=2 CM	SEINFRA	M	0,85	88,89	75,56		0%		0,85	100%			0,85	100%		R\$ 75,56	RS 75,56	100,00%		
19.3	C0864	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	UN	1,00	3.852,53	3.852,53		0%		1,00	100%			1,00	100%		R\$ 3.852,53	RS 3.852,53	100,00%		
19.4	C1351	ESTRUTURA METÁLICA PARA REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	1,00	2.703,16	2.703,16		0%		1,00	100%			1,00	100%		R\$ 2.703,16	RS 2.703,16	100,00%		
19.5	C1347	ESTRUTURA METÁLICA COM TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00	5.130,88	5.130,88		0%		1,00	100%			1,00	100%		R\$ 5.130,88	RS 5.130,88	100,00%		
19.6	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	4.452,67	4.452,67		0%		1,00	100%			1,00	100%		R\$ 4.452,67	RS 4.452,67	100,00%		
19.7	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	171,50	163,23	27.983,95		0%		171,50	100%			171,50	100%		R\$ 27.983,95	RS 27.983,95	100,00%		
20	SERVIÇOS FINAIS																					
20.1	99803	LIMPEZA DE OBRA	SINAPI	M2	655,75	1,94	1.272,16		0%		655,75	100%			655,75	100%		R\$ 1.272,16	RS 1.272,16	100,00%		
20.2	S00005	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M	ORSE	UN	1,00	2.083,52	2.083,52		0%		1,00	100%			1,00	100%		R\$ 2.083,52	RS 2.083,52	100,00%		
							VALOR ORÇAMENTO:	813.890,74											813.890,74			
							VALOR BDI TOTAL:	170.021,78											170.021,78			
							VALOR TOTAL:	983.912,52											983.912,52			
VALOR DA OBRA R\$ 983.912,52 (NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)																						
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO R\$ 420.905,19 (quatrocentos e vinte mil novecentos e cinco reais e dezanove centavos)																						

Karillyson Carvalho Moura
KARILLYSON CARVALHO MOURA
 ENG. CIVIL – CONFEA 1118602986
 CPF N° 053.774.783-47
 Representante Legal



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA NA U.I. PROFESSOR OLIVEIRA ROMA BAIRRO CORRENTE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. LOTE 04
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 018/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1900/2024
 Nº DO CONTRATO: Nº 231/2024
 EMPRESA EXECUTORA: ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 03.720.572/0001-33
 3º MEDIÇÃO VALOR DA MEDIÇÃO:
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 26/09/2025 A 27/01/2026 DATA DA MEDIÇÃO: 27/01/2026

R\$ 420.905,19

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				VALOR FINAL				
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE E	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE %	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE E	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE %	ATUAL	ACUM.			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
1.1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	66,00	98,99	6.533,34	33,00	50%			66,00	100%				66,00	42.254,28	100,00%	
1.1.2	90776	COMPLEMENTARES	SINAPI	H	704,00	26,81	18.874,24	352,00	50%	352,00	50%	704,00	100%				704,00	42.254,28	100,00%	
1.2	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	750,00	750,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%				1,00	750,00	100,00%	
1.3	104894	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	SINAPI	M2	9,00	1.206,93	10.862,37	9,00	100%	0,00	0%	9,00	100%				9,00	10.862,37	100,00%	
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	SEINFRA	M2	655,75	5,10	3.344,33	655,75	100%	0,00	0%	655,75	100%				655,75	3.344,33	100,00%	
1.5	S09937	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	ORSE	M2	1.000,00	1,89	1.890,00	1.000,00	100%	0,00	0%	1.000,00	100%				1.000,00	1.890,00	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES																			
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	23,24	95,16	2.211,52	23,24	100%	0,00	0%	23,24	100%				23,24	2.211,52	100,00%	
2.2	101617	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	SINAPI	M2	97,01	2,86	277,45	97,01	100%	0,00	0%	97,01	100%				97,01	277,45	100,00%	
2.3	93381	RETROTERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA	SINAPI	M3	50,52	11,14	562,79	50,52	100%	0,00	0%	50,52	100%				50,52	562,79	100,00%	
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	196,73	96,48	18.980,51	196,73	100%	0,00	0%	196,73	100%				196,73	18.980,51	100,00%	
3	FUNDAÇÕES																			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS																			
3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA 5CM - FUNDO DE VALA	SINAPI	M2	39,47	36,58	1.443,81	39,47	100%	0,00	0%	39,47	100%				39,47	1.443,81	100,00%	
3.1.2	96535	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	34,53	127,21	4.392,56	34,53	100%	0,00	0%	34,53	100%				34,53	4.392,56	100,00%	
							54.901,36										54.901,36	54.901,36	100,00%	
							35.799,66											35.799,66	35.799,66	100,00%
							22.032,27										22.032,27	22.032,27	100,00%	
							0,00										0,00	0,00	100,00%	
							0,00										0,00	0,00	100,00%	

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				VALOR FINAL	
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	ATUAL
3.1.3	92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	481,26	11,85	5.702,93	481,26	100%	0,00	0%	481,26	100%	0,00	R\$	5.702,93	100,00%				
3.1.4	96558	CONCRETO BOMBADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	29,82	813,56	24.260,36	29,82	100%	0,00	0%	29,82	100%	0,00	R\$	24.260,36	100,00%				
3.2		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					19.101,70							0,00		19.101,70	100,00%				
3.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	23,24	290,69	6.755,64	23,24	100%	0,00	0%	23,24	100%	0,00	R\$	6.755,64	100,00%				
3.2.2	96536	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	38,74	68,92	2.669,96	38,74	100%	0,00	0%	38,74	100%	0,00	R\$	2.669,96	100,00%				
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	246,48	13,53	3.334,87	246,48	100%	0,00	0%	246,48	100%	0,00	R\$	3.334,87	100,00%				
3.2.4	92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	112,73	16,00	1.803,68	112,73	100%	0,00	0%	112,73	100%	0,00	R\$	1.803,68	100,00%				
3.2.5	96557	CONCRETO BOMBADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	5,81	780,99	4.537,55	5,81	100%	0,00	0%	5,81	100%	0,00	R\$	4.537,55	100,00%				
4		SUPERESTRUTURA					346.084,71									346.084,71	100,00%				
4.1		CONCRETO ARMADO - PILARES					26.848,21							0,00		26.848,21	100,00%				
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	45,66	47,33	2.161,09	45,66	100%	0,00	0%	45,66	100%	0,00	R\$	2.161,09	100,00%				
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	407,22	10,98	4.471,28	407,22	100%	0,00	0%	407,22	100%	0,00	R\$	4.471,28	100,00%				
4.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	543,13	9,24	5.018,52	543,13	100%	0,00	0%	543,13	100%	0,00	R\$	5.018,52	100,00%				
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	181,10	13,60	2.462,96	181,10	100%	0,00	0%	181,10	100%	0,00	R\$	2.462,96	100,00%				
4.1.5	103669	MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	13,07	974,32	12.734,36	13,07	100%	0,00	0%	13,07	100%	0,00	R\$	12.734,36	100,00%				
4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS					14.372,58							0,00		14.372,58	100,00%				
4.2.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	44,38	73,12	3.245,07	44,38	100%	0,00	0%	44,38	100%	0,00	R\$	3.245,07	100,00%				
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	451,64	10,98	4.959,01	451,64	100%	0,00	0%	451,64	100%	0,00	R\$	4.959,01	100,00%				

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO			VALOR FINAL					
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENT E	QUANT. EXCEDENTE E/ DIVERGENT E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENT E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENT E	ATUAL	ACUM.	%				
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	105,34	13,60	1.432,62	105,34	100%		0,00	0%		105,34	100%		R\$	-	R\$	1.432,62	100,00%			
4.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,78	990,77	4.735,88	4,78	100%		0,00	0%		4,78	100%		R\$	-	R\$	4.735,88	100,00%			
4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					280,06													0,00			280,06	100,00%
4.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTA CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA JANELA	SINAPI	M	6,01	38,01	228,44	6,01	100%		0,00	0%		6,01	100%		R\$	-	R\$	228,44	100,00%			
4.3.2	93194	JANELA	SINAPI	M	1,03	50,12	51,62	1,03	100%		0,00	0%		1,03	100%		R\$	-	R\$	51,62	99,99%			
4.4		CONCRETO ARMADO - LAJE					784,80													0,00			784,80	100,00%
4.4.1	101984	LAJE DE VIGOTA TRELICADA H=13CM	SINAPI	M2	4,00	196,20	784,80	4,00	100%		0,00	0%		4,00	100%		R\$	-	R\$	784,80	100,00%			
4.5		CONCRETO ARMADO - PISO					86.464,12													86.464,12			86.464,12	100,00%
4.5.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	6,32	40,36	255,08		0%		6,32	100%		6,32	100%		R\$	-	R\$	255,08	100,00%			
4.5.2	C2882	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	SEINFRA	M3	34,00	137,96	4.690,64		0%		34,00	100%		34,00	100%		R\$	-	R\$	4.690,64	100,00%			
4.5.3	C1631	LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DA QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS	SEINFRA	M2	680,00	6,91	4.698,80		0%		680,00	100%		680,00	100%		R\$	-	R\$	4.698,80	100,00%			
4.5.4	97088	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	KG	680,00	13,91	9.458,80		0%		680,00	100%		680,00	100%		R\$	-	R\$	9.458,80	100,00%			
4.5.5	101747	PISO EM CONCRETO 20MPA, USINADO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO SELANTE A BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1M, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO)	SINAPI	M2	680,00	99,06	67.360,80		0%		680,00	100%		680,00	100%		R\$	-	R\$	67.360,80	100,00%			
4.6		ESTRUTURA METÁLICA					213.265,43													0,00			213.265,43	100,00%
4.6.1	100775	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS E PINTURA	SINAPI	KG	16.205,58	13,16	213.265,43	16.205,58	100%		0,00	0%		16.205,58	100%		R\$	-	R\$	213.265,43	100,00%			
4.7		CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DA ARQUIBANCADA					4.069,51													4.069,51			4.069,51	100,00%
4.7.1	C2882	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	SEINFRA	M3	1,90	137,96	262,12		0%		1,90	100%		1,90	100%		R\$	-	R\$	262,12	100,00%			
4.7.2	C1631	LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DA QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS	SEINFRA	M2	31,76	6,91	219,46		0%		31,76	100%		31,76	100%		R\$	-	R\$	219,46	100,00%			
4.7.3	97088	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	SINAPI	KG	31,76	13,91	441,78		0%		31,76	100%		31,76	100%		R\$	-	R\$	441,78	100,00%			
4.7.4	101747	PISO EM CONCRETO 20MPA, USINADO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO SELANTE A BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1M, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO)	SINAPI	M2	31,76	99,06	3.146,15		0%		31,76	100%		31,76	100%		R\$	-	R\$	3.146,15	100,00%			

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				VALOR FINAL	
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE E	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL															
5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO				43.162,44	43.162,44								0,00	43.162,44	100,00%
5.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	491,21	85,98	42.234,24	0,00	0%			491,21	100%		R\$	42.234,24	100,00%
5.1.2	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	SINAPI	M	60,00	15,47	928,20	0,00	0%			60,00	100%		R\$	928,20	100,00%
6		ESQUADRIAS				6.994,81	6.994,81								6.994,81	6.994,81	100,00%
6.1		PORTAS DE MADEIRA				1.222,87	1.222,87								1.222,87	1.222,87	100,00%
6.1.1	S07766	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA - PM2A - 100X210 CM LISA, SEMI-OCIA, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	ORSE	UN	1,00	1.222,87	1.222,87	1,00	100%			1,00	100%		R\$	1.222,87	100,00%
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS				1.661,24	1.661,24								1.661,24	1.661,24	100,00%
6.2.1	100866	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM2	SINAPI	UN	2,00	324,32	648,64	2,00	100%			2,00	100%		R\$	648,64	100,00%
6.2.2	S09076	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 90X40 CM, E=1MM PARA AS PORTAS	ORSE	M2	2,00	142,03	284,06	2,00	100%			2,00	100%		R\$	284,06	100,00%
6.2.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	359,27	718,54	2,00	100%			2,00	100%		R\$	718,54	100,00%
6.3		PORTÃO DE FERRO				3.736,28	3.736,28								3.736,28	3.736,28	100,00%
6.3.1	S13135	PORTA DE ABRIR - PA4 - 70X165 CM - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	ORSE	M2	4,20	889,59	3.736,28	4,20	100%			4,20	100%		R\$	3.736,28	100,00%
6.4		JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				182,40	182,40								182,40	182,40	100,00%
6.4.1	S11945	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR NÍQUEL, MOLDEURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	ORSE	M2	0,40	456,01	182,40	0,40	100%			0,40	100%		R\$	182,40	100,00%
6.5		VIDROS				202,02	202,02								202,02	202,02	100,00%
6.5.1	C4835	ESPELHO CRISTAL E=4MM SEM MOLDEURA	SEINFRA	M2	0,40	505,04	202,02	0,40	100%			0,40	100%		R\$	202,02	100,00%
7		SISTEMAS DE COBERTURA				63.782,68	63.782,68								63.782,68	63.782,68	100,00%
7.1	94213	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,5MM	SINAPI	M2	804,38	72,97	58.695,61	804,38	100%			804,38	100%		R\$	58.695,61	100,00%
7.2	94228	CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 40CM E=0,05MM	SINAPI	M	64,82	78,48	5.087,07	64,82	100%			64,82	100%		R\$	5.087,07	100,00%
8		IMPERMEABILIZAÇÃO				4.954,97	4.954,97								4.954,97	4.954,97	100,00%
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	100,72	42,17	4.247,36	0,00	0%			0,00	0%		R\$	4.247,36	100,00%
8.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	16,78	42,17	707,61	0,00	0%			0,00	0%		R\$	707,61	100,00%
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				40.321,59	40.321,59								40.321,59	40.321,59	100,00%
9.1	87879	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS	SINAPI	M2	982,42	4,16	4.086,87	0,00	0%			0,00	0%		R\$	4.086,87	100,00%
9.2	87529	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MECANICO - ESPESSURA 2,0 CM	SINAPI	M2	982,42	35,68	35.052,75	0,00	0%			0,00	0%		R\$	35.052,75	100,00%

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

ACUM. ANTERIOR

MEDIÇÃO ATUAL

ACUMULADO

VALOR FINAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
9.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 32 X 45CM - INCL. REJUNTE	SINAPI	M2	12,78	74,04	946,23	0%		12,78	100%		12,78	100%		R\$ 946,23	R\$ 946,23	100,00%	
9.4	C4411	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - VERMELHA	SEINFRA	M2	0,80	147,34	117,87	0%		0,80	100%		0,80	100%		R\$ 117,87	R\$ 117,87	100,00%	
9.5	C4411	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - AZUL	SEINFRA	M2	0,80	147,34	117,87	0%		0,80	100%		0,80	100%		R\$ 117,87	R\$ 117,87	100,00%	
10		SISTEMAS DE PISOS					35.776,84									35.776,84	35.776,84	100,00%	
10.1	87630	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL. ESPESURA 4 CM - ÁREAS MOLHADAS	SINAPI	M2	50,00	38,36	1.918,00	0%		50,00	100%		50,00	100%		R\$ 1.918,00	R\$ 1.918,00	100,00%	
10.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	481,25	56,36	27.123,25	0%		481,25	100%		481,25	100%		R\$ 27.123,25	R\$ 27.123,25	100,00%	
10.3	104606	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 45 X 45 CM - INCL. REJUNTE	SINAPI	M2	4,00	74,76	299,04	0%		4,00	100%		4,00	100%		R\$ 299,04	R\$ 299,04	100,00%	
10.4	98688	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2 CM	SINAPI	M	2,80	118,43	331,60	0%		2,80	100%		2,80	100%		R\$ 331,60	R\$ 331,60	100,00%	
10.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	8,02	750,77	6.021,18	0%		8,02	100%		8,02	100%		R\$ 6.021,18	R\$ 6.021,18	100,00%	
10.6	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	8,95	9,36	83,77	0%		8,95	100%		8,95	100%		R\$ 83,77	R\$ 83,77	100,00%	
11		PINTURAS E ACABAMENTOS					29.365,33									29.365,33	29.365,33	100,00%	
11.1	88497	EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA PVA. 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	4,00	16,07	64,28	0%		4,00	100%		4,00	100%		R\$ 64,28	R\$ 64,28	100,00%	
11.2	88497	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	968,04	16,07	15.556,40	0%		968,04	100%		968,04	100%		R\$ 15.556,40	R\$ 15.556,40	100,00%	
11.3	88489	PINTURA EM ACRÍLICO SOBRE TETO, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	4,00	14,14	56,56	0%		4,00	100%		4,00	100%		R\$ 56,56	R\$ 56,56	100,00%	
11.4	88489	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELÓ 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	968,04	14,14	13.688,09	0%		968,04	100%		968,04	100%		R\$ 13.688,09	R\$ 13.688,09	100,00%	
12		INSTALAÇÃO HIDRAULICA					1.913,44									1.913,44	1.913,44	100,00%	
12.1	89446	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	SINAPI	M	12,00	4,93	59,16	100%		12,00	100%		12,00	100%		R\$ 59,16	R\$ 59,16	100,00%	
12.2	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	SINAPI	M	3,00	16,63	49,89	100%		3,00	100%		3,00	100%		R\$ 49,89	R\$ 49,89	100,00%	
12.3	94656	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4"	SINAPI	UN	4,00	5,62	22,48	100%		4,00	100%		4,00	100%		R\$ 22,48	R\$ 22,48	100,00%	
12.4	89586	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/2"	SINAPI	UN	2,00	9,08	18,16	100%		2,00	100%		2,00	100%		R\$ 18,16	R\$ 18,16	100,00%	
12.5	89605	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM-25MM	SINAPI	UN	1,00	18,05	18,05	100%		1,00	100%		1,00	100%		R\$ 18,05	R\$ 18,05	100,00%	
12.6	89362	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM	SINAPI	UN	6,00	8,27	49,62	100%		6,00	100%		6,00	100%		R\$ 49,62	R\$ 49,62	100,00%	
12.7	89501	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM	SINAPI	UN	1,00	12,45	12,45	100%		1,00	100%		1,00	100%		R\$ 12,45	R\$ 12,45	100,00%	
12.8	89605	LUVA SOLDÁVEL 25MM	SINAPI	UN	6,00	18,05	108,30	100%		6,00	100%		6,00	100%		R\$ 108,30	R\$ 108,30	100,00%	
12.9	89605	LUVA SOLDÁVEL 50MM	SINAPI	UN	2,00	18,05	36,10	100%		2,00	100%		2,00	100%		R\$ 36,10	R\$ 36,10	100,00%	
12.10	89645	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2"	SINAPI	UN	3,00	27,06	81,18	100%		3,00	100%		3,00	100%		R\$ 81,18	R\$ 81,18	100,00%	
12.11	89365	TÊ 90 SOLDÁVEL 25MM	SINAPI	UN	1,00	11,39	11,39	100%		1,00	100%		1,00	100%		R\$ 11,39	R\$ 11,39	100,00%	

Handwritten signature/initials

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO			VALOR FINAL		
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	%	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
15.5	C1151	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO DECA OU EQUIVALENTE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM AÇONAMENTO POR ALAVANCA, DECA OU EQUIVALENTE	SEINFRA	UN	1,00	65,23	65,23	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 65,23	R\$ 65,23	100,00%	
15.6	89606	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	106,94	106,94	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 106,94	R\$ 106,94	100,00%	
15.7	95547	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	115,35	115,35	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 115,35	R\$ 115,35	100,00%	
15.8	95547	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	115,35	115,35	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 115,35	R\$ 115,35	100,00%	
15.9	S03708	CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE	ORSE	UN	1,00	113,46	113,46	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 113,46	R\$ 113,46	100,00%	
15.10	100866	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	2,00	324,32	648,64	0%			2,00	100%			2,00	100%		R\$ 648,64	R\$ 648,64	100,00%	
15.11	100868	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	2,00	359,27	718,54	0%			2,00	100%			2,00	100%		R\$ 718,54	R\$ 718,54	100,00%	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							2.584,98											2.584,98		100,00%
16.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	SINAPI	UN	8,00	21,39	171,12	0%			8,00	100%			8,00	100%		R\$ 171,12	R\$ 171,12	100,00%	
16.2	S07860	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, TIPO REFLETOR	ORSE	UN	2,00	295,75	591,50	0%			2,00	100%			2,00	100%		R\$ 591,50	R\$ 591,50	100,00%	
16.3	S12514	KIT BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA	ORSE	UN	2,00	794,09	1.588,18	0%			2,00	100%			2,00	100%		R\$ 1.588,18	R\$ 1.588,18	100,00%	
16.4	S13580	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CMF	ORSE	UN	18,00	13,01	234,18	0%			18,00	100%			18,00	100%		R\$ 234,18	R\$ 234,18	100,00%	
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							29.572,61											29.572,61		100,00%
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							638,65											638,65		100,00%
17.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	511,58	511,58	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 511,58	R\$ 511,58	100,00%	
17.1.2	101938	QUADRO DE MEDIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	127,07	127,07	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 127,07	R\$ 127,07	100,00%	
17.2	DISJUNTORES							480,69											480,69		100,00%
17.2.1	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10A MONOPOLAR	SINAPI	UN	12,00	10,29	123,48	0%			12,00	100%			12,00	100%		R\$ 123,48	R\$ 123,48	100,00%	
17.2.2	93654	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 13A MONOPOLAR	SINAPI	UN	1,00	10,88	10,88	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 10,88	R\$ 10,88	100,00%	
17.2.3	93657	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 32A MONOPOLAR	SINAPI	UN	8,00	13,51	108,08	0%			8,00	100%			8,00	100%		R\$ 108,08	R\$ 108,08	100,00%	
17.2.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A	SINAPI	UN	1,00	86,64	86,64	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 86,64	R\$ 86,64	100,00%	
17.2.5	C4530	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A	SEINFRA	UN	1,00	151,61	151,61	0%			1,00	100%			1,00	100%		R\$ 151,61	R\$ 151,61	100,00%	

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	%	
17.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS															
17.3.1	91834	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	270,40	17,82	4.818,53	270,40	100%	0%	270,40	100%	0%	270,40	R\$ 4.818,53	100,00%
17.3.2	91873	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø40MM (DN 1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	11,70	20,85	243,95	11,70	100%	0%	11,70	100%	0%	11,70	R\$ 243,95	100,00%
17.3.3	93011	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø95MM (DN 3"), INCLUSIVE CONEXÕES	SINAPI	M	60,00	45,21	2.712,60	60,00	100%	0%	60,00	100%	0%	60,00	R\$ 2.712,60	100,00%
17.3.4	91884	LUBA PVC ROSCA 3/4"	SINAPI	UN	2,00	11,12	22,24	2,00	100%	0%	2,00	100%	0%	2,00	R\$ 22,24	100,00%
17.3.5	91886	LUBA PVC ROSCA 1 1/4"	SINAPI	UN	103,00	15,39	1.585,17	103,00	100%	0%	103,00	100%	0%	103,00	R\$ 1.585,17	100,00%
17.3.6	93016	LUBA PVC ROSCA 3"	SINAPI	UN	13,00	38,74	503,62	13,00	100%	0%	13,00	100%	0%	13,00	R\$ 503,62	100,00%
17.3.7	91920	CURVA 90° LONGA 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00	24,25	24,25	1,00	100%	0%	1,00	100%	0%	1,00	R\$ 24,25	100,00%
17.3.8	91943	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	SINAPI	UN	17,00	22,03	374,51	17,00	100%	0%	17,00	100%	0%	17,00	R\$ 374,51	100,00%
17.3.9	92865	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NO TETO AÇO PINTADA 100X100X80MM	SINAPI	UN	2,00	13,74	27,48	2,00	100%	0%	2,00	100%	0%	2,00	R\$ 27,48	100,00%
17.3.10	C0627	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 150X150X68MM	SEINFRA	UN	2,00	40,55	81,10	2,00	100%	0%	2,00	100%	0%	2,00	R\$ 81,10	100,00%
17.3.11	C0628	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 250X323X74MM	SEINFRA	UN	1,00	65,14	65,14	1,00	100%	0%	1,00	100%	0%	1,00	R\$ 65,14	100,00%
17.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)															
17.4.1	91926	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	850,50	4,02	3.419,01	850,50	100%	0%	850,50	100%	0%	850,50	R\$ 3.419,01	100,00%
17.4.2	91928	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	66,00	6,21	409,86	66,00	100%	0%	66,00	100%	0%	66,00	R\$ 409,86	100,00%
17.4.3	91930	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	286,75	8,69	2.491,86	286,75	100%	0%	286,75	100%	0%	286,75	R\$ 2.491,86	100,00%
17.4.4	91934	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	SINAPI	M	231,50	22,48	5.206,44	231,50	100%	0%	231,50	100%	0%	231,50	R\$ 5.206,44	100,00%
17.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS															
17.5.1	91996	TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	UN	5,00	35,09	175,45	5,00	100%	0%	5,00	100%	0%	5,00	R\$ 175,45	100,00%
17.5.2	91963	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SINAPI	UN	2,00	29,97	59,94	2,00	100%	0%	2,00	100%	0%	2,00	R\$ 59,94	100,00%
17.5.3	97587	LUMINÁRIAS LED SOBREPOR 270X1250MM, 18W	SINAPI	UN	3,00	309,24	927,72	3,00	100%	0%	3,00	100%	0%	3,00	R\$ 927,72	100,00%
17.5.4	S12608	REFLETOR LED 200W	ORSE	UN	20,00	265,22	5.304,40	20,00	100%	0%	20,00	100%	0%	20,00	R\$ 5.304,40	100,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)															
18.1	C3463	CONECTOR TIPO TERMINAL OLHAL PARA CABO #50MM²	SEINFRA	UN	15,00	7,21	108,15	15,00	100%	0%	15,00	100%	0%	15,00	R\$ 108,15	100,00%
18.2	98463	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO U COM DUPLA ROSCA	SINAPI	UN	18,00	25,16	452,88	18,00	100%	0%	18,00	100%	0%	18,00	R\$ 452,88	100,00%
18.3	98685	HASTE DE COBRE 2,4 M X 5/8" COPPERWELD	SINAPI	UN	18,00	84,22	1.515,96	18,00	100%	0%	18,00	100%	0%	18,00	R\$ 1.515,96	100,00%
18.4	98974	CABO DE COBRE NU 50MM²	SINAPI	M	255,00	84,00	21.420,00	255,00	100%	0%	255,00	100%	0%	255,00	R\$ 21.420,00	100,00%
18.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	SINAPI	UN	4,00	53,74	214,96	4,00	100%	0%	4,00	100%	0%	4,00	R\$ 214,96	100,00%
18.6	98463	PARAFUSO 5/16" INOX CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA	SINAPI	UN	15,00	25,16	377,40	15,00	100%	0%	15,00	100%	0%	15,00	R\$ 377,40	100,00%

Handwritten signature or initials.



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REFERENTE À TERCEIRA MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA NA U.I PROFESSOR OLIVEIRA ROMA BAIRRO CORRENTE CHAPADINHA - MA.

EMPRESA: ARCANJO COONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 03.720.572/0001-33

CONTRATO: Nº 231/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1900/2024 CONCORRÊNCIA Nº 018/2024

DATA: 27/01/2026

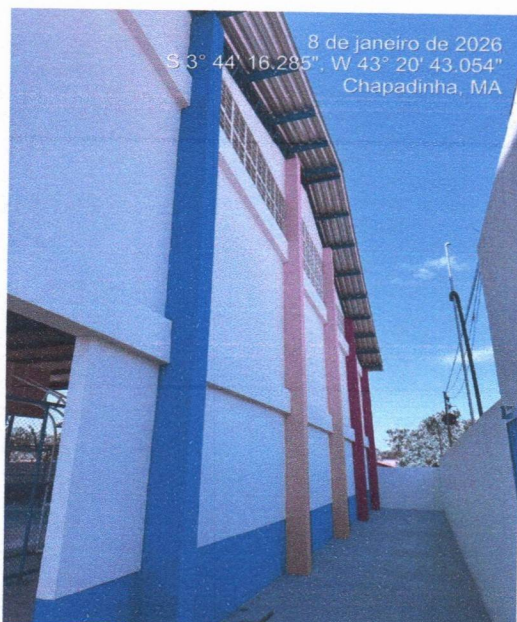


IMAGEM 1: execução de pintura externa, calçada externa

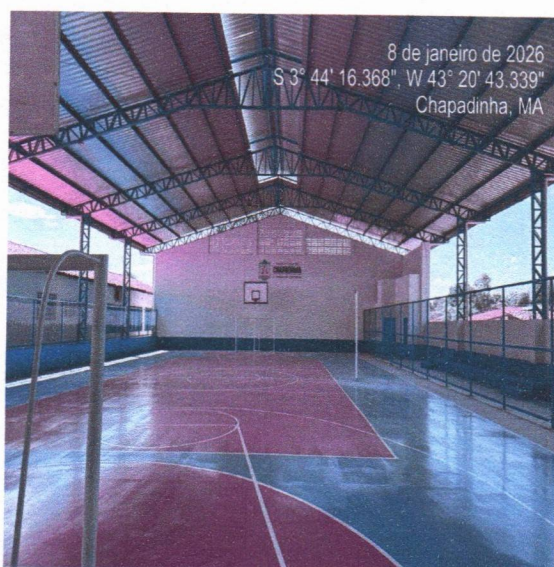


IMAGEM 2: cobertura metálica, piso da quadra e equipamentos

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.174-3
engenheiro Civil



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

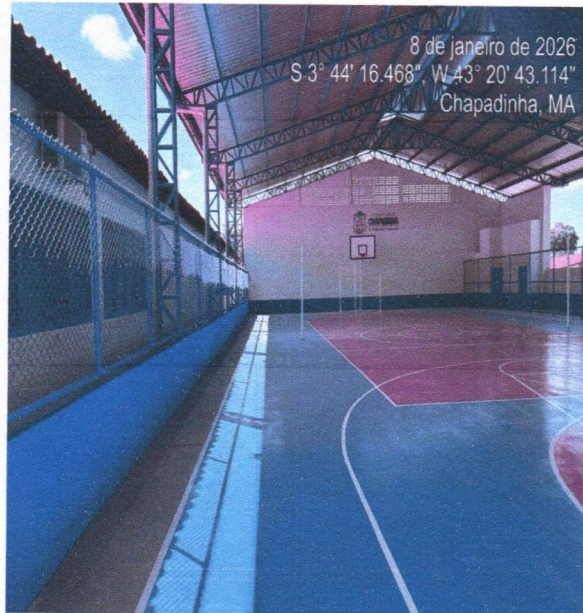


IMAGEM 3: execução de alambrado, mureta, , piso da quadra com marcação

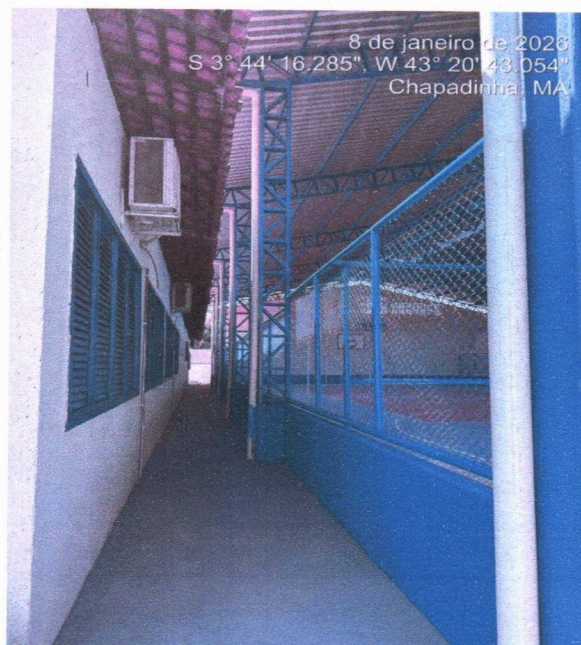


IMAGEM 4: execução de alambrado e drenagem de águas pluviais



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

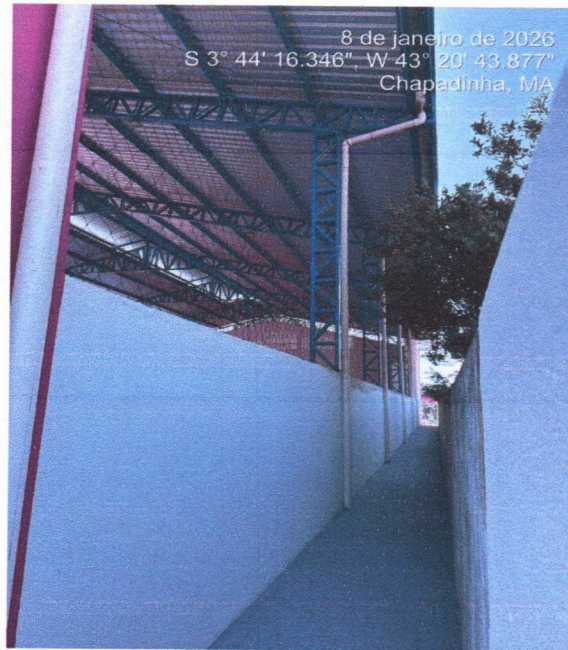


IMAGEM 5: execução de pintura lateral, calçada externa , drenagem de água pluviais (caixas de passagem, calhas e dutos)

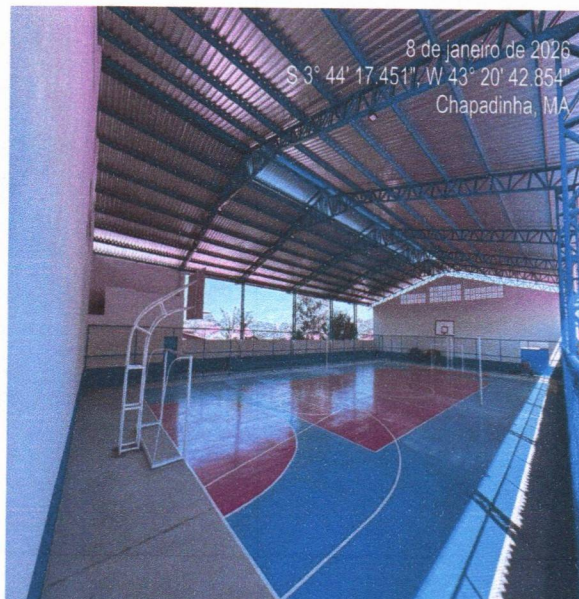


IMAGEM 6: execução de cobertura metálica, iluminação com refletores, piso da quadra e equipamentos

#?



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

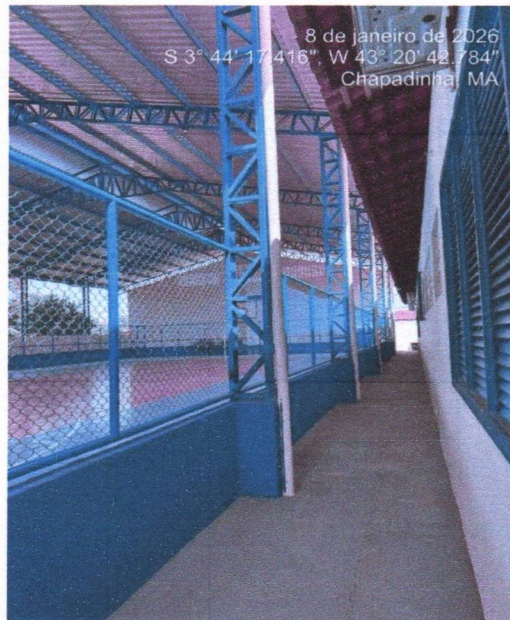


IMAGEM 7 execução de alambrado e drenagem de águas pluviais

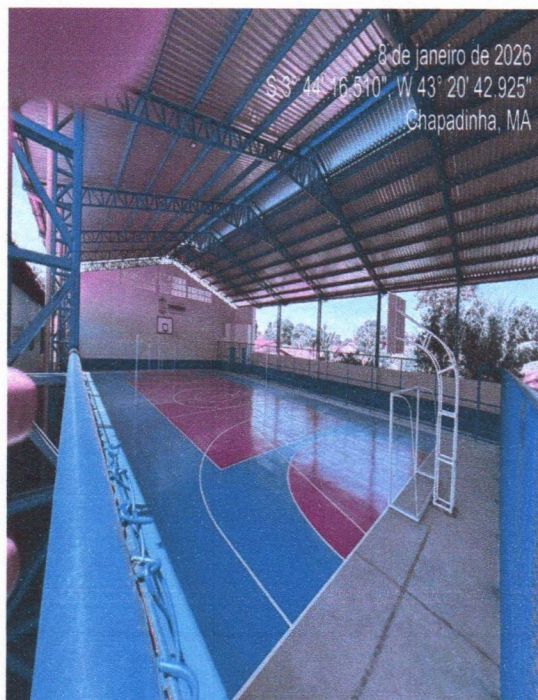


IMAGEM 8: equipamentos (trave de futebol, hastes de vôlei e tabela de basquete)



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



IMAGEM 09: vista interna da quadra poliesportiva executada

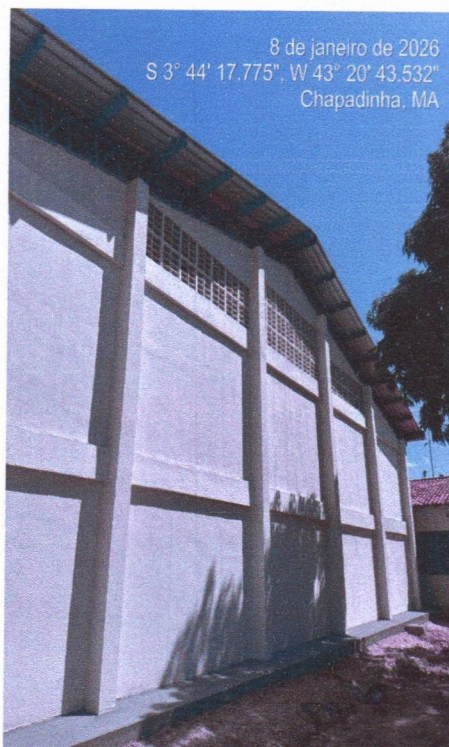


IMAGEM 10: execução de pintura do fundo da quadra



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



IMAGEM 11: execução de alambrado e drenagem de águas pluviais



IMAGEM 12: execução de alambrado e drenagem de águas pluviais


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
engenheiro Civil



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



IMAGEM 13: quadro de distribuição e extintor de incêndio

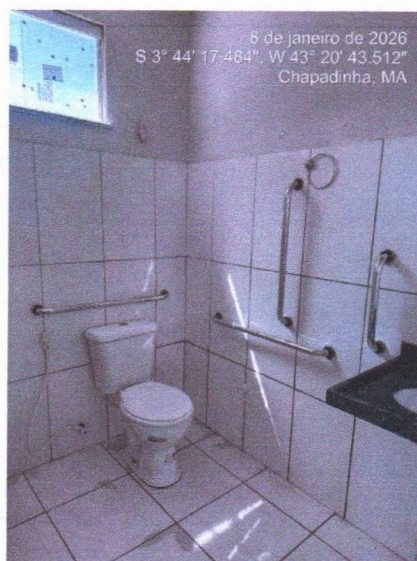
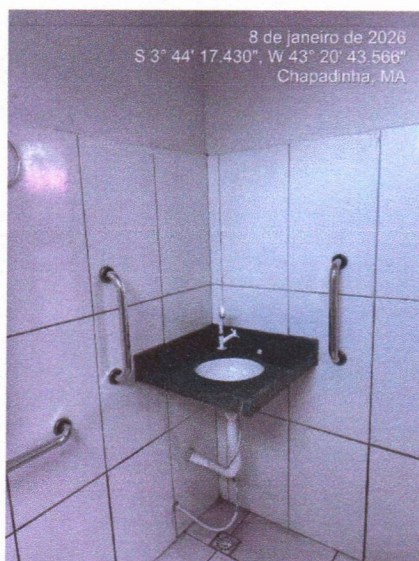


IMAGEM 14: execução do banheiro PCD, incluso vaso sanitário, lavatório e barras de apoio

Caxias/MA, em 05 de Fevereiro de 2026.

Ilma. Senhora.,


NARA DA SILVA MACEDO
Secretário Municipal de Educação
Nesta

Eu, Karllyson Carvalho Moura, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 0315375220061 SESP/MA, inscrito no CPF no 053.774.783-47, representante legal da Empresa ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na rua 13 de Maio, nº 339, Bairro centro, CEP :65608-480, Cidade de Caxias, Estado do Maranhão, vem requerer a Vossa Senhoria o pagamento da NFS-e nº 00005 no valor de **R\$ 420. 905,19 (Quatrocentos e vinte mil, novecentos e cinco reais e dezenove centavos)**, referente a 3ª (Terceira) medição da **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA NA U.I PROFESSOR OLIVEIRA ROMA BAIRRO CORRENTE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. LOTE 04, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1900/2024, CONCORRENCIA 018/2024**, e especificações constantes o Projeto Básico de Engenharia em anexo no processo licitatório.

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 124-4

Conta: 86910-4



KARLLYSON CARVALHO MOURA
ENG. CIVIL – CONFEA 1118602986
CPF Nº 053.774.783-47
Representante Legal

Chave de Acesso da NFS-e
2103000220372057200013300000000000526020277743881



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 05/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2026 16:39:28
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2026 16:39:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 03.720.572/0001-33	Inscrição Municipal 30975	Telefone (99) 8473-3314
Nome / Nome Empresarial ARCANJO CONSTRUCOES LTDA		E-mail ARCANJOCONSTRUCOES23@HOTMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 339, CENTRO		Município Caxias - MA	CEP 65606-180
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 30.887.156/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA		E-mail -	
Endereço SENADOR VITORINO FREIRE, 1042, CENTRO		Município Chapadinha - MA	CEP 65500-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Chapadinha - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA NA U.I. PROFESSOR OLIVEIRA ROMA BAIRRO CORRENTE NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. LOTE 04 DE ACORDO COM 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1900/2024 CONCORRÊNCIA 018/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Chapadinha - MA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 420.905,19	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 168.362,08	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 252.543,11	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 12.627,16

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 420.905,19	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 12.627,16
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 408.278,03

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012200

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 05 / 02 / 2026

Edvaldo Paz Nunes
CREMAG 110.313.774-3
Mecânico Civil



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6072/2025 APENSO AO PROC. ADM Nº 1900/2024**

1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA E A EMPRESA ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **Fundo Municipal de Educação de Chapadina**, inscrito no CNPJ nº 30.887.156/0001-05, com sede na Avenida Vitorino Freire nº 1045, Terras Dura, Chapadina – MA, representada pela Sra. **Nara da Silva Macedo**, Secretária Municipal de Educação, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada na Rua Treze de Maio Nº 339, Centro, Caxias/Ma inscrita no CNPJ sob o Nº 03.720.572/0001-33, representada pela Sr. **KARLLYSON CARVALHO MOURA**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Caxias - MA, nascido em 28/08/1991 portador da Cédula de Identidade nº 031537522006-1 SESP/MA e CPF Nº 053.774.783-47, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato Administrativo nº 231/2024, que tem por finalidade a execução da obra de **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de quadras poliesportivas no município de Chapadina (LOTE 1. Unidade Integrada Augustinho Ribeiro no município de Chapadina; LOTE 2. Unidade Integrada José Sousa dos Santos, no Pov. Canto do Ferreira, zona rural de Chapadina; LOTE 3. Unidade Escolar Dr. Otavio Passos no Pov. Brejo do Meio, zona rural de Chapadina e LOTE 4. Unidade Integrada Professor Oliveira Roma, situada no Bairro Corrente, zona urbana do Município de Chapadina/MA (de acordo com o 2º Termo aditivo)**, conforme especificações constantes no Contrato originário e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A prorrogação de prazo encontra respaldo no artigo 107 da **Lei nº 14.133/2021**, sendo necessária para a conclusão do objeto contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

- 4.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 231/2024 por mais **12 (doze) meses**, contados a partir de **31/12/2025**, com término previsto para **31/12/2026**.
- 4.2. Permanecem inalteradas todas as demais condições contratuais originalmente pactuadas, inclusive aquelas relativas às responsabilidades das partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO



Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 231/2024 que não tenham sido expressamente alteradas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de **31/12/2025**, sendo parte integrante e complementar do Contrato originário.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02** vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Chapadina – MA, 31 de Dezembro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nara da Silva Macedo

Contratante

ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA

KARLLYSON CARVALHO MOURA

Contratada



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250927928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

KARLLYSON CARVALHO MOURA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1118602986**

Registro: **111903MA**

Empresa contratada: **ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0000009750-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

AVENIDA Avenida Vitorino Freire

Nº: **1045**

Complemento:

Bairro: **Terras Dura**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato: **231/2024 P. ADM 1900/2024**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 983.912,52**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA OTILIA ALMEIDA BARROS

Nº: **1024**

Complemento:

Bairro: **Corrente**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Data de Início: **09/06/2025**

Previsão de término: **06/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-3.738189, -43.345060**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	768,63	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	768,63	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	768,63	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	768,63	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	768,63	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	768,63	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	768,63	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	768,63	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	768,63	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	768,63	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de quadra poliesportivas no município de Chapadinha - MA (LOTE 3. UNIDADE INTEGRADA OLIVEIRA ROMA, BAIRRO CORRENTE, CHAPADINHA. CONTRATO Nº 231/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1900/2024 CONCORRÊNCIA Nº 018/2024. As instalações elétricas de baixa tensão serão executadas nas edificações dos banheiros.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ycyb1
 Impresso em: 17/07/2025 às 16:05:42 por: , ip: 24.152.21.23

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250927928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

KARLLYSON CARVALHO MOURA

RNP: 1118602986

Data: 17/07/2025 16:05:42

KARLLYSON CARVALHO MOURA - CPF: *.774.783-****

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA - CNPJ:
30.887.156/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **18/06/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **8306384636**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ycyb1
Impresso em: 17/07/2025 às 16:05:42 por: , ip: 24.152.21.23

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.720.572/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/02/2000
NOME EMPRESARIAL ARCANJO CONSTRUÇOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARCANJO CONSTRUÇOES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TREZE DE MAIO		NÚMERO 339	COMPLEMENTO *****
CEP 65.606-180	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARCANJOCONSTRUÇOES23@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8473-3314	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitted on the day 02/02/2026 at 15:31:03 (date and hour of Brasília).


Página: 1/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.720.572/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/02/2000
NOME EMPRESARIAL ARCANJO CONSTRUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TREZE DE MAIO	NÚMERO 339	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.606-180	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARCANJOCONSTRUCOES23@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8473-3314	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/02/2026 às 15:31:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.720.572/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/02/2000
NOME EMPRESARIAL ARCANJO CONSTRUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TREZE DE MAIO	NÚMERO 339	COMPLEMENTO *****
CEP 65.606-180	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARCANJOCONSTRUCOES23@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8473-3314
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/02/2026 às 15:31:03 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.720.572/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/02/2000
NOME EMPRESARIAL ARCANJO CONSTRUÇOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.10-2-02 - Design de interiores 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TREZE DE MAIO	NÚMERO 339	COMPLEMENTO *****
CEP 65.606-180	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARCANJOCONSTRUÇOES23@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8473-3314
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/02/2026** às **15:31:03** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCANJO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.720.572/0001-33
Certidão n°: 7099340/2026
Expedição: 02/02/2026, às 15:33:30
Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCANJO CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.720.572/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.720.572/0001-33

Razão

ARCANJO CONSTRUCOES LTDA

Social:

Endereço:

R TREZE DE MAIO 339 / CENTRO / CAXIAS / MA / 65606-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012706421306594870

Informação obtida em 02/02/2026 15:34:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARCANJO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.720.572/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:59:04 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2026.

Código de controle da certidão: **EDAB.BEBF.9F58.0CD7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 114576/25

Data da

04/12/2025 11:57:50

Inscrição Estadual: 128224320

CPF/CNPJ: 03720572000133

Razão Social: ARCANJO CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 339 CEP: 65606180 - CENTRO

Telefone: (99)81111179

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2026 15:04:50



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 029291/26

Data da

03/02/2026 14:44:36

Inscrição Estadual: 128224320

CPF/CNPJ: 03720572000133

Razão Social: ARCANJO CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 339 CEP: 65606180 - CENTRO

Telefone: (99)81111179

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/02/2026 15:04:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
GOVERNO DE CAXIAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0002162

Informações do Contribuinte

CÓDIGO 230607	NOME DO CONTRIBUINTE ARCANJO CONSTRUCOES LTDA	CPF / CNPJ 03.720.572/0001-33
ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO	NÚMERO 339	COMPLEMENTO
NÚMERO CEP 	MUNICÍPIO - UF CAXIAS - MA	BAIRRO CENTRO
	APTO / SALA 	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 053.774.783-47	NOME DO REQUERENTE ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA	FINALIDADE NADA CONSTA
	OBSERVAÇÕES 	

**Data de Emissão: 05/02/2026 Hora de Emissão:
15:30:56**

Validade: 06/05/2026

A prefeitura do **Município de Caxias - MA**, por intermédio da Secretaria Adjunta de Gestão Fazendária, **CERTIFICA** que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL** não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

CAXIAS (MA), 05 de Fevereiro de 2026

