

OFICIO Nº 079/2026 - GAB. SINURB

Chapadina MA, 02 de março de 2026.

À Senhora

**Nara da Silva Macedo**

Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição dos serviços construção de muros e passeios em prédios públicos a serviço da Secretaria Municipal de Educação, executados pela Empresa I.L. Negócios e Serviços LTDA.

**Senhora Secretária,**

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **3ª medição** referente a serviços de **construção de muros e passeios em prédios públicos a Serviço da Secretaria Municipal de Educação**, executados pela Empresa **I.L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, sob nº CNPJ: 13.715.468/0001-04, Conforme:

**Contrato** nº 273/2025,

**Processo Adm.** nº 3504/2025,

**Concorrência** nº 027/2025,


**Local de execução:** Escola de 06 salas padrão FNDE do Bairro Cohab, **NF** nº 64,

**Valor** R\$ 195.630,28.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO  
EM 03/03/26  
HORÁRIO: 10:22  
  
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO



Ilmo. Senhor

**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinda-MA

Nesta

**I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 737 – SALA, A Bairro Corrente, CEP:65500-000, Cidade de Chapadinda, Estado do Maranhão, vem requerer a Vossa Senhoria a confirmação da medição única dos serviços executados, REFERENTE A 3ª **MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ( CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DE 06 SALAS DO BAIRRO COHAB, PADRÃO FNDE ), CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, MEDIANTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - PROC. ADM. Nº 3504/2025.**

Chapadinda/MA, 20 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 13.715.468/0001-04

**I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 13.715.468/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA

RECEBIDO EM: 25/02/2026

*marcelo*

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04**

AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINDA – MA

**CONTATO:(98) 98595-8743**



Ilmo. Senhor

**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Chapadinda-MA

Nesta

**I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 737 – SALA, A Bairro Corrente, CEP:65500-000, Cidade de Chapadinda, Estado do Maranhão, vem requerer a Vossa Senhoria a confirmação da medição única dos serviços executados, REFERENTE A 3ª **MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ( CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DE 06 SALAS DO BAIRRO COHAB, PADRÃO FNDE ), CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, MEDIANTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - PROC. ADM. Nº 3504/2025.**

Chapadinda/MA, 20 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 13.715.468/0001-04

---

**I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 13.715.468/0001-04

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04**

AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINDA – MA

**CONTATO:(98) 98595-8743**




PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3ª MEDIÇÃO																				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATO	FONTE	UND	QUANTO ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADES			VALORES								
									ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO			
7.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022		SINAPI	KG	1.500,00	14,56	21.840,00	338,73	251,05	16,74%	598,78	910,22	4.931,91	3.655,29	16,74%	8.587,20	38,32%	13.252,80	60,68%
7.3	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020		SINAPI	M2	874,00	55,83	48.795,42	255,88	128,04	14,65%	383,92	490,08	14.285,78	7.148,47	14,65%	21.434,25	43,93%	27.361,17	56,07%
7.4	103689	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022		SINAPI	M3	43,50	1.040,94	45.280,89	11,10	6,40	14,71%	17,50	26,00	11.554,43	6.662,02	14,71%	18.216,45	40,23%	27.064,44	59,77%
8	CAÇADAS/PASSEIOS							610.122,24	0,00			0,00	0,00	11.164,20	0,00	0,00%	11.164,20	1,83%	598.958,04	98,17%
8.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 09/2022. E=6CM		SINAPI	M3	504,00	850,06	428.430,24	10,08		0,00%	10,08	493,92	8.568,60	0,00	0,00%	8.568,60	2,00%	419.861,64	98,00%
8.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO		SEINFRA	M3	1.680,00	108,15	181.682,00	24,00		0,00%	24,00	1.656,00	2.595,60	0,00	0,00%	2.595,60	1,43%	179.086,40	98,57%
9	PINTURA							114.835,10	0,00			0,00	0,00	18.871,23	9,85%	9,83%	28.554,75	24,87%	86.280,35	75,13%
9.1	95826	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 03/2024		SINAPI	M2	4.000,00	17,27	69.080,00	215,76		0,00%	215,76	3.784,24	3.726,18	0,00	0,00%	3.726,18	5,39%	65.353,82	94,61%
9.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF. 01/2020		SINAPI	M2	230,00	48,57	11.171,10	65,84	0,00	0,00%	65,84	164,16	3.197,85	0,00	0,00%	3.197,85	28,63%	7.973,25	71,37%
9.3	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES		SEINFRA	M2	4.400,00	7,86	34.584,00	1.520,00	1.232,00	28,00%	2.752,00	1.648,00	11.947,20	9.683,52	28,00%	21.630,72	62,55%	12.953,28	37,45%
								2.033.924,92				0,00	0,00	266.579,04	154.185,28	7,58%	422.764,32	20,79%	1.811.160,61	79,21%
								546.779,02				0,00	0,00	72.194,05	41.445,00	7,58%	113.639,05	20,79%	433.079,97	79,21%
								2.580.643,94				0,00	0,00	340.773,09	195.630,28	7,58%	536.403,37	20,79%	2.044.240,58	79,21%


DOIS MILHÕES QUINHENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 195.630,28 (CENTO E TRINTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Lucas Ariceira Maciel  
Engenheiro Civil  
CREA 1116770288

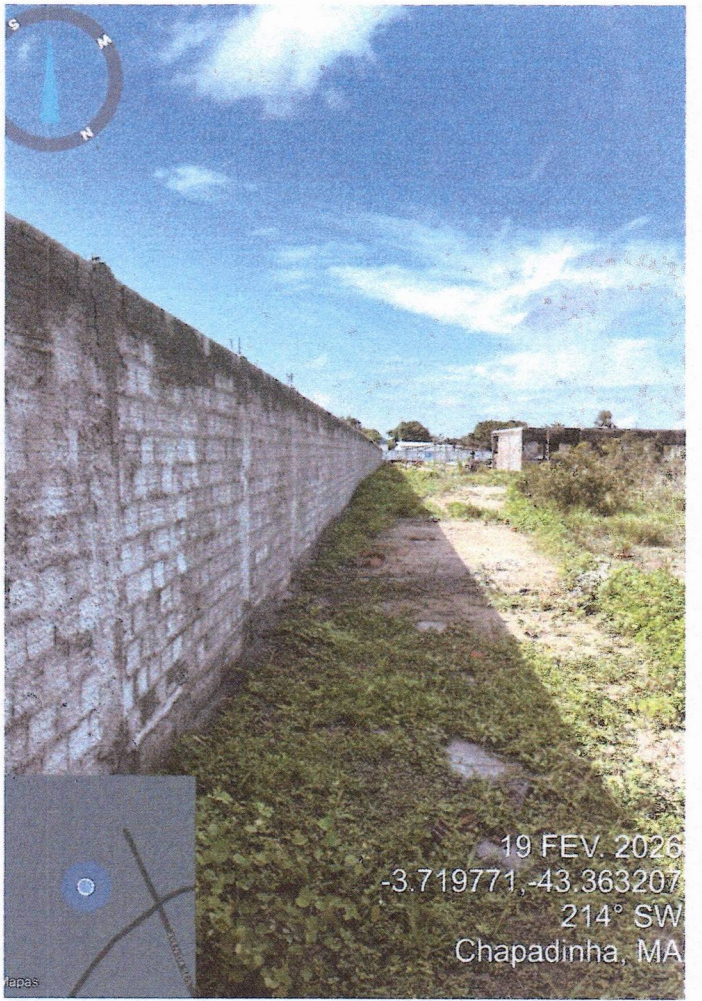

19 FEV. 2026  
-3.719771, -43.363207  
214° SW  
Chapadinha, MA

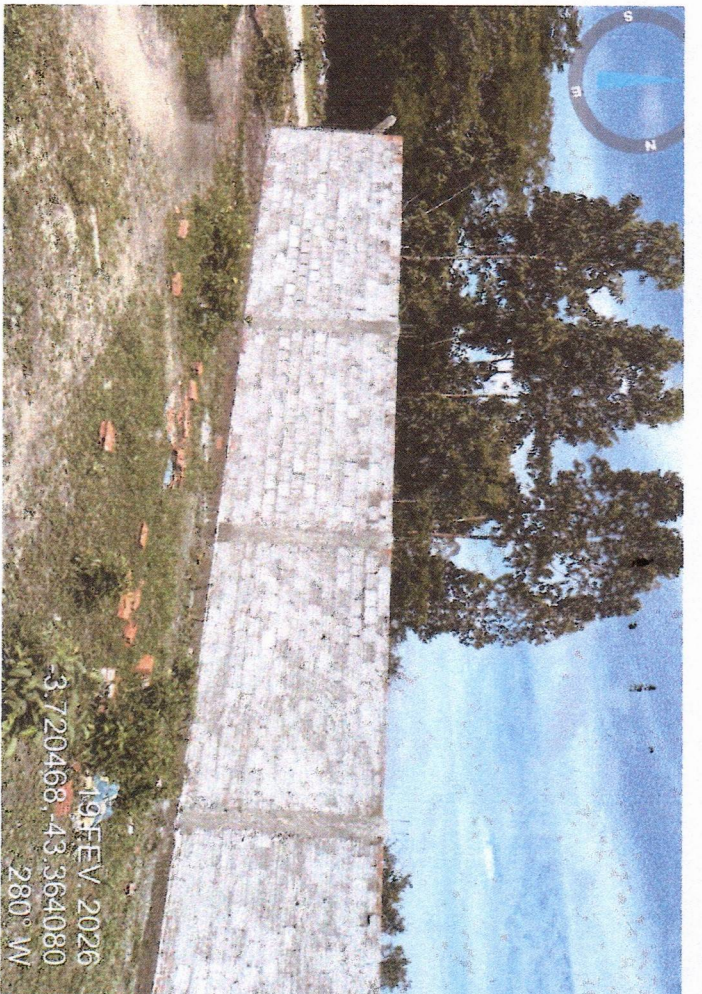



19 FEV 2026  
-3.720468, -43.364080  
280° W





19 FEV. 2026  
-3.720607, -43.363412  
125° SE  
Chapadinha, MA



19 FEV. 2026  
-3.719775, -43.363887  
241° SW  
Chapadinha, MA

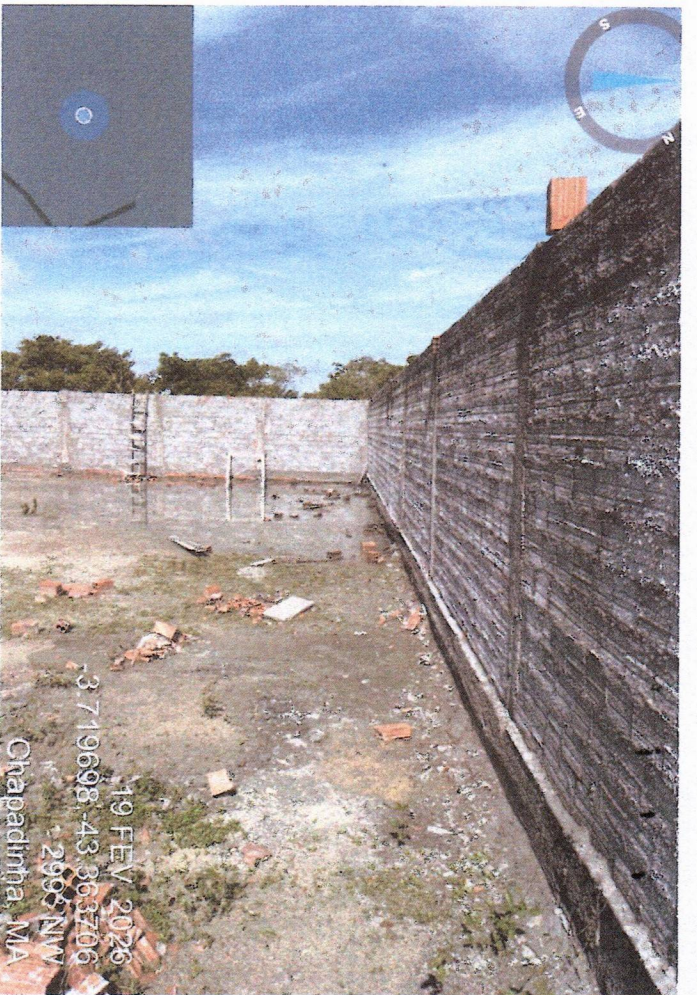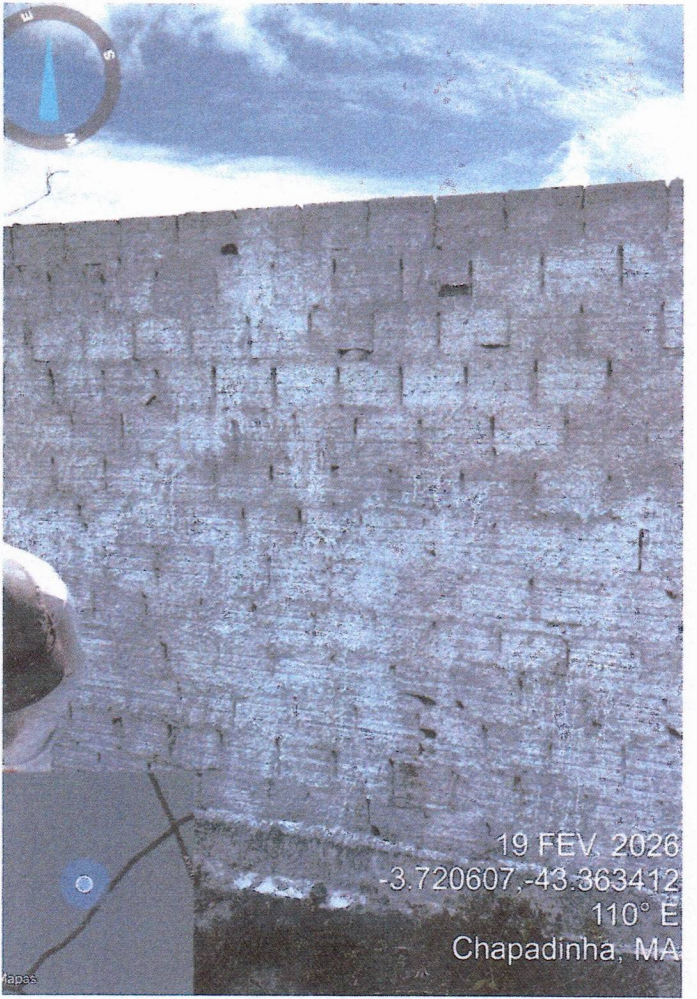

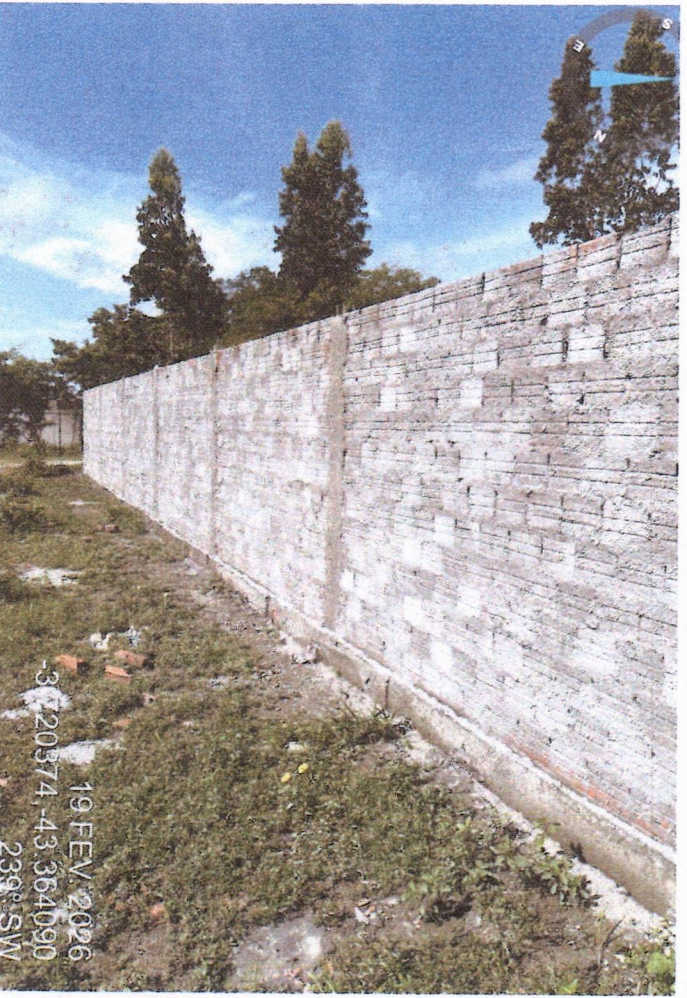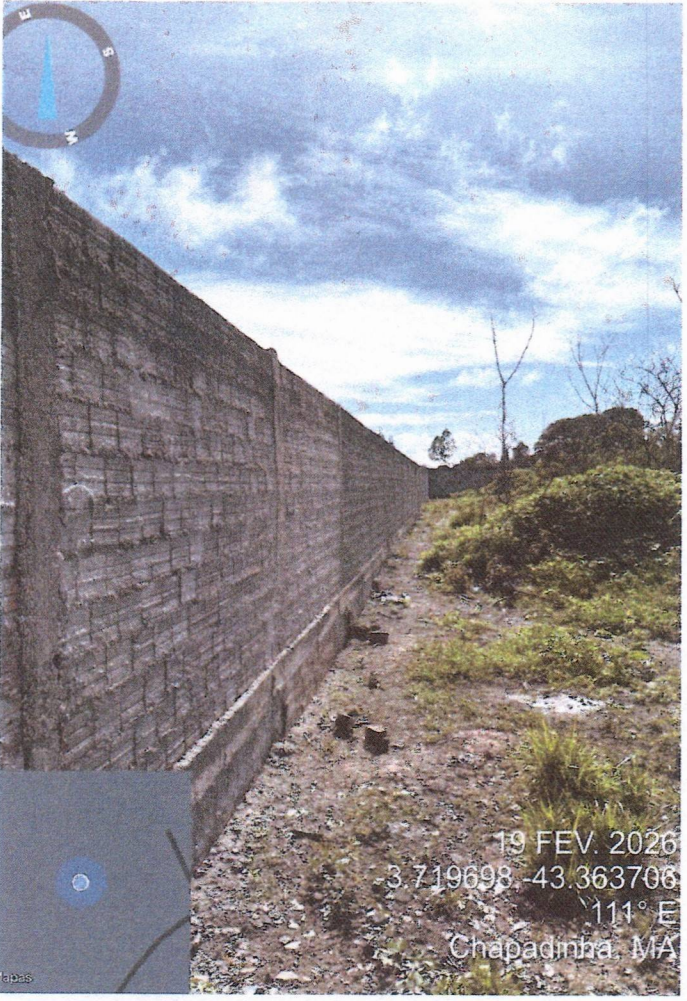

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DE 06 SALAS DO BAIRRO COHAS, PADRÃO FNDE  
 CONTRATO: 2717/2025  
 PROC. ADM. N.º 394/2025  
 EMPRESA: L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.715.468/0001-04  
 MEDIÇÃO: 3 195,630,28  
 VALOR:

PERÍODO: 12/12/2025 A 12/02/2026  
 DATA: 25/02/2026



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATO				QUANTIDADES				VALORES									
			FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.247,00									1.201,54	1.049,60	12,73%	2.251,14	27,30%	5.995,86	72,70%
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	8,00	750,00	6.000,00	1,00	1,00	12,50%	2,00	6,00		750,00	750,00	12,50%	1.500,00	25,00%	4.500,00	75,00%
1.2	S04616	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	ORSE	M	2.100,00	1,07	2.247,00	422,00	280,00	13,33%	702,00	1.388,00		451,54	299,60	13,33%	751,14	33,43%	1.495,86	66,57%
2	MOVIMENTO DE SOLO				66.042,90			0,00			0,00			12.216,74	8.840,13	13,33%	21.066,87	31,88%	44.987,04	68,12%
2.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME (SEM AF_01/2024)	SINAPI	M3	210,00	196,53	41.271,30	42,20	28,00	13,33%	70,20	139,80		8.293,57	5.502,84	13,33%	13.796,41	33,43%	27.474,89	66,57%
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_01/2024	SINAPI	M3	180,00	137,62	24.771,60	28,50	24,25	13,47%	52,75	127,25		3.922,17	3.337,29	13,47%	7.259,46	29,31%	17.512,15	70,69%
3	FUNDAÇÃO				368.427,47			0,00			0,00			68.833,89	48.445,02	13,15%	117.278,91	31,83%	251.145,56	68,17%
3.1	BLOCOS DE FUNDAÇÃO				116.225,73			0,00			0,00			18.720,64	15.656,92	13,47%	34.377,55	29,59%	81.848,19	70,42%
3.1.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2021	SINAPI	M3	180,00	620,24	111.643,20	28,50	24,25	13,47%	52,75	127,25		17.676,84	15.040,92	13,47%	32.717,66	29,31%	78.925,54	70,69%
3.1.2	94974	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	9,00	509,17	4.582,53	2,05	1,21	13,44%	3,26	5,74		1.043,80	616,10	13,44%	1.659,89	36,22%	2.922,64	63,78%
3.2	ALICERCE/BALDRAME				69.833,40			0,00			0,00			14.033,19	9.311,12	13,33%	23.344,31	33,43%	46.489,09	66,57%
3.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	210,00	332,54	69.833,40	42,20	28,00	13,33%	70,20	139,80		14.033,19	9.311,12	13,33%	23.344,31	33,43%	46.489,09	66,57%
3.3	VIGA BALDRAME				182.368,34			0,00			0,00			36.080,06	23.476,98	12,87%	59.557,05	32,65%	122.811,29	67,34%
3.3.1	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	1.070,00	20,02	21.421,40	186,42	177,87	16,62%	364,29	705,71		3.732,13	3.560,96	16,62%	7.293,09	34,05%	14.126,31	65,95%
3.3.2	98544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	3.650,00	18,27	66.685,50	733,44	402,18	11,02%	1.135,62	2.514,38		13.399,95	7.347,93	11,02%	20.747,78	31,11%	45.937,72	68,89%
3.3.3	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	SINAPI	M3	42,00	795,72	33.420,24	7,59	5,60	13,33%	13,19	28,81		6.039,51	4.456,03	13,33%	10.495,55	31,40%	22.924,69	68,60%
3.3.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	SINAPI	M2	840,00	72,43	60.841,20	178,22	112,00	13,33%	280,22	549,78		12.908,47	8.112,16	13,33%	21.020,63	34,55%	39.920,57	65,45%
4	REVESTIMENTO				224.824,00			0,00			0,00			20.926,08	8.451,52	3,76%	29.377,60	13,07%	195.446,40	86,93%
4.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	SINAPI	M2	8.400,00	6,86	57.624,00	1.735,76	1.232,00	14,67%	2.967,76	5.432,24		11.907,31	8.451,52	14,67%	20.358,83	35,33%	37.265,17	64,67%
4.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	SINAPI	M2	4.000,00	41,80	167.200,00	215,76		0,00%	215,76	3.784,24		9.018,77	0,00	0,00%	9.018,77	5,39%	158.181,23	94,61%
5	ESQUADRIAS				78.983,90			0,00			0,00			13.737,70	0,00	0,00%	13.737,70	17,39%	65.246,20	82,61%
5.1	S08753	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLA), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS HORIZONTAIS DE 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS	ORSE	M2	50,00	471,67	23.583,50	22,00		0,00%	22,00	28,00		10.376,74	0,00	0,00%	10.376,74	44,00%	13.206,76	56,00%
5.2	S04716	GRADE EM METALON	ORSE	M2	180,00	307,78	55.400,40	10,92		0,00%	10,92	169,08		3.360,96	0,00	0,00%	3.360,96	6,07%	52.039,44	93,93%
6	PAREDES E PAINÉIS				384.510,00			0,00			0,00			79.454,41	51.268,00	13,33%	130.722,41	34,00%	253.787,59	66,00%
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPURSA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	M2	4.200,00	91,55	384.510,00	867,88	560,00	13,33%	1.427,88	2.772,12		79.454,41	51.268,00	13,33%	130.722,41	34,00%	253.787,59	66,00%
7	ESTRUTURA				177.932,31			0,00			0,00			42.174,25	26.447,49	14,86%	68.621,74	38,57%	109.310,57	61,43%
7.1	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	SINAPI	KG	3.800,00	16,32	62.016,00	698,66	550,35	14,48%	1.249,01	2.550,99		11.402,13	8.961,71	14,48%	20.363,84	32,87%	41.632,16	67,13%

Wendelsoth Dióte Nunes Brito  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PA 1729353-0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATO			QUANTIDADES			VALORES									
			UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTEIOR	MEDIDO NO PERÍODO	%	ACUMULADO ANTEIOR	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO	ACUMULADO TOTAL	SALDO				
7.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.500,00	14,56	21.840,00	338,73	251,05	16,74%	589,78	910,22	4.931,91	3.655,29	16,74%	8.587,20	13.252,80	39,32%	60,68%
7.3	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	874,00	55,83	48.795,42	255,88	128,04	14,65%	383,92	490,08	14.285,78	7.148,47	14,65%	21.434,25	27.361,17	43,99%	56,07%
7.4	103689	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	43,50	1.040,94	45.280,89	11,10	6,40	14,71%	17,50	26,00	11.554,43	6.662,02	14,71%	18.216,45	27.064,44	40,23%	59,77%
8	CALÇADAS/PASSEIOS	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022. E=6CM	M3	504,00	850,06	428.430,24	10,08		0,00%	10,08	493,92	8.586,60	0,00	0,00%	8.586,60	419.861,64	2,00%	98,00%
8.2	C0330	ATERRO - C/COMPACTAÇÃO MANUAL - S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1.680,00	108,15	181.692,00	24,00		0,00%	24,00	1.656,00	18.871,23	2.595,60	0,00%	2.595,60	179.096,40	1,43%	98,57%
9	PINTURA	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_03/2024	M2	4.000,00	17,27	69.080,00	215,76		0,00%	215,76	3.784,24	3.726,18	0,00	0,00%	3.726,18	65.353,82	5,39%	94,61%
9.1	95626	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	230,00	48,57	11.171,10	65,84	0,00	0,00%	65,84	164,16	3.197,85	0,00	0,00%	3.197,85	7.973,25	28,63%	71,37%
9.3	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	4.400,00	7,86	34.584,00	1.520,00	1.232,00	28,00%	2.752,00	1.648,00	11.947,20	9.683,52	28,00%	21.630,72	12.953,28	62,55%	37,45%
		VALOR ORÇAMENTO:				2.033.924,92				0,00	0,00	268.579,04	154.185,28	7,58%	422.764,32	1.611.160,61	20,79%	79,21%
		VALOR BDI TOTAL:				546.719,02				0,00	0,00	72.194,05	41.445,00	7,56%	113.639,05	433.079,97	20,79%	79,21%
		VALOR TOTAL:				2.580.643,94				0,00	0,00	340.773,09	195.630,28	7,56%	536.403,37	2.044.240,58	20,79%	79,21%

DOIS MILHÕES QUINHENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 195.630,28 (CENTO E TRINTA MIL OTOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111726553-0

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
REFERENTE A 02ª MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 02ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS  
MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATO: 273/2025


PROC. ADM. N° 3504/2025

1.1 CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE NO BAIRRO COHAB



**Imagem 01** – Execução de construção de muro


Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 11729353-0



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




**Imagem 02** – Execução de construção de muro

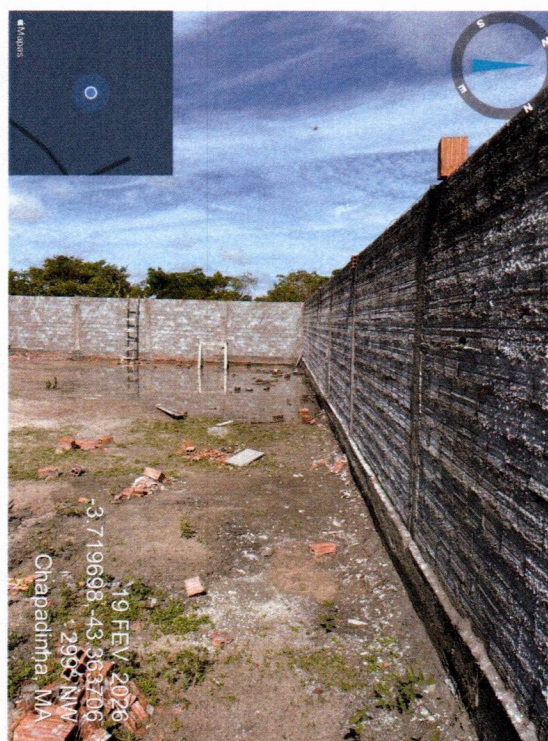


**Imagem 03** – Execução de construção de muro

Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 11729353-0



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

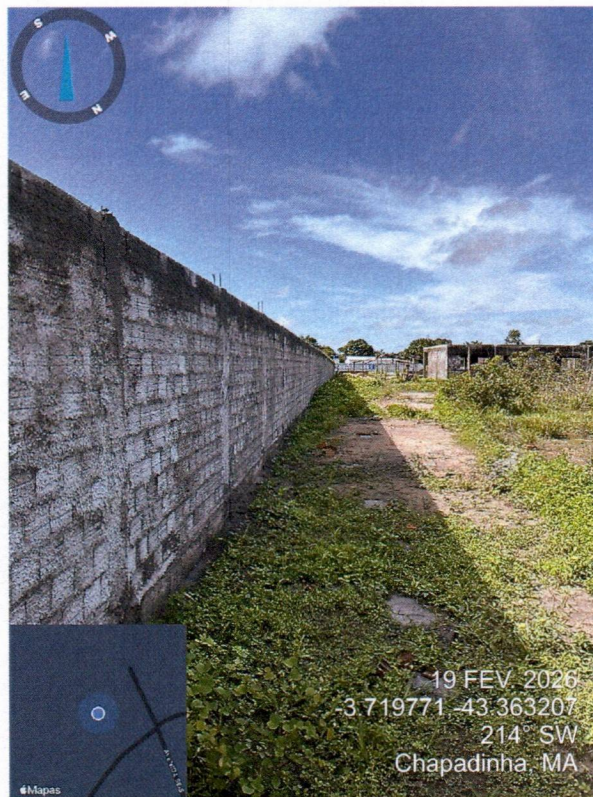


**Imagem 04** – Execução de construção de muro



**Imagem 05** – Execução de construção de muro

Engenheiro Civil  
CREA-MA 11729353-0



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



**Imagem 06** – Execução de construção de muro



**Imagem 07** – Execução de construção de muro

Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 111729353-0  
*[Handwritten signature]*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




**Imagem 08** – Execução de construção de muro



**Imagem 09** – Execução de construção de muro

Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111729353-0



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



**Imagem 10** – Execução de construção de muro

Chapadinha-MA 25 de fevereiro de 2026

Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111729353-0

---

Wenderson Dione Nunes Viana  
Eng. Civil CREA MA 111729353-0  
Fiscal da obra

**OFICIO Nº 05/2026**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

A EMPRESA **IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) 13.715.468/0001-04, SEDIADA NO ENDEREÇO: AV: PRES. VARGAS, Nº 737 – SALA A, CENTRO, CHAPADINHA – MA, CEP: 65.500-000.

VEM ATRAVÉS DESTES, SOLICITAR GENTILMENTE O PAGAMENTO DA NF Nº 202600000000064, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ( CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DE 06 SALAS DO BAIRRO COHAB, PADRÃO FNDE ), CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, MEDIANTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - PROC. ADM. Nº 3504/2025, O VALOR TOTAL REFERENTE AO SERVIÇOS É DE R\$ 195.630,28, O VALOR PODE SER DEPOSITADO NA SEGUINTE CONTA:

**BANCO: SICOOB**

**AGÊNCIA: 4436**

**CONTA CORRENTE: 95370**

**RAZÃO SOCIAL: I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 13.715.468/0001-04**

CHAPADINHA – MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 13.715.468/0001-04

---

**I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 13.715.468/0001-04

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04**

AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

**CONTATO:(98) 98595-8743**



# PREFEITURA DE CHAPADINDHA

Secretaria Municipal de Fazenda



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

### IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

<b>Data de Emissão</b> 25/02/2026 13:01:19	<b>Natureza da Operação</b> EXIGIVEL	<b>Tributação</b> TRIBUTÁVEL	<b>Período de Tributação</b> 02/2026
<b>Local de Tributação</b> LOCAL DA PRESTACAO	<b>Local da Prestação</b> CHAPADINDHA/MA	<b>Número RPS</b>	<b>Série RPS</b>
		<b>Data RPS</b>	

Número da Nota  
**202600000000064**  
Data de Emissão  
**25/02/2026 13:01:19**  
Código de Verificação  
**V3XU-QV6E**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



**Nome/Razão Social**  
I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA  
**Endereço**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 737 - BAIRRO CORRENTE - CEP:65.500-000 - CHAPADINDHA/MA

**CPF/CNPJ** 13.715.468/0001-04    **Insc Municipal** 2626    **Insc Estadual**    **Telefone** 9898595874    **E-mail** il.negocioseservicos@gmail.com

### TOMADOR DOS SERVIÇOS

**Nome/Razão Social** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINDHA - MA    **CPF/CNPJ** 30.887.156/0001-05    **Insc Municipal**  
**Endereço** AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE,1045 - TERRAS DURA, CHAPADINDHA/MA - CEP: 65500000

**Telefone**    **E-mail**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Serviço** 0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,

**Atividade** 4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**Descrição** SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**ATESTO QUE:**

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 25 / 02 / 2026

Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 11429353-0

### MAPA DE DEDUÇÕES

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS		15502	77.940,00	77.940,00
				<b>77.940,00</b>

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

NF REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ( CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DE 06 SALAS DO BAIRRO COHAB, PADRÃO FNDE ), CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, MEDIANTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2025 - PROC. ADM. Nº 3504/2025.

### VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFS-e

Valor dos Serviços	Deduções	Acréscimos	Desc. Condicionados	Desc Incondicionado	Crédito
R\$ 195.630,28	R\$ 77.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>Outras Retenções</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>ISS</b>	<b>ISS Retido</b>	<b>Total das Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
R\$ 117.690,28	2,00 %	R\$ 2.353,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 195.630,28</b>

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

**Número da Nota** 202600000000064    Recebi da empresa I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.  
**Código de Verificação** V3XU-QV6E    Consulte a autenticidade no site <https://chapadinda.portalpublico.net> ou através da leitura do QRCode





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Certidão n°: 51082616/2025

Expedição: 02/09/2025, às 10:25:02

Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.715.468/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.715.468/0001-04  
**Razão Social:** I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AVE PRESIDENTE VARGAS 737 SALA A / CORRENTE / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/02/2026 a 18/03/2026

**Certificação Número:** 2026021702091838240501

Informação obtida em 25/02/2026 12:46:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 13.715.468/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:20:19 do dia 29/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2026.

Código de controle da certidão: **90B2.582B.55E7.F693**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 043804/26

**Data da**

25/02/2026 12:45:25

**Inscrição Estadual:** 126764859

**CPF/CNPJ:** 13715468000104

**Razão Social:** I L NEGACIOS E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE

**Telefone:** (98)91117233

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/05/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/02/2026 12:45:25



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 019541/26

**Data da**

25/02/2026 12:46:09

**Inscrição Estadual:** 126764859

**CPF/CNPJ:** 13715468000104

**Razão Social:** I L NEGACIOS E SERVIAOS LTDA

**Endereço:** AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE

**Telefone:** (98)91117233

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/05/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/02/2026 12:46:09



PREFEITURA DE CHAPADINHA  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



25/02/2026 12:50:18

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 420/2026**  
**AUTENTICAÇÃO:0F66D5D47CC484792935962C50253404**

**CERTIFICO**, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **13.715.468/0001-04**, situada neste Cidade, **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **26/05/2026**.

CHAPADINHA-MA, 25/02/2026.



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



03/12/2025 12:59:54

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2776/2025**  
**AUTENTICAÇÃO:25F934D475A8CFDFABFA603816D6CA4F**

**CERTIFICO**, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I. L. NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **13.715.468/0001-04**, situada nesta Cidade **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CORRENTE**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/03/2026**.

CHAPADINHA-MA, 03/12/2025.
