OFICIO Nº 415/2026-GAB. SINURB

Chapadinha MA, 17 de setembro de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 1ª medição dos serviços de construção de sistemas simplificados de abastecimento de água em escolas da zona rural do município de Chapadinha-MA, executados pela empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **1ª medição** de serviços executados pela Empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA,** sob CNPJ n° 00.513.233/0001-98, referente a serviços de **construção de sistemas simplificados de abastecimento de água em escolas da zona rural do município de Chapadinha-MA,** conforme:

Contrato n° 151/2026,
Processo Adm. n° 0200/2026
Concorrência n° 003/2026,
Local de execução dos serviços: Escola Povoado Vila Nova,
NF n° 098,
Valor R$ 121.769,05

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM 22/09/26
HORÁRIO: 17:08
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF:. 1ª MEDIÇÃO CONTRATO 151/2026 (POVOADO VILA NOVA)

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA,** estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA**, **CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98,** , através da sua sócio proprietário **THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15,** RG **888297980,** vem solicitar a **1 medição do contrato para execução dos serviços de construção de sistema simplificado de abastecimento de agua em escolas da zona rural do município de chapadinha (POVOADO VILA NOVA).**

São Luís, MA – 21 de AGOSTO de 2026

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315

Assinado de forma digital por THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.08.25 16:05:07 -03'00'

THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992
Email: biapdiniz@gmail.com

IDEAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO	1ª (PRIMEIRA)
PERIODO	16/06/2026-21/08/2026
DATA	21/08/2026
LOCAL	POVOADO VILA NOVA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	
								AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 30.074,12								
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00		1,00	1,00	R$ -	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ -	0,00%
1.2	ADM LOCAL SSAD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SSAD	COMP.	MES	3,00	R$ 9.617,04	R$ 28.851,12		2,00	2,00	R$ -	R$ 19.210,75	R$ 19.210,75	R$ 9.640,37	33,41%
1.3	98524	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	SINAPI	M2	100,00	R$ 4,73	R$ 473,00		100,00	100,00	R$ -	R$ 473,00	R$ 473,00	R$ -	0,00%
2	CAPTAÇÃO						R$ 103.558,20								
2.1	CANTEIRO DE POÇOS						R$ 7.125,91								
2.1.1	240101	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CAEMA	KM	35,00	R$ 20,00	R$ 700,00		35,00	35,00	R$ -	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ -	0,00%
2.1.2	240201	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	CAEMA	UN	1,00	R$ 309,29	R$ 309,29		1,00	1,00	R$ -	R$ 309,29	R$ 309,29	R$ -	0,00%
2.1.3	240204	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	CAEMA	M3	9,24	R$ 97,74	R$ 903,12		9,24	9,24	R$ -	R$ 903,12	R$ 903,12	R$ 0,00	0,00%
2.1.4	S05088	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	ORSE	M2	25,00	R$ 208,54	R$ 5.213,50		25,00	25,00	R$ -	R$ 5.213,50	R$ 5.213,50	R$ -	0,00%
2.2	PERFURAÇÃO						R$ 47.772,50								
2.2.1	240312	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	CAEMA	M	50,00	R$ 78,30	R$ 3.915,00		50,00	50,00	R$ -	R$ 3.915,00	R$ 3.915,00	R$ -	0,00%
2.2.2	240324	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	CAEMA	M	50,00	R$ 82,23	R$ 4.111,50		50,00	50,00	R$ -	R$ 4.111,50	R$ 4.111,50	R$ -	0,00%
2.2.3	240335	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	CAEMA	M	50,00	R$ 90,44	R$ 4.522,00		40,00	40,00	R$ -	R$ 3.617,60	R$ 3.617,60	R$ 904,40	20,00%
2.2.4	240342	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	CAEMA	M	50,00	R$ 104,01	R$ 5.200,50		0,00	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.200,50	100,00%
2.2.5	240309	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 0 A 50 M)	CAEMA	M	50,00	R$ 133,20	R$ 6.660,00		50,00	50,00	R$ -	R$ 6.660,00	R$ 6.660,00	R$ -	0,00%
2.2.6	240321	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 50 A 100M)	CAEMA	M	50,00	R$ 136,67	R$ 6.833,50		50,00	50,00	R$ -	R$ 6.833,50	R$ 6.833,50	R$ -	0,00%
2.2.7	240332	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 100 A 150M)	CAEMA	M	50,00	R$ 152,71	R$ 7.635,50		40,00	40,00	R$ -	R$ 6.108,40	R$ 6.108,40	R$ 1.527,10	20,00%
2.2.8	240339	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 150 A 200 M)	CAEMA	M	50,00	R$ 177,89	R$ 8.894,50			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.894,50	100,00%

2.3	**COMPLEMENTAÇÃO**							**R$ 13.439,09**									
2.3.1	240410	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	CAEMA	M	200,00	R$	10,84	R$ 2.168,00		140,00	140,00	R$ -	R$ 1.517,60	R$ 1.517,60	R$ 650,40	30,00%
2.3.2	240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	CAEMA	M3	10,00	R$	323,45	R$ 3.234,50		10,00	10,00	R$ -	R$ 3.234,50	R$ 3.234,50	R$ -	0,00%
2.3.3	240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEMA	M3	0,81	R$	307,38	R$ 248,98		0,81	0,81	R$ -	R$ 248,98	R$ 248,98	R$ 0,00	0,00%
2.3.4	240425	LIMPEZA COM COMPRESSOR	CAEMA	H	24,00	R$	141,72	R$ 3.401,28		24,00	24,00	R$ -	R$ 3.401,28	R$ 3.401,28	R$ -	0,00%
2.3.5	240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	CAEMA	H	24,00	R$	98,14	R$ 2.355,36		24,00	24,00	R$ -	R$ 2.355,36	R$ 2.355,36	R$ -	0,00%
2.3.6	240437	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	CAEMA	H	12,00	R$	98,14	R$ 1.177,68		12,00	12,00	R$ -	R$ 1.177,68	R$ 1.177,68	R$ -	0,00%
2.3.7	240446	DESINFECÇÃO	CAEMA	M3	8,14	R$	49,63	R$ 403,99		8,14	8,14	R$ -	R$ 403,99	R$ 403,99	R$ 0,00	0,00%
2.3.8	240452	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	CAEMA	UN	10,00	R$	44,93	R$ 449,30		10,00	10,00	R$ -	R$ 449,30	R$ 449,30	R$ -	0,00%
2.4	**ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR**							**R$ 571,92**									
2.4.1	240470	ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	CAEMA	UN	1,00	R$	571,92	R$ 571,92		1,00	1,00	R$ -	R$ 571,92	R$ 571,92	R$ -	0,00%
2.5	**TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC**							**R$ 20.685,00**									
2.5.1	00009850	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M	SINAPI	M	140,00	R$	147,75	R$ 20.685,00		124,00	124,00	R$ -	R$ 18.321,00	R$ 18.321,00	R$ 2.364,00	11,43%
2.6	**FILTRO EM PVC**							**R$ 13.282,80**									
2.6.1	S06268	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM	ORSE	M	60,00	R$	221,38	R$ 13.282,80		16,00	16,00	R$ -	R$ 3.542,08	R$ 3.542,08	R$ 9.740,72	73,33%
2.7	**CAP EM PVC ADITIVADO**							**R$ 680,98**									
2.7.1	I05117	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND EM 154MM	ORSE	UN	1,00	R$	340,49	R$ 340,49		1,00	1,00	R$ -	R$ 340,49	R$ 340,49	R$ -	0,00%
2.7.2	I05124	TAMPA DE POÇO CAP MACHO STAND EM 154MM	ORSE	UN	1,00	R$	340,49	R$ 340,49		1,00	1,00	R$ -	R$ 340,49	R$ 340,49	R$ -	0,00%
3	**ADUTORA**							**R$ 536,31**									
3.1	040102	LOCAÇÃO DE ADUTORA	CAEMA	M	15,00	R$	1,59	R$ 23,85			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23,85	100,00%
3.2	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	ORSE	M3	1,80	R$	85,84	R$ 154,51			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 154,51	100,00%
3.3	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	1,75	R$	49,06	R$ 85,86			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85,86	100,00%
3.4	505206	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 5KM./ ESPALHAMENTO)	CAEMA	M3	0,04	R$	22,34	R$ 0,89			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,89	100,00%
3.5	S06465	TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA	ORSE	M	15,00	R$	0,49	R$ 7,35			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,35	100,00%
3.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15,00	R$	17,59	R$ 263,85			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 263,85	100,00%
4	**RESERVAÇÃO**							**R$ 26.029,01**									
4.1	RESERV 15.000L	TORRE ELEVADA PRÉ-MOLDADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 15.000L, INCLUSIVE CAIXA DÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.	UND	1,00	R$	26.029,01	R$ 26.029,01			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.029,01	100,00%
5	**INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS**							**R$ 16.673,55**									
5.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$	121,40	R$ 121,40			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 121,40	100,00%
5.2	010198	ESTRUTURA N1/N3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AÉREO PROVISÓRIO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNEC. DO POSTE E ACESS., SEM O CABO DA LINHA DE	CAEMA	UN	1,00	R$	3.232,24	R$ 3.232,24			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.232,24	100,00%

5.3	170210	CABO DE ALUMÍNIO NU 4AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO	CAEMA	M	40,00	R$ 1,06	R$ 42,40			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42,40	100,00%
5.4	170307	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	CAEMA	UN	1,00	R$ 583,15	R$ 583,15			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 583,15	100,00%
5.5	170319	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6MM² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	CAEMA	M	50,00	R$ 12,56	R$ 628,00			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 628,00	100,00%
5.6	COMP-29121365	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL , MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV	COMP.	UND	1,00	R$ 3.433,78	R$ 3.433,78			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.433,78	100,00%
5.7	190164	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	CAEMA	M	140,00	R$ 40,25	R$ 5.635,00			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.635,00	100,00%
5.8	190180	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	CAEMA	UN	1,00	R$ 2.997,58	R$ 2.997,58			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.997,58	100,00%
6	**ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO**						**R$ 7.111,18**								
6.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2,25	R$ 7,14	R$ 16,07			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,07	100,00%
6.2	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	ORSE	M3	0,72	R$ 85,84	R$ 61,80			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61,80	100,00%
6.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,44	R$ 31,38	R$ 45,19			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,19	100,00%
6.4	090304	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	CAEMA	M3	1,26	R$ 341,93	R$ 430,83			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 430,83	100,00%
6.5	S06457	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	ORSE	M3	0,18	R$ 2.408,24	R$ 433,48			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 433,48	100,00%
6.6	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	13,23	R$ 120,29	R$ 1.591,44			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.591,44	100,00%
6.7	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,00	R$ 30,28	R$ 30,28			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,28	100,00%
6.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	4,00	R$ 193,47	R$ 773,88			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 773,88	100,00%

6.9	S87893S	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	ORSE	M2	26,46	R$ 7,12	R$ 188,40			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 188,40	100,00%
6.10	150402	CHAPISCO EM TETOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	CAEMA	M2	4,00	R$ 8,55	R$ 34,20			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34,20	100,00%
6.11	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	26,46	R$ 43,86	R$ 1.160,54			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.160,54	100,00%
6.12	150411	REBOCO PARA TETOS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8	CAEMA	M2	4,00	R$ 27,11	R$ 108,44			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 108,44	100,00%
6.13	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	26,46	R$ 15,81	R$ 418,33			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 418,33	100,00%
6.14	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,44	R$ 42,44	R$ 61,11			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61,11	100,00%
6.15	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,44	R$ 54,77	R$ 78,87			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,87	100,00%
6.16	150140	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO	CAEMA	M2	0,25	R$ 119,42	R$ 29,86			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29,86	100,00%
6.17	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	4,00	R$ 81,78	R$ 327,12			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 327,12	100,00%
6.18	S00641	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	ORSE	UN	1,00	R$ 247,15	R$ 247,15			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 247,15	100,00%
6.19	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	R$ 230,53	R$ 230,53			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,53	100,00%
6.20	S103782S	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	ORSE	UN	1,00	R$ 25,67	R$ 25,67			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,67	100,00%
6.21	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,68	R$ 486,90	R$ 817,99			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 817,99	100,00%
7	**1,63**						**R$ 2.136,68**								
7.1	C2875	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	SEINFRA	M	30,00	R$ 1,63	R$ 48,90			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,90	100,00%
7.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	7,20	R$ 85,84	R$ 618,05			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618,05	100,00%
7.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,76	R$ 31,38	R$ 180,75			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,75	100,00%
7.4	505206	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 5KM./ ESPALHAMENTO)	CAEMA	M3	0,72	R$ 22,34	R$ 16,08			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,08	100,00%

7.5	00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	15,00	R$ 39,66	R$ 594,90			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 594,90	100,00%
7.6	120307	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 75 MM	CAEMA	M	15,00	R$ 2,44	R$ 36,60			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36,60	100,00%
7.7	00036084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	30,00	R$ 19,10	R$ 573,00			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 573,00	100,00%
7.8	120301	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 50 MM	CAEMA	M	30,00	R$ 2,28	R$ 68,40			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 68,40	100,00%
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 244,00**								
8.1	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M2	100,00	R$ 2,44	R$ 244,00			0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 244,00	100,00%
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 186.363,05**				R$ -	R$ 94.710,32	R$ 94.710,32	R$ 91.652,73	
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 53.243,92**				R$ -	R$ 27.058,74	R$ 27.058,74	R$ 26.185,18	
						VALOR TOTAL:	**R$ 239.606,97**				R$ -	R$ 121.769,05	R$ 121.769,05	R$ 117.837,92	

São Luís, 21 de AGOSTO de 2026.

VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313

Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313
Dados: 2026.08.25 16:25:44 -03'00'

VINICIUS ALMEIDA VERAS
ENG CIVIL
CPF 042.309.533-13

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA - ZONA RURAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 00.513.233/0001-98

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2026
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 151/2026 **PROC. ADM**: Nº 0200/2026 **DATA:** 02/06/2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 06/04/2026 a 21/08/2026

MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO
DATA DA MEDIÇÃO: 21/08/2026

LOCALIDADE: UNIDADE INTEGRADA LEIDE PONTES - POVOADO VILA NOVA

PREFEITURA DE CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT.EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**															
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00%		1,00	100,00%		1,00	100,00%		750,00	750,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	9.617,04	28.851,12	0,00	0,00%		2,00	66,59%		2,00	66,59%		19.210,75	19.210,75
1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	100,00	4,73	473,00	0,00	0,00%		100,00	100,00%		100,00	100,00%		473,00	473,00
	SUB TOTAL				**30.074,12**										**20.433,75**	**20.433,75**
	TOTAL DO ITEM				**30.074,12**										**20.433,75**	**20.433,75**
2.0	**CAPTAÇÃO**															
2.1	**CANTEIRO DE POÇOS**															
2.1	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	35,00	20,00	700,00	0,00	0,00%		35,00	100,00%		35,00	100,00%		700,00	700,00
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00	309,29	309,29	0,00	0,00%		1,00	100,00%		1,00	100,00%		309,29	309,29
2.3	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	M3	9,24	97,74	903,12	0,00	0,00%		9,24	100,00%		9,24	100,00%		903,12	903,12
2.4	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	25,00	208,54	5.213,50	0,00	0,00%		25,00	100,00%		25,00	100,00%		5.213,50	5.213,50
	SUB TOTAL				**7.125,91**										**7.125,91**	**7.125,91**
	TOTAL DO ITEM				**7.125,91**										**7.125,91**	**7.125,91**
2.2	**PERFURAÇÃO**															
2.2.1	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50,00	78,30	3.915,00	0,00	0,00%		50,00	100,00%		50,00	100,00%		3.915,00	3.915,00
2.2.2	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00	82,23	4.111,50	0,00	0,00%		50,00	100,00%		50,00	100,00%		4.111,50	4.111,50
2.2.3	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50,00	90,44	4.522,00	0,00	0,00%		40,00	80,00%		40,00	80,00%		3.617,60	3.617,60
2.2.3	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50,00	104,01	5.200,50	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00
2.2.4	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 0 A 50 M)	M	50,00	133,20	6.660,00	0,00	0,00%		50,00	100,00%		50,00	100,00%		6.660,00	6.660,00
2.2.5	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 50 A 100M)	M	50,00	136,67	6.833,50				50,00	100,00%		50,00	100,00%		6.833,50	6.833,50
2.2.6	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 100 A 150M)	M	50,00	152,71	7.635,50				40,00	80,00%		40,00	80,00%		6.108,40	6.108,40
2.2.6	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 100 A 150M)	M	50,00	177,89	8.894,50				0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00
	SUB TOTAL				**47.772,50**										**31.246,00**	**31.246,00**
	TOTAL DO ITEM				**47.772,50**										**31.246,00**	**31.246,00**
2.3	**COMPLEMENTAÇÃO**															
2.3.1	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	200,00	10,84	2.168,00	0,00	0,00%		140,00	70,00%		140,00	70,00%		1.517,60	1.517,60
2.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	10,00	323,45	3.234,50	0,00	0,00%		10,00	100,00%		10,00	100,00%		3.234,50	3.234,50
2.3.3	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81	307,38	248,98	0,00	0,00%		0,81	100,00%		0,81	100,00%		248,98	248,98
2.3.4	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00	141,72	3.401,28	0,00	0,00%		24,00	100,00%		24,00	100,00%		3.401,28	3.401,28
2.3.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00	98,14	2.355,36				24,00	100,00%		24,00	100,00%		2.355,36	2.355,36
2.3.6	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	12,00	98,14	1.177,68				12,00	100,00%		12,00	100,00%		1.177,68	1.177,68
2.3.7	DESINFECÇÃO	M3	8,14	49,63	403,99				8,14	100,00%		8,14	100,00%		403,99	403,99
2.3.8	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	10,00	44,93	449,30				10,00	100,00%		10,00	100,00%		449,30	449,30
	SUB TOTAL				**13.439,09**										**12.788,69**	**12.788,69**
	TOTAL DO ITEM				**13.439,09**										**12.788,69**	**12.788,69**
2.4	**ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR**															
2.4.1	ANÁLISE FÍSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UM	1,00	571,92	571,92	0,00	0,00%		1,00	100,00%		1,00	100,00%		571,92	571,92
	SUB TOTAL				**571,92**										**571,92**	**571,92**
	TOTAL DO ITEM				**571,92**										**571,92**	**571,92**
2.5	**TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC**															
2.5.1	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	140,00	147,75	20.685,00	0,00	0,00%		124,00	88,57%		124,00	88,57%		18.321,00	18.321,00
	SUB TOTAL				**20.685,00**										**18.321,00**	**18.321,00**
	TOTAL DO ITEM				**20.685,00**										**18.321,00**	**18.321,00**
2.6	**FILTRO EM PVC**															
2.6.1	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	M	60,00	221,38	13.282,80	0,00	0,00%		16,00	26,67%		16,00	26,67%		3.542,08	3.542,08
	SUB TOTAL				**13.282,80**										**3.542,08**	**3.542,08**
	TOTAL DO ITEM				**13.282,80**										**3.542,08**	**3.542,08**
2.7	**CAP EM PVC ADTIVADO**															
2.7.1	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND EM 154MM	UND	1,00	340,49	340,49	0,00	0,00%		1,00	100,00%		1,00	100,00%		340,49	340,49
2.7.2	TAMPA DE POÇO CAP MACHO STAND EM 154MM	UND	1,00	340,49	340,49	0,00	0,00%		1,00	100,00%		1,00	100,00%		340,49	340,49
	SUB TOTAL				**680,98**										**680,98**	**680,98**
	TOTAL DO ITEM				**680,98**										**680,98**	**680,98**

3.0	**ADUTORA**													
3.1	LOCAÇÃO DE ADUTORA	M	15,00	1,59	23,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,80	85,84	154,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
3.3	REATERRO APILOADO	M3	1,75	49,06	85,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
3.4	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 5KM./ ESPALHAMENTO)	M3	0,04	22,34	0,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
3.5	TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA	M	15,00	0,49	7,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
3.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	15,00	17,59	263,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	SUB TOTAL				**536,31**							**0,00**	**0,00**	
	TOTAL DO ITEM				**536,31**							**0,00**	**0,00**	
4.0	**RESERVAÇÃO**													
3.1	TORRE ELEVADA PRÉ-MOLDADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 15.000L, INCLUSIVE CAIXA DÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	26.029,01	26.029,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	SUB TOTAL				**26.029,01**							**0,00**	**0,00**	
	TOTAL DO ITEM				**26.029,01**							**0,00**	**0,00**	
5.0	**INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS**													
5.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	121,40	121,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.2	ESTRUTURA N1/N3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AÉREO PROVISÓRIO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNEC. DO POSTE E ACESS., SEM O CABO DA LINHA DE	UN	1,00	3.232,24	3.232,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.3	CABO DE ALUMÍNIO NU 4AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	40,00	1,06	42,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.4	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	UN	1,00	583,15	583,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.5	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6MM² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	50,00	12,56	628,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL , MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV	UND	1,00	3.433,78	3.433,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	M	140,00	40,25	5.635,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	UN	1,00	2.997,58	2.997,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	SUB TOTAL				**16.673,55**							**0,00**	**0,00**	
	TOTAL DO ITEM				**16.673,55**							**0,00**	**0,00**	
6.0	**ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO**													
6.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2,25	7,14	16,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,72	85,84	61,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.3	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1,44	31,38	45,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.4	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	M3	1,26	341,93	430,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.5	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,18	2.408,24	433,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	13,23	120,29	1.591,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.7	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	1,00	30,28	30,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	4,00	193,47	773,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	26,46	7,12	188,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.10	CHAPISCO EM TETOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	4,00	8,55	34,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.11	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	26,46	43,86	1.160,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.12	REBOCO PARA TETOS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8	M2	4,00	27,11	108,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	26,46	15,81	418,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.14	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	1,44	42,44	61,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.15	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	1,44	54,77	78,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.16	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M2	0,25	119,42	29,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	4,00	81,78	327,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.18	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	UN	1,00	247,15	247,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.19	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	1,00	230,53	230,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	1,00	25,67	25,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
6.21	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,68	486,90	817,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	SUB TOTAL				**7.111,18**							**0,00**	**0,00**	
	TOTAL DO ITEM				**7.111,18**							**0,00**	**0,00**	
7.0	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**													
7.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	M	30,00	1,63	48,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,20	85,84	618,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,76	31,38	180,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.4	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 5KM./ ESPALHAMENTO)	M3	0,72	22,34	16,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.5	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	15,00	39,66	594,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 75 MM	M	15,00	2,44	36,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.7	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	30,00	19,10	573,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
7.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, PB JE- ÁGUA - DN 50 MM	M	30,00	2,28	68,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	SUB TOTAL				**2.136,68**							**0,00**	**0,00**	
	TOTAL DO ITEM				**2.136,68**							**0,00**	**0,00**	

8.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**														
8.1	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	2,44	244,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00
	SUB TOTAL				**244,00**									**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO ITEM				**244,00**									**0,00**	**0,00**
VALOR TOTAL					**186.363,05**									**94.710,32**	**94.710,32**
VALOR DO BDI (28,56%)					**53.243,92**									**27.058,73**	**27.058,73**
VALOR TOTAL COM BDI					**239.606,97**				**50,82**			**50,82**		**121.769,05**	**121.769,05**

VALOR TOTAL DO CONTRATO : R$ 239.606,97 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R$ 121.769,05 (CENTO E VINTE E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 50,82% DE EXECUÇÃO

SALDO DA PROPOSTA (R$): 117.837,92

Edvaldo Paz Nunes
CREA NAC 110.313.774-8
Engenheiro Civil

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 151/2026
Medição: PRIMEIRA

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO



PERFURAÇÃO DE POÇO POVOADO VILA NOVA


VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313

Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313 Dados: 2026.08.25 16:25:44 -03'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 151/2026
Medição: PRIMEIRA

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO

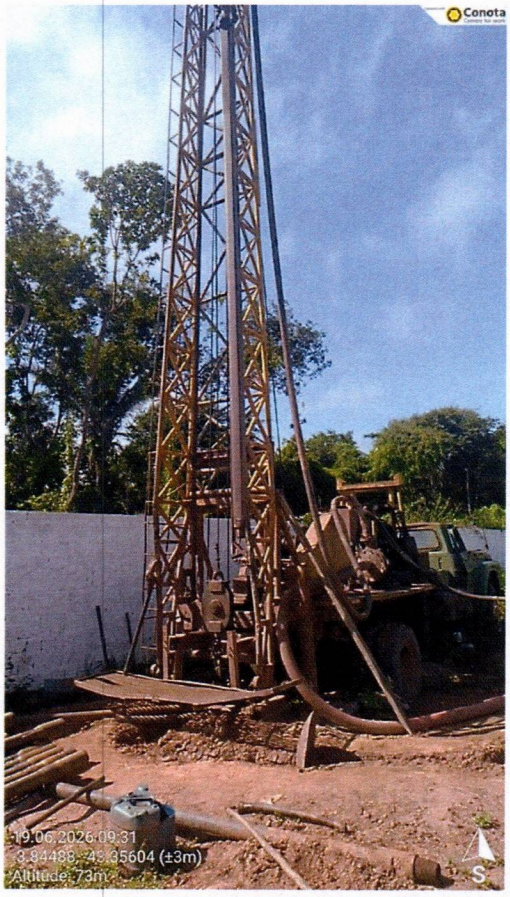

PERFURAÇÃO DE POÇO POVOADO VILA NOVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 151/2026
Medição: PRIMEIRA

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO



PERFURAÇÃO DE POÇO POVOADO VILA NOVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 151/2026
Medição: PRIMEIRA

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO




PERFURAÇÃO DE POÇO POVOADO VILA NOVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 151/2026
Medição: PRIMEIRA

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO

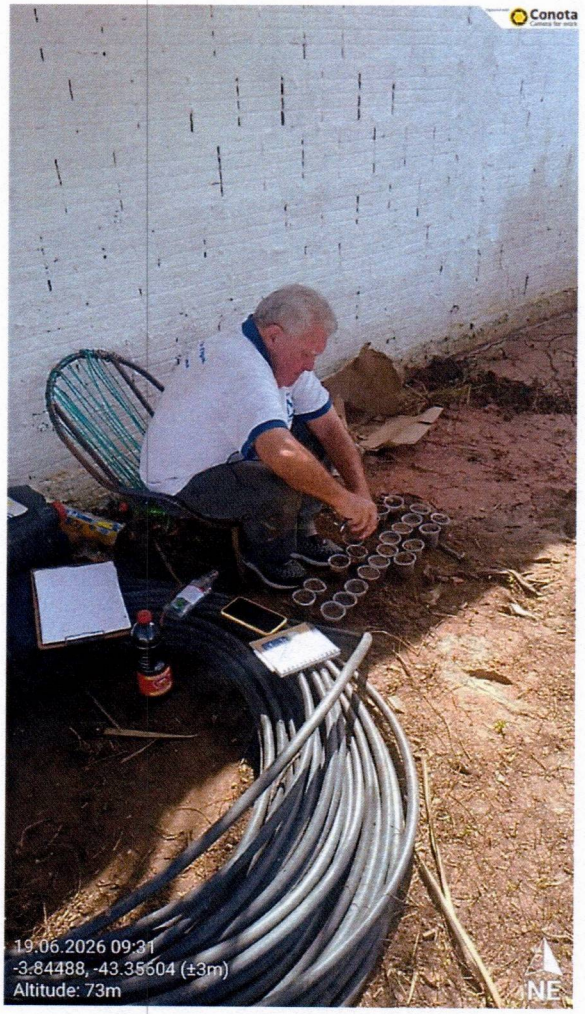

PERFURAÇÃO DE POÇO POVOADO VILA NOVA

VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313
Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA VERAS:04230953313
Dados: 2026.08.25 16:25:44 -03'00'

A Sra.
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF:. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA,** estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA**, **CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98, ,** através da sua sócio proprietário **THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15,** RG **888297980, vem solicitar através deste solicitar da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO o valor de R$ 121.769,05** (CENTO E VINTE E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS.) referente a **execução dos serviços de construção de sistema simplificado de abastecimento de agua em escolas da zona rural do município de chapadinha (POVOADO VILA NOVA).**

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 4223-0
Conta Corrente: 50.835-7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL

São Luís, MA - 21 de AGOSTO de 2026

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315

Assinado de forma digital por THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.08.25 16:05:07 -03'00'

THOMPSOM BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992
Email: biapdiniz@gmail.com

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000098**
Data e Hora da Emissão	**21/08/2026 15:22:02**
Competência da NFS-e	**08/2026**
Código de Verificação	ACD0.83DB.5186.D69C.61AC.0382.D46E.AF6F

CERTIFICADO 1020260092114579

Chave de Acesso da NFS-e
21113001200513233000198000000000009826086876718974

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98** Inscrição Municipal: **550000**
Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE, 3 - BAIRRO RENASCENCA - CEP:**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **direcao@idealconstrutorama.** Telefone: **(98) 88373415**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA**
CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV SENADOR VITORINO FREIRE, 1042 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**
Município: **CHAPADINHA** UF: **MA** Email: **atendimento@vrcontabilidade.** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA, POVOADO VILA NOVA UNIDADE INTEGRADA LEIDE PONTES. CONTRATO 151/2026. VALOR R$ 121.799,05

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	73.049,43	73.049,43
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	48.719,62	48.719,62

PIS (0,00%):	COFINS (0,00%):	INSS (0,0000%):	IR (1,2000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.461,23**

CSLL (0,0000%):	IBS MUNICIPAL (0,00%):	IBS ESTADUAL (0,05%):	CBS (0,45%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 57,84**	**R$ 520,56**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 121.769,05

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 121.769,05**	**5,00%**	**R$ 6.088,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA
Recolhimento: RETIDO
Atividade: 422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
NBS: 101034100 - Serviços de perfuração de poços de água
Serviço: 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
Mês de

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM ___/___/___

Edvaldo Paz Nunes
CREA NAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98

Razão social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificação Número: 2026090504310036292093

Informação obtida em 10/09/2026 16:25:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão nº: 70529481/2026
Expedição: 18/08/2026, às 16:56:34
Validade: 14/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:05:53 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.
Código de controle da certidão: **5085.643C.6C55.40FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 087146/26 **Data da** 31/08/2026 08:43:03

Inscrição 127598723 **CPF/CNPJ** 00513233000198

Razão IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415 **Município** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 04/09/2026 11:06:28

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 216646/26 **Data da** 31/08/2026 08:42:45

Inscrição 127598723 **CPF/CNPJ** 00513233000198

Razão IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415 **Município** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 04/09/2026 11:05:22

CERTIFICADO
102026009219872

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014117912026

Validade: **02/01/2027**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 00.513.233/0001-98	**Inscrição Municipal:** 550000	
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE		
Número: 3	**Complemento:**	
Bairro: RENASCENCA		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de julho de 2026 as 14:00**, sob o código de autenticidade nº **CED6485EB1F6AABC0C0D9D0D2D636986**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20261107171

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20261065424

1. Responsável Técnico

VINICIUS ALMEIDA VERAS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1115026305**
Registro: **1115026305MA**

Empresa contratada: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Registro : **0005467241-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Nº: **0**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato: **1512026**

Celebrado em: **06/04/2026**

Valor: **R$ 720.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

COMUNIDADE POVOADO VEREDÃO, PORÇÕES E VILA NOVA

Nº: **00**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Data de Início: **20/04/2026**

Previsão de término: **30/12/2026**

Coordenadas Geográficas: **-7.027797, -44.983003**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	3,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Emissão de Art para construção de três sistemas simplificados de abastecimento de água em escolas da zona rural do município de Chapadinha/MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
VINICIUS ALMEIDA VERAS
RNP: 1115026305
Data: 28/08/2026 13:50:59

VINICIUS ALMEIDA VERAS - CPF: *.309.533-****

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA - CNPJ: 30.887.156/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **28/08/2026**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bdwwy
Impresso em: 28/08/2026 às 13:50:59 por: , ip: 191.178.177.69
