


TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 26 de Abril de 2024, procedeu-se a abertura do processo administrativo nº 2167/2024, que tem por objeto o Aditamento de Valor do contrato nº 226/2023 - RDC ELETRÔNICO nº 024/2023 que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada nos serviços de construção Predial da Unidade Escolar de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinha.**

Chapadinha - MA, 26 de Abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Chapadinha - MA, 29 de Abril de 2024

À sua Senhoria o Senhor

Kerlly Kaio de Lima da Conceição

Proprietário da Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 39.590.842/0001-86, com sede na Rua 16, Nº 07, Qda 37- Residencial Esplanada, Chapadinha/MA.

Assunto: Consulta referente à manifestação de interesse de prorrogação do Contrato n.º 226/2023

Senhor Representante,

Tendo em vista a necessidade de alterar o quantitativo deste contrato, que se refere à Contratação de empresa para **Contratação de empresa especializada nos serviços de construção Predial da Unidade Escolar de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinha**, considerando o regular fornecimento por meio do Contrato nº 226/2023, encaminhamos o presente, em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta do Contrato, solicitando vosso pronunciamento quanto ao interesse de atender nossa solicitação.

Havendo interesse, a empresa deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da presente correspondência, e que habilite o Representante da empresa para assinatura do futuro Termo Aditivo.

Atenciosamente,


Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86 – IE: 12.669661-6
Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial
Esplanada, CEP: 65.500-000 – Chapadinda-MA

E-mail: metaconstrucoesconsultoria@gmail.com Fone: (98) 99119-0187



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

ASSUNTO: Aceite para aditivo para prorrogação de prazo do Contrato nº 226/2023-RDC Eletrônico nº 024/2023-SRP.

Prezados,

A empresa **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 39.590.842/0001-86, com sede na Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, e-mail: metaconstrucoesconsultoria@gmail.com, vem manifestar à Vossa Senhoria nosso interesse em dar continuidade ao contrato nº 226/2023 oriundo do Tomada de Preços nº 024/2023-SRP, mediante termo aditivo de prazo, em conformidade com o disposto na Cláusula Quinta do Contrato.

Chapadinda (MA), 30 de Abril de 2024.


Atenciosamente,

Kerlly Kaio de Lima da Conceição
CPF nº 053.823.563-27
Representante legal da empresa



Chapadina - MA, 02 de Maio de 2024

Ao
Setor de Contábil
Prefeitura Municipal de Chapadina - MA.



Ass.: Dotação Orçamentária


Solicito informação sobre a existência de Dotação Orçamentária para formalização de Termo Aditivo ao Contrato nº 226/2023 – RDC ELETRÔNICO 024/2023, cujo objeto é: **Contratação de empresa especializada nos serviços de construção Predial da Unidade Escolar de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadina.**

Atenciosamente,

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadina
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

DESPACHO



À
Sra. Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação


Prezada Senhora,

Em atendimento ao Art. 7º, § 2º, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas objetivando o acréscimo no total do Contrato nº 226/2023 – RDC ELETRÔNICO nº 024/2023, Contratação de empresa especializada nos serviços de construção Predial da Unidade Escolar de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinhã.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentaria:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 02.12.04 | FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA |
| 12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30% |
| 44.90.51.00 | Obras e Instalações |

Chapadinhã – MA, 03 de Maio de 2024.


Prefeitura Mun. de Chapadinhã
MASIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC: 8235



Chapadina – MA, 06 de Maio de 2024

A Comissão Permanente de Licitação - CPL
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL
Chapadina - MA



AUTORIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, e em consonância com a Solicitação de Aditivo Contratual nº 226/2023 – RDC nº 024/2023, reconhece e AUTORIZA a alteração do quantitativo, através do 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 226/2023- RDC nº 024/2024, da empresa META CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 39.590.842/0001-86, conformidade ao que estabelecem os Artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Chapadinho - MA, 07 de Maio de 2024.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL
Chapadinho - MA

Ref.: Contrato nº 226/2023 - RDC ELETRÔNICO nº 024/2023

Assunto: Solicitação de Aditivo de Alteração do Quantitativo



Prezado Senhor,

Considerando a necessária a execução dos serviços, objeto contratado, especialmente por se tratarem de serviços de fundamental importância para os trabalhos desenvolvidos da Administração Pública Municipal e do contrato está vigente;

Considerando que a manifestante por meio do seu representante legal, manifestou interesse em dar continuidade ao contrato de prestação de serviços, submetendo as cláusulas outrora firmadas no contrato original.


Considerando a continuidade dos serviços prestados pela contratada de forma constante, e respeitando todas as cláusulas contratuais produzindo os efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e possuem vasta experiência na área;

Considerando a manutenção da vantajosidade nos preços propostos e adequados ao de mercado, nos termos do Art. art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.


Considerando ainda, a previsão orçamentária para custeio da respectiva despesa;

SOLICITO a abertura de processo administrativo para a avaliação da continuidade do objeto contratado, com o ACRÉSCIMO DE VALOR pactuado por meio de aditivo.

Atenciosamente,


Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadinda – MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº 2167/2024, proveniente da solicitação de 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 226/2023 – RDC nº 024/2023 para exame e aprovação da Minuta do Termo Aditivo, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada nos serviços de construção Predial da Unidade Escolar de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinda.

Tal solicitação fundamenta-se no art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.


Solicitamos ainda, que após análise o parecer seja enviado a Autoridade Competente solicitante para providencias cabíveis.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Chapadinda - MA, 08 de Maio de 2024.

Luciano de Souza Gomes
Portaria nº 358/2021
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

Luciano Souza Gomes
Presidente da CPL

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº _____**

Processo Administrativo: _____

Apenso ao Proc. Administrativo: _____

Pelo presente instrumento particular de aditamento ao contrato de execução de serviços que fazem entre si, de um lado o Município de CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE _____, inscrito(a) no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, representado pela Secretário(a) Municipal de _____, o(a) Sr(a). _____, residente e domiciliado (a) na _____, portador(a) do CPF nº _____, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa _____, inscrita no C.N.P.J sob o n.º _____, com sede na _____ - Centro, Chapadinho - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, _____, R.G. n.º _____, C.P.F. n.º _____, ao final assinado, ajustar entre si o presente Termo Aditivo de valor e da prorrogação de prazo de vigência, de acordo com o que prescreve o artigo 65 inc I, alínea "b", combinado ao art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, decorrente do RDC nº 024/2023, oriunda do processo Administrativo nº 2167/2024, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente instrumento aditar em aproximadamente em _____% (_____) do Contrato nº _____/2023 – RDC Eletrônico nº 024/2023, para Contratação de empresa especializada nos serviços de construção Predial da Unidade Escolar de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ATUALIZADO

3.1. A alteração resultante constante desta Cláusula corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto será de aproximadamente _____ (_____) do valor inicial do contrato nº _____/2023- RDC Eletrônico nº 024/2023, que passa a ser R\$ _____ (_____). Sendo esse valor pago de acordo com a execução dos serviços demonstrados na planilha abaixo:

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 Art. art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

5.1. Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de contratação original que não tenham sido alteradas.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Chapadinhã - MA, _____ de _____ de 2024.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ(MF) XXXXXXXXXXXX

«NOME_RESP_LICITACAO»

«CARGO_RESP_LICITACAO»

CPF: XXXXXXXXXXXX


CONTRATANTE

«EMPRESA CONTRATADA»

«CPF_CNPJ CONTRATADO»

«NOME REPRESENTANTE»

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO»,
CONTRATADO(A)



Testemunhas:

1. _____
CPF nº _____

2. _____
CPF nº _____



Parecer

Processo Administrativo nº 2167/2024

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Chapadinhã.

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município

EMENTA: ACRÉSCIMO DE
13,57%, Art. 65, §1º, d da Lei nº
8.666/93.

Trata-se de parecer jurídico com a finalidade de analisar a SOLICITAÇÃO DE ADITIVO POR PERCENTUAL DE 13,57% por parte da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinhã e a licitante METAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, em decorrência do processo de licitatório – Modalidade RDC nº 024/2023 e CONTRATO 226/2023, o que passa a expor.

O processo em comento tem como objeto a prorrogação do Contrato nº 226/2023 firmado entre o Município de Chapadinhã e a empresa para Construção Predial da Unidade Escolar com 01 sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra zona rural de Chapadinhã/MA.

RELATÓRIO

A Sra. Secretária de Educação do município de Chapadinhã solicitou um aditivo de aproximadamente 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete) por cento do valor do contrato nº 226/2023.

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência do serviço ser de natureza contínuo a fim de se manter a continuidade em serviços de construção.

O pedido foi realizado pela Sra. Secretária de Educação de Chapadinhã, Sra. Nara da Silva Macedo através da solicitação.

Quanto ao acréscimo do valor, representa um aumento do objeto de percentual de aproximadamente 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete) por cento, do valor original pactuado, portanto, dentro do limite previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666 de 1993.

Este é o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica “in abstracto”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.


A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.”

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

Saliente-se, inicialmente, que a presente análise está adstrita aos aspectos jurídicos que permeiam a solicitação objeto dos autos, estando ressalvados, desde logo, quaisquer aspectos técnicos, econômicos, financeiros e/ou orçamentários não abrangidos pela alçada desta Procuradoria.

Na análise dos autos entende-se que o objetivo principal do Termo Aditivo é a prorrogação de vigência e o acréscimo de 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete), a fim de se manter a continuidade na Construção Predial da Unidade Escolar com 01 sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra zona rural de Chapadinho/MA, considerando que não há mais saldo contratual nos referidos itens para execução dos mesmos.



Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma modificação do conteúdo do contrato que se caracteriza como uma alteração unilateral de valores, isto é, valor contratual é acrescido em 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete), correspondendo assim um acréscimo no valor total do contrato.

A Lei n.º 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso I, b, c/c seu § 1º, prevê a possibilidade de a Administração Pública realizar, em seus contratos, desde que justificado' por fatores supervenientes à contratação, acréscimos quantitativos no objeto original, observados os percentuais máximos ali previstos. Com efeito, preceitua o art. 65, I, *alínea b* da Lei Federal, in verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

"§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (...)"

A Lei 8666/93 em seu artigo 57, dispõe:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em consonância com a Lei das Licitações prevê a possibilidade solicitada.

Observasse que a clausula Sexta do contrato menciona sobre a possibilidade do aditivo, vejamos:

No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

No caso em tela, verifica-se que o presente aditivo compreende 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete) por cento, do valor original pactuado, portanto, dentro do limite previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666 de 1993.


Constata-se que a pretensão da Administração é tempestiva, vez que o aludido contrato se encontra em vigor, tendo em vista que o seu vencimento ocorrerá próximo.

CONCLUSÃO

Sendo assim, opino pela possibilidade jurídica de realização do aditivo requerido, referente ao contrato nº 226/2023, caso tenha disponibilidade financeira para a realização do mesmo, vez que, a situação concreta está devidamente justificada, nos termos do art. 65, I, b e § 1º da Lei 8.666 de 1993.

É nosso parecer salvo melhor entendimento.


Chapadinha 09 de maio de 2024.



Samara Nisley Furtado Lima.

Assessoria Jurídica Municipal de Chapadinha.

Samara Nisley Furtado Lima
Assessoria Jurídica
OAB 27329/MA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:17:20 do dia 24/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2024.

Código de controle da certidão: **D6D6.0B3A.224E.92FD**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Nº Certidão: 120707/24

Data da

02/04/2024 16:55:11

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:


<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA



Nº Certidão: 006921/24

Data da

25/01/2024 11:36:29

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/01/2024 11:36:29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.590.842/0001-86
Certidão nº: 12186737/2024
Expedição: 22/02/2024, às 17:18:47
Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.590.842/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000




22/02/2024 16:59:50
USUÁRIO:JOAO


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 265/2024
AUTENTICAÇÃO:YpDe4CG0nlwLQKyElwcB21mvPDZQt5I

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **39.590.842/0001-86**, situada neste Cidade, **RUA 16, 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **22/05/2024**.


CHAPADINHA-MA, 22/02/2024.

Prefeitura Municipal de Chapadinda
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal





PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



22/02/2024 16:59:13
USUÁRIO:JOAO


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 264/2024
AUTENTICAÇÃO:U4sUqemHMxYwfvGPIYCFgqzQEPXVAqFe

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº 39.590.842/0001-86, situada nesta Cidade **RUA 16, 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **22/05/2024**.


CHAPADINHA-MA, 22/02/2024.

Prefeitura Municipal de Chapadonha
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal



Ofício nº 011/2024


Chapadinha – MA, 29 de abril de 2024

Excelentíssimo Senhor,
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha - MA



Solicitação de Aditivo de Valor

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador Kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, detentora do contrato de Nº 226/2023, RDC-024/2023, processo administrativo 3843/2023, que tem como objeto a **Construção de 01 (uma) unidade escolar de 01 sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural do município de Chapadinha-MA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar Aditivo de Valor referente a mudança no projeto para melhor adequação da edificação ao ser devido fim a pedido da administração pública municipal, o serviços acrescentados correspondem a um acréscimo de valor de R\$ 23.228,68 (vinte e três mil e duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), que corresponde a 13,57% (treze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), de acordo com planilha anexa dos serviços realizados.


KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO 1º TERMO DE ADITIVO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC eletrônico Nº: 024/2023
Nº DO CONTRATO: 226/2023

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA -
CNPJ: 39.590.842/0001-86
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

DATA: 29/04/2024

01º TERMO DE ADITIVO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO | | ACRESCIMTO | | ADITIVO + SUPRESSÃO | | CONTRATO + ADITIVO | |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------|---------|--------------------|--------------|
| | | | | | | UNITARIO R\$ | TOTAL R\$ | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | SUPRESSÃO | ADITIVO | SUPRESSÃO | ADITIVO |
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 240101 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | CAEMA | KM | 90,00 | R\$ 17,17 | R\$ 1.545,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | R\$ - | R\$ 1.545,30 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | S11397 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | ORSE | un | 1,00 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ 750,00 |
| 2.2 | C3528 | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 73,08 | R\$ 3,33 | R\$ 243,36 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | R\$ 24,71 | R\$ 24,71 |
| 2.3 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SINAPI | M2 | 6,00 | R\$ 939,76 | R\$ 5.638,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ - | R\$ 5.638,56 |
| 3 | | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | S02497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m | ORSE | m3 | 8,46 | R\$ 44,19 | R\$ 373,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | R\$ - | R\$ 373,85 |
| 3.2 | 93558 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 10,29 | R\$ 65,86 | R\$ 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | R\$ - | R\$ 677,70 |
| 3.3 | C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | SEINFRA | M2 | 16,92 | R\$ 18,67 | R\$ 315,90 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | R\$ 149,73 | R\$ 149,73 |
| 3.4 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 72,51 | R\$ 64,79 | R\$ 4.697,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,51 | R\$ - | R\$ 4.697,92 |
| 4 | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | ALICERCE | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | C3529 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 8,46 | R\$ 214,47 | R\$ 1.814,42 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | R\$ 178,01 | R\$ 178,01 |
| 4.2 | | SAPATAS ISOLADAS | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 6,86 | R\$ 27,02 | R\$ 185,36 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | R\$ 39,45 | R\$ 39,45 |
| 4.2.2 | S11657 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | ORSE | m2 | 7,84 | R\$ 45,90 | R\$ 359,86 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | R\$ 22,03 | R\$ 22,03 |
| 4.2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 74,04 | R\$ 12,98 | R\$ 961,04 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | R\$ 288,29 | R\$ 288,29 |
| 4.2.4 | S949645 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | ORSE | m3 | 1,98 | R\$ 492,31 | R\$ 974,77 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | R\$ 206,77 | R\$ 206,77 |
| 4.3 | | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | S11652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | ORSE | m2 | 11,31 | R\$ 48,81 | R\$ 552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | R\$ - | R\$ 552,04 |
| 4.3.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 90,06 | R\$ 14,49 | R\$ 1.304,97 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | R\$ 137,37 | R\$ 137,37 |
| 4.3.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 36,96 | R\$ 16,28 | R\$ 601,71 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 38,81 | R\$ 30,12 | R\$ 30,12 |
| 4.3.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 436,85 | R\$ 738,28 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | R\$ 74,26 | R\$ 74,26 |
| 4.3.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 226,27 | R\$ 382,40 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | R\$ 38,47 | R\$ 38,47 |
| 4.3.6 | S04953 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | ORSE | m2 | 31,02 | R\$ 25,84 | R\$ 801,56 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 34,07 | R\$ 78,81 | R\$ 78,81 |
| 5 | | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | PILARES | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | S07463 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 15,85 | R\$ 45,16 | R\$ 714,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | R\$ - | R\$ 714,60 |

Fis 00569
 Proc. Nº 024/2023
 Ass. [Assinatura]

Cláudia Maria de Brito
 Engenheira Civil
 CREA-114670/70

CPF: 031.027.567-27
 [Assinatura]



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC eletrônico Nº: 024/2023
Nº DO CONTRATO: 226/2023

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO 1º ADITIVO

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA -
CNPJ: 39.590.402/0001-86

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

DATA: 29/04/2024

01º TERMO DE ADITIVO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | CONTRATADO | | | | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | | CONTRATO + ADITIVO | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ACRESCIMTO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | A-RESSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
| 5.1.2 | 92762 | ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 155,48 | R\$ 11,61 | R\$ 1.805,12 | 0,00 | 0,00 | 155,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.805,12 |
| 5.1.3 | 92759 | ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 35,11 | R\$ 13,58 | R\$ 476,79 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 476,79 |
| 5.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 2,15 | R\$ 436,85 | R\$ 939,23 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 939,23 |
| 5.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 2,15 | R\$ 226,27 | R\$ 486,48 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 486,48 |
| 5.2 | | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR | | | | R\$ 3.320,03 | | | | R\$ 252,91 | R\$ - | R\$ 252,91 | R\$ 3.572,94 | |
| 5.2.1 | 511652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA.07.2015 | ORSE | m2 | 11,31 | R\$ 48,81 | R\$ 552,04 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 552,04 |
| 5.2.2 | 92762 | ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 90,06 | R\$ 11,61 | R\$ 1.045,60 | 9,48 | 0,00 | 99,54 | R\$ 110,06 | R\$ - | R\$ 110,06 | R\$ 1.155,66 |
| 5.2.3 | 96543 | ARMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 36,96 | R\$ 16,28 | R\$ 601,71 | 1,85 | 0,00 | 38,81 | R\$ 30,12 | R\$ - | R\$ 30,12 | R\$ 631,83 |
| 5.2.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 436,85 | R\$ 738,28 | 0,17 | 0,00 | 1,86 | R\$ 74,26 | R\$ - | R\$ 74,26 | R\$ 812,54 |
| 5.2.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 226,27 | R\$ 382,40 | 0,17 | 0,00 | 1,86 | R\$ 38,47 | R\$ - | R\$ 38,47 | R\$ 420,86 |
| 6 | | ALVENARIA E VEDAÇÕES | | | | R\$ 19.057,93 | | | | R\$ 1.595,71 | R\$ - | R\$ 1.595,71 | R\$ 20.653,64 | |
| 6.1 | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XJAX19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 178,43 | R\$ 100,77 | R\$ 17.980,39 | 11,57 | 0,00 | 190,00 | R\$ 1.165,91 | R\$ - | R\$ 1.165,91 | R\$ 19.146,30 |
| 6.2 | 95193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 7,56 | R\$ 48,73 | R\$ 368,40 | 8,82 | 0,00 | 16,38 | R\$ 429,80 | R\$ - | R\$ 429,80 | R\$ 798,20 |
| 6.3 | 95197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 7,28 | R\$ 97,41 | R\$ 709,14 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 709,14 |
| 7 | | COBERTURA | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | EDIFICAÇÃO | | | | R\$ 15.893,47 | | | | R\$ 1.081,98 | R\$ - | R\$ 1.081,98 | R\$ 16.915,45 | |
| 7.1.1 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 95,57 | R\$ 82,62 | R\$ 7.895,99 | 8,06 | 0,00 | 103,63 | R\$ 665,92 | R\$ - | R\$ 665,92 | R\$ 8.561,91 |
| 7.1.2 | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 2.793,83 | R\$ 2.793,83 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.793,83 |
| 7.1.3 | 503964 | IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR | ORSE | M2 | 95,57 | R\$ 12,32 | R\$ 1.177,42 | 8,06 | 0,00 | 103,63 | R\$ 99,30 | R\$ - | R\$ 99,30 | R\$ 1.276,72 |
| 7.1.4 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 95,57 | R\$ 39,30 | R\$ 3.755,90 | 8,06 | 0,00 | 103,63 | R\$ 316,76 | R\$ - | R\$ 316,76 | R\$ 4.072,66 |
| 7.1.5 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 24,40 | R\$ 8,62 | R\$ 210,33 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 210,33 |
| 8 | | REVESTIMENTO | | | | R\$ 13.470,45 | | | | R\$ 6.103,77 | R\$ - | R\$ 6.103,77 | R\$ 19.574,23 | |
| 8.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 324,42 | R\$ 6,31 | R\$ 2.047,09 | 0,00 | 0,00 | 324,42 | R\$ 345,66 | R\$ - | R\$ 345,66 | R\$ 2.392,75 |

Fls. 0570
Proc. Nº 224/2023
Ass. [Assinatura]

CPF: 053.123.543-27
[Assinatura]

CPF: 053.123.543-27
[Assinatura]



PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 RDC eletrônico Nº: 024/2023
 Nº DO CONTRATO: 226/2023

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO 1º TERMO DE ADITIVO
 EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA -
 CNPJ: 39.590.842/0001-86

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA
 DATA: 29/04/2024

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID | FONTE | PREÇO | | ACRÉSCIMOS | ADITIVO + SUPRESSÃO | | CONSOLETADO | ADITIVO | | CONSOLETADO |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|--------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | | | | UNITARIO R\$ | TOTAL R\$ | | SUPRESSÃO | A. RÉSSIMO | | SUPRESSÃO | ADITIVO | |
| 8.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 228,30 | M2 | SINAPI | R\$ 34,98 | R\$ 7.985,93 | 104,37 | 0,00 | 332,67 | R\$ 3.650,86 | R\$ - | R\$ 3.650,86 | R\$ 11.636,80 |
| 8.3 | 87532 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 27,81 | M2 | SINAPI | R\$ 33,95 | R\$ 944,15 | 18,72 | 0,00 | 46,53 | R\$ 635,54 | R\$ - | R\$ 635,54 | R\$ 1.579,69 |
| 8.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 27,81 | M2 | SINAPI | R\$ 75,14 | R\$ 2.089,64 | 18,72 | 0,00 | 46,53 | R\$ 1.406,62 | R\$ - | R\$ 1.406,62 | R\$ 3.496,26 |
| 8.5 | 88649 | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM. AF_02/2023 | 44,65 | M | SINAPI | R\$ 9,04 | R\$ 403,64 | 7,20 | 0,00 | 51,85 | R\$ 65,09 | R\$ - | R\$ 65,09 | R\$ 468,72 |
| 9 | | PAIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 7.792,30 | | | | | | R\$ 872,78 | R\$ 8.665,07 |
| 9.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM CONTRAPISO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | 65,20 | M2 | SINAPI | R\$ 27,02 | R\$ 1.761,70 | 7,36 | 0,00 | 72,56 | R\$ 198,87 | R\$ - | R\$ 198,87 | R\$ 1.960,57 |
| 9.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 65,20 | M2 | SINAPI | R\$ 65,33 | R\$ 4.259,52 | 7,36 | 0,00 | 72,56 | R\$ 480,83 | R\$ - | R\$ 480,83 | R\$ 4.740,34 |
| 9.3 | 5949915 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 8CM | 2,04 | m3 | ORSE | R\$ 660,18 | R\$ 1.346,77 | 0,20 | 0,00 | 2,24 | R\$ 132,04 | R\$ - | R\$ 132,04 | R\$ 1.478,80 |
| 9.4 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L=15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS | 5,70 | M | SEINFRA | R\$ 74,44 | R\$ 424,31 | 0,82 | 0,00 | 6,52 | R\$ 61,04 | R\$ - | R\$ 61,04 | R\$ 485,35 |
| 10 | | FORRO | | | | | R\$ 4.251,04 | | | | | | R\$ 393,16 | R\$ 4.644,20 |
| 10.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | 65,20 | M2 | SINAPI | R\$ 65,20 | R\$ 4.251,04 | 6,03 | 0,00 | 71,23 | R\$ 393,16 | R\$ - | R\$ 393,16 | R\$ 4.644,20 |
| 11 | | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | R\$ 2.389,83 | R\$ 11.147,36 |
| 11.1 | | PORTAS | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - |
| 11.1.1 | 503540 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 3,00 | un | ORSE | R\$ 1.497,93 | R\$ 4.493,79 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.493,79 |
| 11.1.2 | 503541 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 1,00 | un | ORSE | R\$ 1.751,21 | R\$ 1.751,21 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 1.751,21 | R\$ - | R\$ 1.751,21 | R\$ 3.502,42 |
| 11.1.3 | 501756 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 1,00 | un | ORSE | R\$ 675,40 | R\$ 675,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 675,40 |
| 11.1.4 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 3,15 | M2 | SEINFRA | R\$ 380,48 | R\$ 1.198,51 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.198,51 |
| 11.1.5 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | UN | SINAPI | R\$ 319,31 | R\$ 638,62 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 638,62 | R\$ - | R\$ 638,62 | R\$ 1.277,24 |
| 11.2 | | JANELAS | | | | | R\$ 2.243,08 | | | | | | R\$ 222,67 | R\$ 2.465,75 |
| 11.2.1 | 94562 | BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0,80 | M2 | SINAPI | R\$ 504,50 | R\$ 403,64 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | R\$ 120,92 | R\$ - | R\$ 120,92 | R\$ 604,59 |
| 11.2.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3,96 | M2 | SINAPI | R\$ 368,60 | R\$ 1.459,66 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.459,66 |
| 11.2.3 | 1010410 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25cm | 5,45 | M | SBC | R\$ 55,01 | R\$ 299,75 | 1,85 | 0,00 | 7,30 | R\$ 101,75 | R\$ - | R\$ 101,75 | R\$ 401,50 |
| 11.3 | | GRADE DE PROTEÇÃO | | | | | R\$ 1.026,14 | | | | | | R\$ 274,35 | R\$ 1.300,50 |
| 11.3.1 | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS | 5,76 | M2 | SEINFRA | R\$ 230,11 | R\$ 1.326,14 | 1,54 | 0,00 | 7,30 | R\$ 274,35 | R\$ - | R\$ 274,35 | R\$ 1.300,50 |

Ass. Prof. N. S. /2023

Cláudio N. S. /2023
 Empresa: [illegible]
 C.E. [illegible]

CPF: 05.122.341-21

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | CONTRATO + ADITIVO | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|---------|-------------|-----|---|-----|----------|
| | | | | | | | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO | | | | |
| 12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | QUADROS E DISJUNTORES | | | | | R\$ 522,08 | | | | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 522,08 |
| 12.1.1 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 157,16 | R\$ 157,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 157,16 |
| 12.1.2 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEMI BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 86,88 | R\$ 86,88 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 86,88 |
| 12.1.3 | C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 114,42 | R\$ 114,42 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 114,42 |
| 12.1.4 | 18442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 119,10 | R\$ 119,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 119,10 |
| 12.1.5 | 98653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 9,99 | R\$ 9,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 9,99 |
| 12.1.6 | 98655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 11,51 | R\$ 34,53 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 34,53 |
| 12.2 | | PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO | | | | | R\$ 3.376,40 | | | | | | R\$ | 173,34 | R\$ | - | R\$ | 173,34 |
| 12.2.1 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 17,00 | R\$ 36,01 | R\$ 612,17 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | 36,01 | R\$ | - | R\$ | 36,01 |
| 12.2.2 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 105,98 | R\$ 415,92 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 415,92 |
| 12.2.3 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 137,33 | R\$ 686,65 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | 137,33 | R\$ | - | R\$ | 137,33 |
| 12.2.4 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 14,00 | R\$ 116,69 | R\$ 1.661,66 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.661,66 |
| 12.3 | | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | | | R\$ 2.587,10 | | | | | | R\$ | 659,90 | R\$ | - | R\$ | 659,90 |
| 12.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL | SINAPI | M | 171,00 | R\$ 3,85 | R\$ 658,35 | 129,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | 496,65 | R\$ | - | R\$ | 496,65 |
| 12.3.2 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 44,55 | R\$ 8,42 | R\$ 375,11 | 5,45 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | 45,89 | R\$ | - | R\$ | 45,89 |
| 12.3.3 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | M | 18,00 | R\$ 9,78 | R\$ 176,04 | 12,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | 117,36 | R\$ | - | R\$ | 117,36 |
| 12.3.4 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 30,00 | R\$ 25,86 | R\$ 775,80 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 775,80 |
| 12.3.5 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 9,00 | R\$ 9,20 | R\$ 82,80 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 82,80 |
| 12.3.6 | C0798 | CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE | SEINFRA | UN | 100,00 | R\$ 3,76 | R\$ 376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 376,00 |
| 12.3.7 | 109450 | PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA ENTRADA DE ENERGIA | ORSE | un | 1,00 | R\$ 143,00 | R\$ 143,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 143,00 |
| 12.4 | | SISTEMA DE ATERRAMENTO | | | | | R\$ 49,89 | | | | | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 49,89 |

Fls 00572
 Proc. Nº 241/2023
 Ass: [Assinatura]

Churruarino - Abriçã
 Engenheiro Civil
 CRB 11147/2010

CPE: 051.132.503-27
 [Assinatura]

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO TERMO ADITIVO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC eletrônico N°: 024/2023
N° DO CONTRATO: 226/2023

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA



01º TERMO DE ADITIVO
DATA: 29/04/2024

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO | | ACRESCIMTO | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | CONTRATO + ADITIVO | | |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|--------------|------------|---------------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| | | | | | | UNITÁRIO R\$ | TOTAL R\$ | | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | A-RÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
| 12.4.1 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 2,00 | R\$ 8,42 | R\$ 16,84 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16,84 |
| 12.4.2 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 1,50 | R\$ 14,83 | R\$ 22,25 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22,25 |
| 12.4.3 | 503766 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00MM COM CONECTOR | ORSE | un | 3,00 | R\$ 135,41 | R\$ 406,23 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 406,23 |
| 12.4.4 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 54,57 | R\$ 54,57 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 54,57 |
| 13 | | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | | | | | R\$ 1.006,45 | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.006,45 |
| 13.1 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 118,69 | R\$ 593,45 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 593,45 |
| 13.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 25,08 | R\$ 125,40 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 125,40 |
| 13.3 | 1375565 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | ORSE | un | 1,00 | R\$ 30,43 | R\$ 30,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30,43 |
| 13.4 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 253,15 | R\$ 253,15 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 253,15 |
| 13.5 | 1044112 | SUPOORTE DE PAREDE PARA EXTINGUIDOR DE INCÊNDIO | SBC | UN | 1,00 | R\$ 4,02 | R\$ 4,02 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4,02 |
| 14 | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | 052421 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE TUBOS PVC ROSCAVEIS | SBC | UN | 4,00 | R\$ 92,85 | R\$ 371,40 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 185,70 | R\$ - | R\$ 185,70 | R\$ 2.522,05 |
| 14.1.2 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 38,44 | R\$ 38,44 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 38,44 |
| 14.1.3 | 00000095 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 10,88 | R\$ 21,76 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 21,76 |
| 14.1.4 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 69,74 | R\$ 69,74 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 69,74 |
| 14.1.5 | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 26,46 | R\$ 105,84 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 105,84 |
| 14.1.6 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 37,13 | R\$ 37,13 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 37,13 |
| 14.1.7 | 00034636 | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 483,00 | R\$ 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 483,00 |
| 14.1.8 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 9,00 | R\$ 35,77 | R\$ 321,93 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 321,93 |

Clayton de Jesus Abreu
Empenho (civil)
C/C: 11111/0070

00573
Ass: [Assinatura]
Proc. Nº 024/2023
Fis: [Assinatura]

CPF: 051.132.563-27
[Assinatura]



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO 1º TERMO DE ADITIVO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC eletrônica N°: 024/2023
Nº DO CONTRATO: 226/2023

CNPJ: 39.590.842/0001-86

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA -
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

DATA: 29/04/2024

01º TERMO DE ADITIVO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO | | ACRESCIMTO | ADITIVO - SUPRESSÃO | | CONTRATO + ADITIVO | | CONSOLIDADO |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------------|--------------|------------|---------------------|---------|--------------------|------------|---------------|
| | | | | | | UNITARIO R\$ | TOTAL R\$ | | SUPRESSÃO | ADITIVO | SUPRESSÃO | ADITIVO | |
| 14.1.9 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 20,00 | R\$ 26,31 | R\$ 526,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 526,20 |
| 14.1.10 | 91788 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 6,00 | R\$ 36,77 | R\$ 220,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 220,62 |
| 14.1.11 | S01169 | TÉ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM DIÂM = 32MM | ORSE | un | 2,00 | R\$ 11,62 | R\$ 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23,24 |
| 14.1.12 | S01167 | TÉ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM DIÂM = 20MM | ORSE | un | 1,00 | R\$ 8,32 | R\$ 8,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,32 |
| 14.1.13 | S01134 | JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM DIÂM = 20MM | ORSE | un | 5,00 | R\$ 7,19 | R\$ 35,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35,95 |
| 14.1.14 | 00003540 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 4,80 | R\$ 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4,80 |
| 14.1.15 | 00001957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 6,20 | R\$ 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18,60 |
| 14.1.16 | S01079 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRROM, DIÂM = 32 X 20MM | ORSE | un | 3,00 | R\$ 11,85 | R\$ 35,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35,55 |
| 14.1.17 | S1040035 | BUCHA DE REDUÇÃO - LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | ORSE | un | 1,00 | R\$ 13,83 | R\$ 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,83 |
| 14.2 | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1 | 053171 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | SBC | UN | 4,00 | R\$ 118,00 | R\$ 472,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 329,52 | R\$ 236,00 | R\$ 10.573,09 |
| 14.2.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 45,05 | R\$ 90,10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 45,05 | R\$ - | R\$ 135,15 |
| 14.2.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 12,00 | R\$ 31,20 | R\$ 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 374,40 |
| 14.2.4 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 6,00 | R\$ 50,81 | R\$ 304,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 304,86 |
| 14.2.5 | S04883 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | ORSE | un | 2,00 | R\$ 568,41 | R\$ 1.136,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.136,82 |
| 14.2.6 | 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 413,16 | R\$ 413,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 413,16 |
| 14.2.7 | C5738 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 48,47 | R\$ 48,47 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 48,47 | R\$ - | R\$ 96,94 |
| 14.2.8 | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1.2 X 2.4 X H=1.5 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 4.147,76 | R\$ 4.147,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.147,76 |
| 14.2.9 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 3.096,26 | R\$ 3.096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.096,26 |
| 14.2.10 | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 38,10 | R\$ 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 38,10 |
| 14.2.11 | C2359 | TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)/JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 16,65 | R\$ 16,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16,65 |
| 14.2.12 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1.3/4") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 13,12 | R\$ 26,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26,24 |

Fls 10574
 Proc. Nº 024/2023
 Ass. [Assinatura]

Kelly Kay de Lima de Camargo
 CPF: 053.127.593-27
 [Assinatura]

Cláudio de Jesus Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11141/007-7
 [Assinatura]



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO 1º TERMO DE ADITIVO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA -

CNPJ: 39.590.842/0001-86

RDC eletrônico Nº: 024/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

Nº DO CONTRATO: 226/2023

DATA: 29/04/2024

01º TERMO DE ADITIVO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | CONTRATADO | | | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | CONTRATO + ADITIVO | | | | | |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|---------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| | | | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ACRÉSCIMOS | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | A - RÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
| 14.2.13 | 510318 | JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO | ORSE | un | 2,00 | R\$ 15,06 | R\$ 30,12 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 30,12 |
| 14.2.14 | 00003526 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 2,89 | R\$ 5,78 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 5,78 |
| 14.2.15 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 9,35 | R\$ 9,35 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 9,35 |
| 14.2.16 | 00038423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 33,50 | R\$ 33,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 33,50 |
| 15 | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | R\$ 3.617,16 | | | | | R\$ 2.553,72 | R\$ - | R\$ 2.553,72 | 6.170,88 |
| 15.1 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 319,31 | R\$ 319,31 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 319,31 | R\$ - | R\$ 319,31 | 638,62 |
| 15.2 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 353,99 | R\$ 353,99 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 353,99 | R\$ - | R\$ 353,99 | 707,98 |
| 15.3 | 00001747 | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 190,64 | R\$ 190,64 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 190,64 | R\$ - | R\$ 190,64 | 381,28 |
| 15.4 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 79,26 | R\$ 79,26 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 79,26 | R\$ - | R\$ 79,26 | 158,52 |
| 15.5 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 729,89 | R\$ 729,89 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 729,89 | R\$ - | R\$ 729,89 | 1.459,78 |
| 15.6 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 10,84 | R\$ 21,68 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 21,68 | R\$ - | R\$ 21,68 | 43,36 |
| 15.7 | 102016 | SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680 C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR. | ORSE | un | 1,00 | R\$ 178,60 | R\$ 178,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 178,60 |
| 15.8 | 510759 | LANÇADORA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | ORSE | m2 | 1,10 | R\$ 443,86 | R\$ 488,25 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 488,25 |
| 15.9 | C4636 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSIVA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 497,81 | R\$ 497,81 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 497,81 | R\$ - | R\$ 497,81 | 995,62 |
| 15.10 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 361,14 | R\$ 361,14 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 361,14 | R\$ - | R\$ 361,14 | 722,28 |
| 15.11 | 5869115 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/27 OU 3/47, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ORSE | un | 1,00 | R\$ 79,40 | R\$ 79,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 79,40 |
| 15.12 | 1000708 | TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL REF.2085 | SBC | UN | 1,00 | R\$ 317,19 | R\$ 317,19 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 317,19 |
| 16 | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | PINTURA INTERNA | | | | R\$ 4.749,26 | | | | | | | | |
| 16.1.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 169,92 | R\$ 2,99 | R\$ 508,06 | 10,08 | 0,00 | 180,00 | R\$ 30,14 | R\$ - | R\$ 30,14 | 538,20 |
| 16.1.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIVAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 169,92 | R\$ 13,82 | R\$ 2.348,29 | 10,08 | 0,00 | 180,00 | R\$ 139,31 | R\$ - | R\$ 139,31 | 2.487,60 |
| 16.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 169,92 | R\$ 11,14 | R\$ 1.894,31 | 10,08 | 0,00 | 180,00 | R\$ 112,29 | R\$ - | R\$ 112,29 | 2.006,60 |
| 16.2 | | PINTURA EXTERNA | | | | R\$ 3.579,98 | | | | | | | | |
| 16.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 110,26 | R\$ 32,59 | R\$ 3.591,84 | 1,84 | 0,00 | 135,10 | R\$ 74,27 | R\$ - | R\$ 74,27 | 403,95 |
| 16.2.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 110,26 | R\$ 11,14 | R\$ 1.228,30 | 2,44 | 0,00 | 135,10 | R\$ 276,72 | R\$ - | R\$ 276,72 | 1.505,01 |
| 16.3 | | PINTURA DE ESQUADRIAS | | | | R\$ 881,61 | | | | | | | | |
| 16.3.1 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 20,12 | R\$ 43,81 | R\$ 881,61 | 3,7 | 0,00 | 23,79 | R\$ 79,29 | R\$ - | R\$ 79,29 | 475,09 |

10575
 Proc. Nº 24/2023
 Ass: [Assinatura]

Chapadinha, 29 de Abril de 2024
 Eng.º A.C. de C. Civil
 C.R.C. 11147/00770

CPF: 051.932.597-27
 [Assinatura]



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO 1º TERMO ADITIVO

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

RDC eletrônico Nº: 024/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

Nº DO CONTRATO: 226/2023

DATA: 29/04/2024

01º TERMO DE ADITIVO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | CONTRATADO | | | CONTRATO + ADITIVO | | | |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | ACRÉSCIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ACRÉSCIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
| 16.3.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 20,12 | R\$ 14,79 | R\$ 297,57 | 3,67 | 0,00 | 23,79 | R\$ 54,28 | - | R\$ 54,28 | R\$ 351,85 |
| 16.3.3 | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 7,49 | R\$ 24,34 | R\$ 182,31 | 3,67 | 0,00 | 11,16 | R\$ 89,33 | - | R\$ 89,33 | R\$ 271,63 |
| 17 | | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | 502497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | ORSE | m3 | 0,30 | R\$ 44,19 | R\$ 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 97,54 |
| 17.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE | SINAPI | M3 | 0,96 | R\$ 65,86 | R\$ 63,23 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 63,23 |
| 17.1.3 | C0096 | REATERRO APLIOADO | SEINFRA | M3 | 0,70 | R\$ 30,07 | R\$ 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 21,05 |
| 17.2 | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | | ALICERCE | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.1 | C3529 | MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 0,30 | R\$ 214,47 | R\$ 64,34 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 64,34 |
| 17.2.2 | | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 0,64 | R\$ 27,02 | R\$ 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 17,29 |
| 17.2.2.2 | 507585 | FORMA PLANA PARA SAPATAS; EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 0,64 | R\$ 48,28 | R\$ 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 30,90 |
| 17.2.2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 20,48 | R\$ 12,98 | R\$ 265,83 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 265,83 |
| 17.2.2.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,26 | R\$ 436,85 | R\$ 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 113,58 |
| 17.2.3 | | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.3.1 | 507519 | FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 0,86 | R\$ 34,00 | R\$ 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 29,24 |
| 17.2.3.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 3,16 | R\$ 12,98 | R\$ 41,02 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 41,02 |
| 17.2.3.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 1,26 | R\$ 16,28 | R\$ 20,51 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 20,51 |
| 17.2.3.4 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 0,06 | R\$ 641,05 | R\$ 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 38,46 |
| 17.2.3.5 | 504953 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | ORSE | m2 | 1,10 | R\$ 25,84 | R\$ 28,42 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 28,42 |
| 17.2.4 | | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.4.1 | 507519 | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 0,86 | R\$ 34,00 | R\$ 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 29,24 |
| 17.2.4.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 3,16 | R\$ 12,98 | R\$ 41,02 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 41,02 |
| 17.2.4.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 1,26 | R\$ 16,28 | R\$ 20,51 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 20,51 |
| 17.2.4.4 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 0,06 | R\$ 641,05 | R\$ 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 38,46 |
| 17.3 | | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | | PILARES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 275,85 | | | | R\$ - | - | R\$ - | R\$ 275,85 |

Ass: 024/2023

Proc. Nº 00576

Ass: 024/2023

CPF: 055.932.593-27

Clayton Soares Abreu
Empenho Civil
CNPJ: 11.111.000/70



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO 1º TERMO ADITIVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC eletrônico Nº: 024/2023
Nº DO CONTRATO: 226/2023

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA -
CNPJ: 39.590.842/0001-86

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

DATA: 29/04/2024

01º TERMO DE ADITIVO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | CONTRATADO | | | | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | | CONTRATO + ADITIVO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITARIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | AGRESSIVO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | A.RESSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
| 17.3.1.1 | 507463 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 1,89 | R\$ 46,16 | R\$ 87,24 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 87,24 |
| 17.3.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 8,64 | R\$ 11,61 | R\$ 100,31 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100,31 |
| 17.3.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2,32 | R\$ 13,58 | R\$ 31,51 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 31,51 |
| 17.3.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,13 | R\$ 436,85 | R\$ 56,79 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 56,79 |
| 17.3.2 | | LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA | | | | R\$ 586,43 | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 586,43 | |
| 17.3.2.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 3,14 | R\$ 186,76 | R\$ 586,43 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 586,43 |
| 17.4 | | ALVENARIA | | | | R\$ 1.134,20 | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.134,20 | |
| 17.4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 14,83 | R\$ 76,48 | R\$ 1.134,20 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.134,20 |
| 17.5 | | REVESTIMENTO | | | | R\$ 180,63 | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 180,63 | |
| 17.5.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 26,96 | R\$ 6,70 | R\$ 180,63 | 0,00 | 0,00 | 26,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 180,63 |
| 18 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | R\$ 2.419,67 | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.419,67 | |
| 18.1 | 112737 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORCIDO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | ORSE | m2 | 3,20 | R\$ 635,87 | R\$ 2.034,78 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.034,78 |
| 18.2 | 503239 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO | ORSE | un | 1,00 | R\$ 267,23 | R\$ 267,23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 267,23 |
| 18.3 | 99803 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 73,08 | R\$ 1,61 | R\$ 117,66 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 117,66 |
| VALOR TOTAL SEM DBI | | | | | | | R\$ 139.961,20 | | | | | | | |
| BDI 22,32% | | | | | | | R\$ 31.239,56 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | R\$ 171.200,65 | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 18.990,09 | R\$ 18.990,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.990,09 | |
| | | | | | | | R\$ 4.238,59 | R\$ 4.238,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.238,59 | |
| | | | | | | | R\$ 23.228,68 | R\$ 23.228,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.228,68 | |
| | | | | | | | 13,57% | 13,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,57% | |
| VALOR DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO: 23.228,68 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) | | | | | | | | | | | | | | |

Chaves de Assinatura: Alzila

Empenho no civil
C.C.A. 111470970

FB 0577

Proc. Nº 024/2023

Ass.

Letícia Lima de Lima da Conceição


CPF: 033.122.593-27



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA REPROGRAMAÇÃO


CHAPADINHA-MA



**OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA-MA**

CONT.: N° 226/2023

MAIO 2024



JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA REPROGRAMAÇÃO

- Obra: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA
- Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA;

1.0 – INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se a apresentar de forma coerente e concisa uma justificativa técnica da necessidade de reprogramação para dar continuidade no contrato de N° 226/2023: referente ao SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. A referida obra é um conserto firmado com fonte de recurso do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEMED) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, que juntos prestam assistência financeira aos diversos setores da área da educação e das melhorias no ensino da cidade, com caráter suplementar, objetivando o desenvolvimento, a reestruturação e o aparelhamento da educação.

2.0 – OBJETIVO

O presente documento tem como finalidade realizar uma avaliação precisa, coerente e verdadeira das necessidades de reprogramação de serviços no projeto, e que se fazem necessários sua execução devido a sua primordialidade no desenvolvimento e melhoria educacional de Chapadinho/MA; atender de forma melhor e mais adequada as intenções de melhorias na qualidade de ensino da população beneficiada com o projeto, além de favorecer e incentivar o desenvolvimento do ensino básico da população chapadinhense.

Este documento, também tem como objetivo prestar orientação aos gestores e demais órgãos ligados ao objeto do contrato; auxiliar na prevenção contra possíveis irregularidades no projeto; evitar desperdício de recursos e incrementar a economicidade; padronizar ações e procedimentos relacionados ao tema; reduzir erros que prejudiquem o alcance dos objetivos propostos pela obra e auxiliar os trabalhos de fiscalização e autoria.

3.0 – DO PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRA

Preliminarmente, cabe esclarecer que o pedido de reprogramação de obra consiste em medida técnica legal e plenamente possível, desde que os fatores ensejadores e permissivos estejam presentes. Nesta seara, relembremos que as obras de engenharia, no orçamento da administração pública, são as que mais exigem recursos disponibilizados, isso se deve pelos vultosos gastos com matérias e mão-de-obra empregados, quer seja nas reformas, ampliações ou construções dos edifícios a ela pertencentes. Os contratos de obras de engenharia, firmados com empreiteiras, não são absolutos nem estanques em suas cláusulas e condições no que se refere ao tempo de execução e ao valor total a ser pago, isto é, no transcorrer da obra, em decorrência de fatores supervenientes, poderão ser acrescidos tanto o prazo, como também, serviços e materiais; estes, gerando maior custo final para a administração pública.

Os acréscimos aos contratos de obras de engenharia, chamados de aditivos, em decorrência de causas não previstas no escopo do contrato firmado entre a administração pública e a empresa executora da obra de engenharia tendem a seguir dois caminhos distintos. O primeiro se dá quando o valor a ser acrescido está dentro dos limites impostos pela lei de

Inferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
C.R.E. 1120800187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

licitações e contratos e segue os trâmites normais do processo administrativo, não parecendo que seja feita nova licitação.

No direito administrativo a legislação autoriza que a administração pública promova a modificação unilateral das cláusulas do contrato, instabilizando a relação contratual diante de causas supervenientes de interesse público. Porém, os dispositivos contratuais que tratam da remuneração do particular nunca poderão sofrer alteração unilateral, à medida que eventuais modificações em tais cláusulas pressupõem a anuência do contrato (MAZZA, 2012, p.386). natureza "Intuitu Personae" – Os contratos antecedidos por um processo licitatório são personalíssimos, ou seja, são elaborados em consonância com as condições pessoais do contratado. Por esse motivo, consta na Lei 8.666/93 a proibição da subcontratação total ou parcial, do seu objeto, a associação do contratado com outrem, entre outras determinações.

Outrossim a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é um direito do contratado, subsidiado constitucionalmente e decorrente do princípio da boa-fé e tendo como fundamentos a teoria da imprevisão e a regra dos "rebus sic stantibus", ambas, visam a manutenção do contrato tal como foi pactuado. Em outras palavras, a Administração é obrigada a alterar a remuneração do contratado, caso advenha circunstância excepcional, tornando mais onerosa à execução do contrato. Deste modo, essa modificação pode ocorrer através de reajuste ou revisão.

4.0 – DA ANÁLISE ESPECÍFICA DO PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO

CONTRATO Nº 226/2023
PROCESSO LICITATÓRIO – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
PROCESSO Nº 3843/2023

Após os esclarecimentos acima citados, passemos a discorrer especificamente sobre o pedido apresentado. E, nesse sentido como se trata de matéria técnica o laudo emitido pelo departamento de engenharia, de lavra do profissional Jefferson Santana Costa Silva – CREA 112089018-7 MA, que será adotado como embasamento. Dito isto, registre-se que após a análise do pedido e planilha orçamentaria apresentados pela contratada, o profissional técnico da prefeitura confirmou a necessidade da aludida reprogramação devendo ser realizados ajustes como: locação geral da obra; escavação manual de vala para bloco; armação de bloco, viga e pilares; concretagens; cobertura; pavimentação; revestimento cerâmico; pontos de iluminação; tubulações hidrossanitárias; esquadrias; pintura interna e externa; grade de ferro.

diante de causas supervenientes de interesse público de todos esses serviços supracitados na planilha orçamentária. Nota-se que o laudo retrata reflexo financeiro de 13,57% sob o valor global contratado. O acréscimo por sua vez, teve como justificativa técnica, concordância de itens e a utilização como referência financeira, considerando tabela SINAP, SEINFRA, ORSE e SBC com valores da época da Tomada de Preço.

Chapadinho – MA, 14 de maio de 2024.

Jefferson Santana Costa Silva

Engenheiro Civil

CREA 1120890187 MA

Jefferson Santana Costa Silva

Eng. Civil CREA 1120890187

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE ENGENHARIA



Assunto: Fiscalização de serviço alterado e acrescentados.

Endereço: Povoado Poço de Pedra, Zona Rural do Município de Chapadinha – MA.

Objeto: Construção De 01 (Uma) Unidade Escolar De 01 Sala E Demais Dependências No Povoado Poço De Pedra, Zona Rural Do Município De Chapadinha-MA.

Responsável Técnicos: Jefferson Santana Costa Silva – Eng.: Civil – CREA – 112089018-7 MA

Data de Elaboração do Laudo: 14 de maio de 2024

INTRODUÇÃO

Durante a execução do contrato os órgãos competentes identificaram a necessidade de adaptações no projeto arquitetônico. Notou-se considerável aumento de demandas por serviços, sendo necessário o aumento do quantitativo dos itens [...]

Além disso, os referidos aumentos de quantitativos também estão relacionados à fatos que apesar de anteriores à contratação, somente foram revelados durante a execução do contrato, que foi o ocorrido do nível do solo, demandando também a alteração do quantitativo da planilha.

OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo mostrar e documentar as alterações executada na referida obra, adequando os cumprimentos do objeto contratual e conseqüentemente do interesse público.

SEGUE EM ANEXO OS PROJETOS ARQUITETÔNICO COM AS ALTERAÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – localização e local da construção da Unidade Escola

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

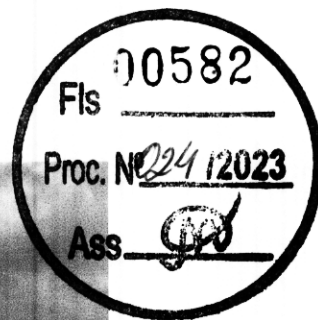


Foto 02 – inclusão de alvenaria para nivelamento da obra.

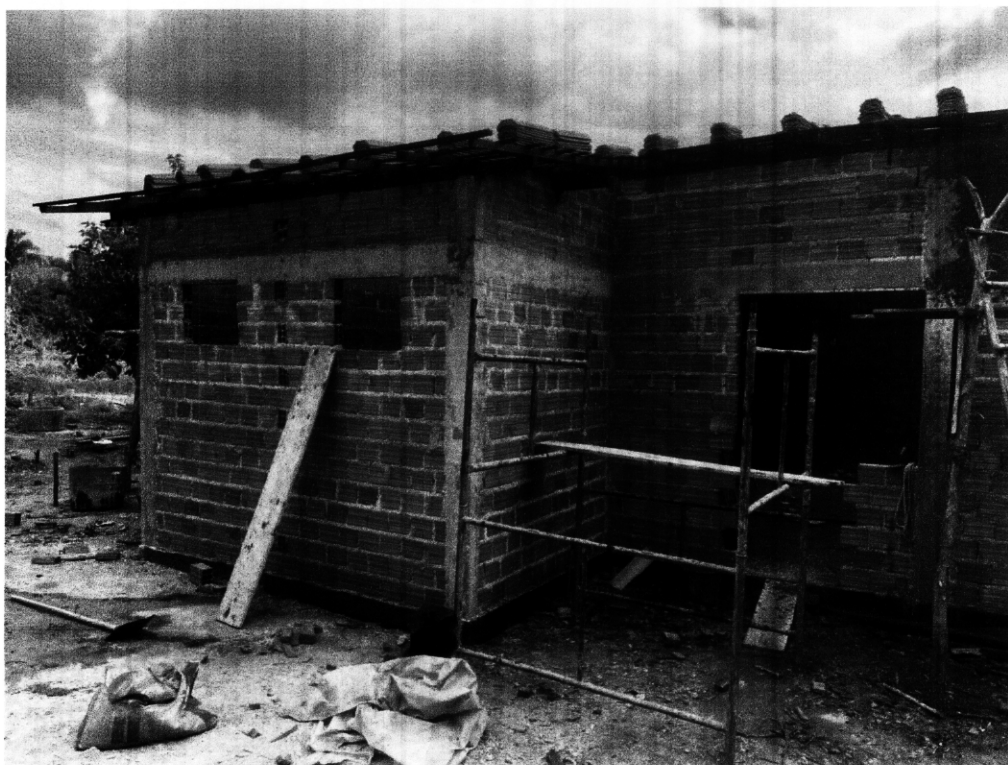


Foto 03 – inclusão de pilares e viga Baldrame e superior, trama de madeira, alvenaria e fundação.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1208800187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Foto 04 – inclusão de serviços: chapisco, reboco, esquadria e calçada



Foto 05 – inclusão de serviços: pintura externa e interna, pavimentação(calçada) e equadria.

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CR 1120300187 MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Foto 06 – inclusão dos serviços: revestimento, ponto hidráulico e sanitário.

Fls 00584

Proc. Nº 0224/2023

Ass. [Signature]

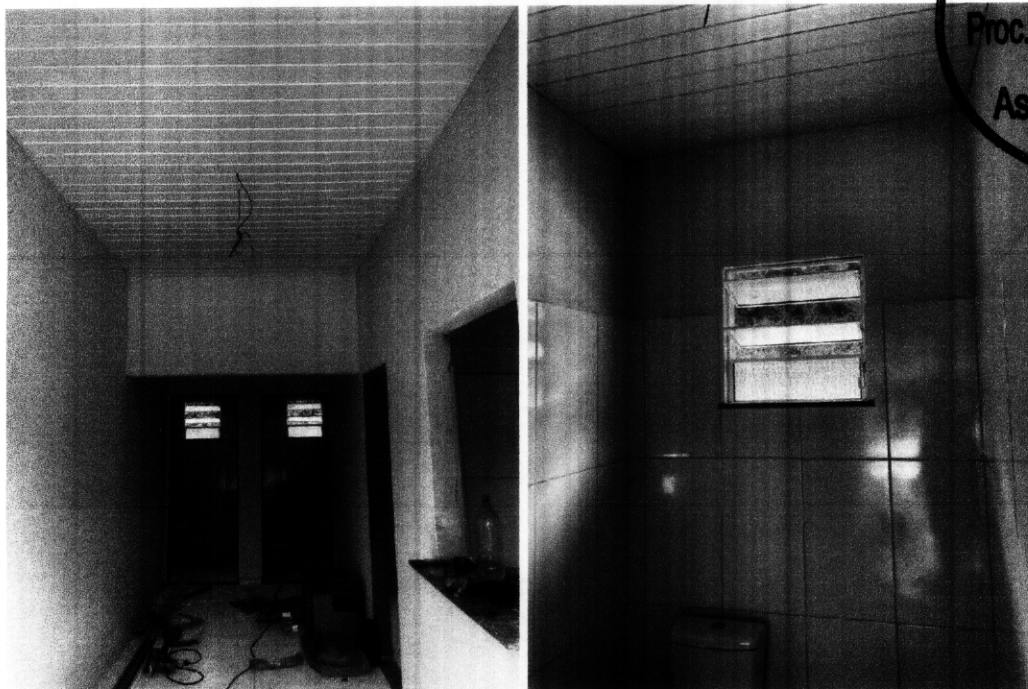


Foto 07 – inclusão dos serviços: forro, pintura interna, esquadrias.

SEGUE EM ANEXO OS PROJETOS ARQUITETÔNICO COM AS ALTERAÇÕES

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CRÉD. 1478000167 1.1A

00585
Fls _____
Proc. Nº 24/2023
Ass. *[Signature]*

Sala
36,00 m²


Hall
8,10 m²

Cozinha
8,78 m²

Secretaria
7,68 m²

Banheiro PNE
3,60 m²

LAVANDERIA
0,95 m²

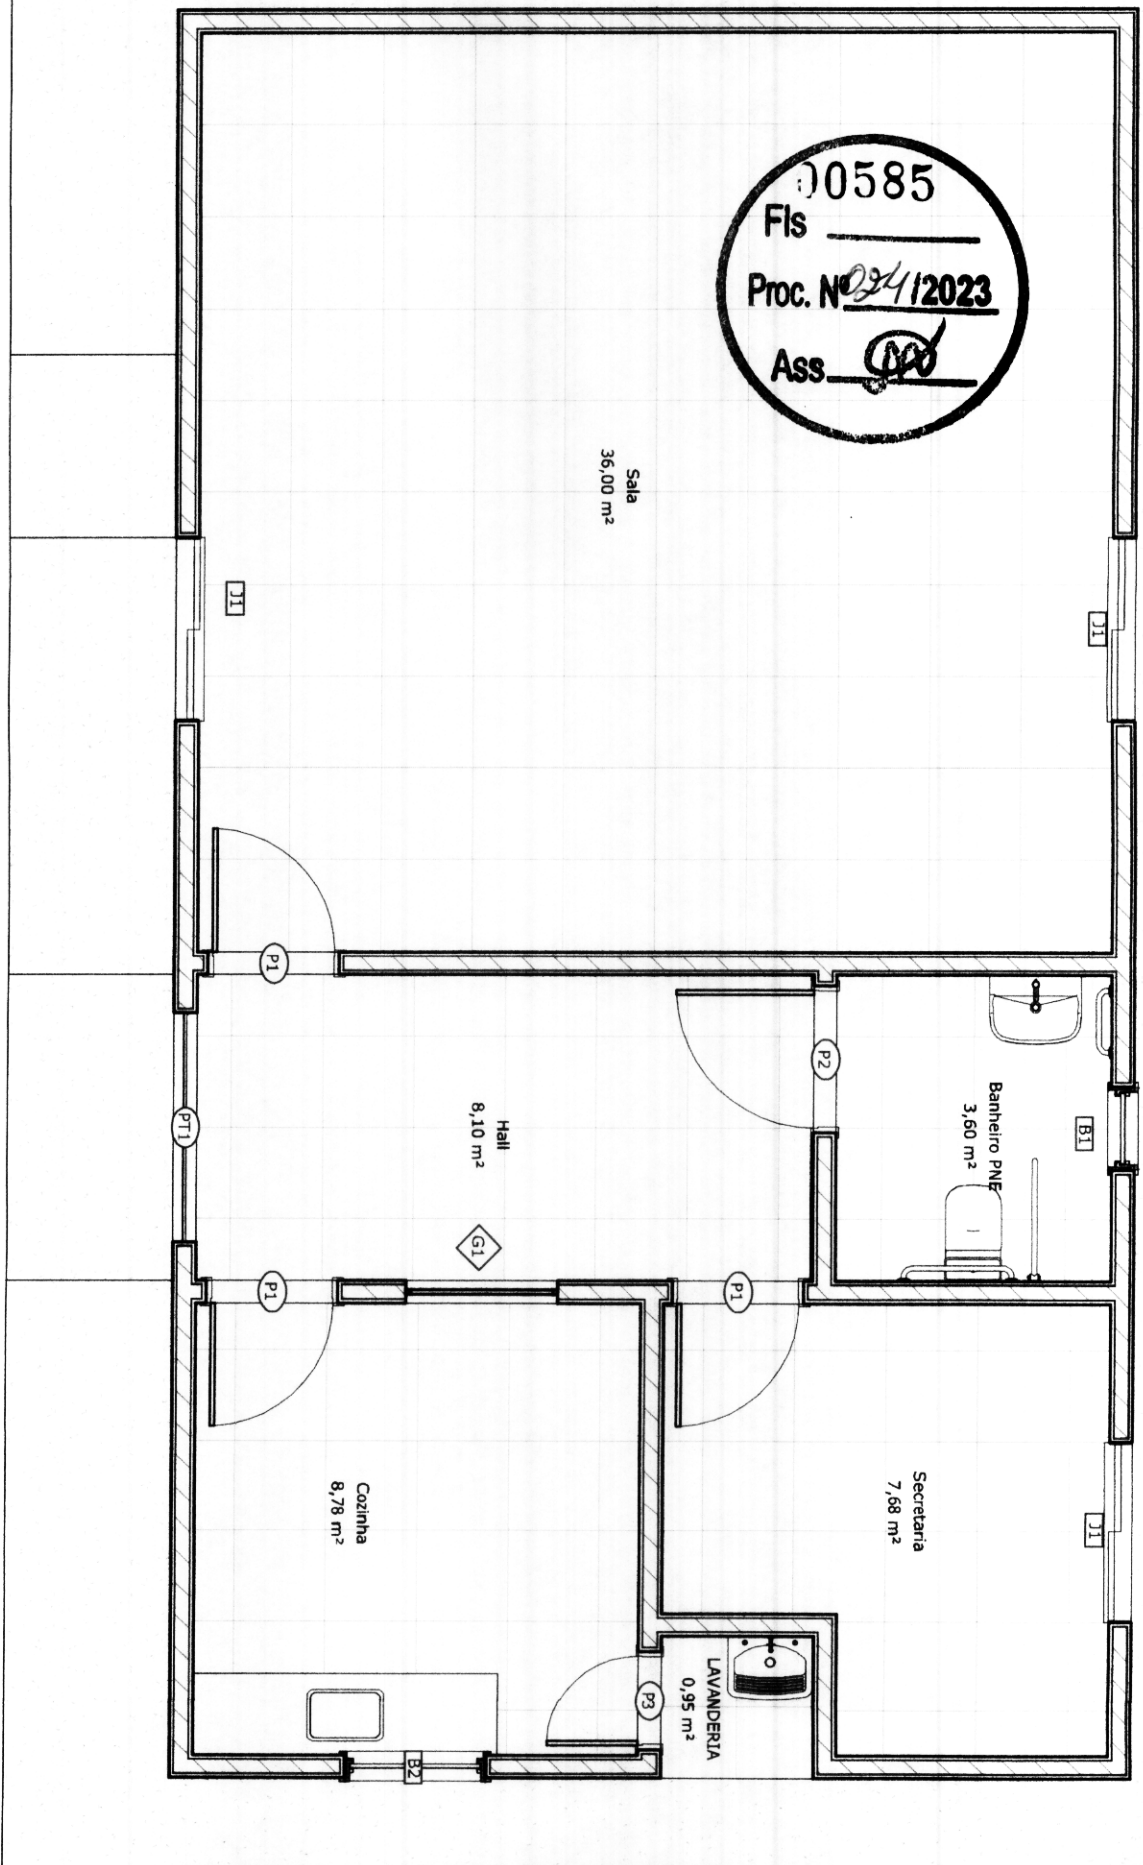

1 02.PLANTA BAIXA
ESCALA 1 : 50

Modelo Licitado

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | | CONTRATO + ADITIVO | | | |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|---------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | AGRESSIVO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO | CONTRATO |
| 1 | 1.1 | 240101 | CAEMA | KM | 90,00 | R\$ 17,17 | R\$ 1.545,30 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | R\$ | R\$ 1.545,30 | R\$ | R\$ | R\$ 1.545,30 |
| 2 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | R\$ 6.631,92 | | | | R\$ | R\$ 6.631,92 | | | R\$ 6.631,92 |
| 2.1 | 511397 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | ORSE | un | 1,00 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | R\$ 750,00 | - | - | R\$ 750,00 |
| 2.2 | C3528 | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 73,08 | R\$ 3,33 | R\$ 243,36 | 7,42 | 0,00 | 80,50 | R\$ | R\$ 243,36 | - | - | R\$ 243,36 |
| 2.3 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 04/2016 | SINAPI | M2 | 6,00 | R\$ 939,76 | R\$ 5.638,56 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ | R\$ 5.638,56 | - | - | R\$ 5.638,56 |
| 3 | | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | | | | | R\$ 6.065,37 | | | | R\$ | R\$ 6.065,37 | | | R\$ 6.065,37 |
| 3.1 | 502497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M | ORSE | m3 | 8,46 | R\$ 44,19 | R\$ 373,85 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | R\$ | R\$ 373,85 | - | - | R\$ 373,85 |
| 3.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF 02/2021 | SINAPI | M3 | 10,29 | R\$ 65,86 | R\$ 677,70 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | R\$ | R\$ 677,70 | - | - | R\$ 677,70 |
| 3.3 | C0095 | APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | SEINFRA | M2 | 16,92 | R\$ 18,67 | R\$ 315,90 | 8,02 | 0,00 | 24,94 | R\$ | R\$ 149,73 | - | - | R\$ 149,73 |
| 3.4 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 | SINAPI | M3 | 72,51 | R\$ 64,79 | R\$ 4.697,92 | 0,00 | 0,00 | 72,51 | R\$ | R\$ 4.697,92 | - | - | R\$ 4.697,92 |
| 4 | | INFRAESTRUTURA | | | | | R\$ 1.814,42 | | | | R\$ | R\$ 1.814,42 | | | R\$ 1.814,42 |
| 4.1 | C3529 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 8,46 | R\$ 214,47 | R\$ 1.814,42 | 0,83 | 0,00 | 9,29 | R\$ | R\$ 1.780,01 | - | - | R\$ 1.780,01 |
| 4.2 | | SAPATAS ISOLADAS | | | | | R\$ 2.481,03 | | | | R\$ | R\$ 2.481,03 | | | R\$ 2.481,03 |
| 4.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017 | SINAPI | M2 | 6,86 | R\$ 27,02 | R\$ 185,36 | 1,46 | 0,00 | 8,32 | R\$ | R\$ 39,45 | - | - | R\$ 39,45 |
| 4.2.2 | 511657 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | ORSE | m2 | 7,84 | R\$ 45,90 | R\$ 359,86 | 0,48 | 0,00 | 8,32 | R\$ | R\$ 22,03 | - | - | R\$ 22,03 |
| 4.2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI | KG | 74,04 | R\$ 12,98 | R\$ 961,04 | 22,21 | 0,00 | 96,25 | R\$ | R\$ 288,29 | - | - | R\$ 288,29 |
| 4.2.4 | 594964S | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | ORSE | m3 | 1,98 | R\$ 492,31 | R\$ 974,77 | 0,42 | 0,00 | 2,40 | R\$ | R\$ 206,77 | - | - | R\$ 206,77 |
| 4.3 | | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR | | | | | R\$ 4.380,96 | | | | R\$ | R\$ 4.380,96 | | | R\$ 4.380,96 |
| 4.3.1 | 511652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | ORSE | m2 | 11,31 | R\$ 48,81 | R\$ 552,04 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | R\$ | R\$ 552,04 | - | - | R\$ 552,04 |
| 4.3.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI | KG | 90,06 | R\$ 14,49 | R\$ 1.304,97 | 9,48 | 0,00 | 99,54 | R\$ | R\$ 137,37 | - | - | R\$ 137,37 |
| 4.3.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | SINAPI | KG | 36,96 | R\$ 16,28 | R\$ 601,71 | 1,85 | 0,00 | 38,81 | R\$ | R\$ 30,12 | - | - | R\$ 30,12 |
| 4.3.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 436,85 | R\$ 738,28 | 0,17 | 0,00 | 1,86 | R\$ | R\$ 74,26 | - | - | R\$ 74,26 |
| 4.3.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 226,27 | R\$ 382,40 | 0,17 | 0,00 | 1,86 | R\$ | R\$ 38,47 | - | - | R\$ 38,47 |
| 4.3.6 | 504953 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZADORA | ORSE | m2 | 31,02 | R\$ 25,84 | R\$ 801,56 | 3,05 | 0,00 | 34,07 | R\$ | R\$ 78,81 | - | - | R\$ 78,81 |
| 5 | | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | | | | | R\$ 4.439,26 | | | | R\$ | R\$ 4.439,26 | | | R\$ 4.439,26 |
| 5.1 | | PILARES | | | | | R\$ 4.439,26 | | | | R\$ | R\$ 4.439,26 | | | R\$ 4.439,26 |
| 5.1.1 | 507463 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 15,85 | R\$ 46,16 | R\$ 731,64 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | R\$ | R\$ 731,64 | - | - | R\$ 731,64 |
| 5.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | KG | 155,48 | R\$ 11,61 | R\$ 1.805,12 | 0,00 | 0,00 | 155,48 | R\$ | R\$ 1.805,12 | - | - | R\$ 1.805,12 |
| 5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | KG | 35,11 | R\$ 13,55 | R\$ 476,79 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | R\$ | R\$ 476,79 | - | - | R\$ 476,79 |
| 5.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | SINAPI | M3 | 2,15 | R\$ 436,85 | R\$ 939,23 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | R\$ | R\$ 939,23 | - | - | R\$ 939,23 |
| 5.1.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 | SINAPI | M3 | 2,15 | R\$ 226,27 | R\$ 486,48 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | R\$ | R\$ 486,48 | - | - | R\$ 486,48 |

Fls 587
 Proc. Nº 24/12023
 Ass. [Assinatura]


| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | CONTRATO + ADITIVO | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
| 01º TERMO DE ADITIVO | | | | | | | | R\$ 3.320,03 | | | | R\$ 252,91 | | R\$ 3.572,94 |
| 5.2 | | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | 511652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO...REVISADA.07.2015 | ORSE | m2 | 11,31 | R\$ 48,81 | R\$ 552,04 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 552,04 |
| 5.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 90,06 | R\$ 11,61 | R\$ 1.045,60 | 9,48 | 0,00 | 99,54 | R\$ 110,06 | R\$ - | R\$ 110,06 | R\$ 1.155,66 |
| 5.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 36,96 | R\$ 16,28 | R\$ 601,71 | 1,85 | 0,00 | 38,81 | R\$ 30,12 | R\$ - | R\$ 30,12 | R\$ 631,83 |
| 5.2.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 436,85 | R\$ 738,28 | 0,17 | 0,00 | 1,86 | R\$ 74,26 | R\$ - | R\$ 74,26 | R\$ 812,54 |
| 5.2.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 1,69 | R\$ 226,27 | R\$ 382,40 | 0,17 | 0,00 | 1,86 | R\$ 38,47 | R\$ - | R\$ 38,47 | R\$ 420,86 |
| 6 | | ALVENARIA E VEDAÇÕES | | | | | R\$ 19.057,93 | | | | | | R\$ 1.595,71 | R\$ 20.653,64 |
| 6.1 | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 178,43 | R\$ 100,77 | R\$ 17.980,39 | 11,57 | 0,00 | 190,00 | R\$ 1.165,91 | R\$ - | R\$ 1.165,91 | R\$ 19.146,30 |
| 6.2 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 7,56 | R\$ 48,73 | R\$ 368,40 | 8,82 | 0,00 | 16,38 | R\$ 429,80 | R\$ - | R\$ 429,80 | R\$ 798,20 |
| 6.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 7,28 | R\$ 97,41 | R\$ 709,14 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 709,14 |
| 7 | | COBERTURA | | | | | R\$ 15.833,47 | | | | | | R\$ 1.081,98 | R\$ 16.915,45 |
| 7.1 | | EDIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 95,57 | R\$ 82,62 | R\$ 7.895,99 | 8,06 | 0,00 | 103,63 | R\$ 665,92 | R\$ - | R\$ 665,92 | R\$ 8.561,91 |
| 7.1.2 | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 2.793,83 | R\$ 2.793,83 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.793,83 |
| 7.1.3 | 503964 | IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR | ORSE | M2 | 95,57 | R\$ 12,32 | R\$ 1.177,42 | 8,06 | 0,00 | 103,63 | R\$ 99,30 | R\$ - | R\$ 99,30 | R\$ 1.276,72 |
| 7.1.4 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 95,57 | R\$ 39,30 | R\$ 3.755,90 | 8,06 | 0,00 | 103,63 | R\$ 316,76 | R\$ - | R\$ 316,76 | R\$ 4.072,66 |
| 7.1.5 | CO387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 24,40 | R\$ 8,62 | R\$ 210,33 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 210,33 |
| 8 | | REVESTIMENTO | | | | | R\$ 13.470,45 | | | | | | R\$ 6.103,77 | R\$ 19.574,23 |
| 8.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 324,42 | R\$ 6,31 | R\$ 2.047,09 | 54,78 | 0,00 | 379,20 | R\$ 345,66 | R\$ - | R\$ 345,66 | R\$ 2.392,75 |
| 8.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 228,30 | R\$ 34,98 | R\$ 7.985,93 | 104,37 | 0,00 | 332,67 | R\$ 3.650,86 | R\$ - | R\$ 3.650,86 | R\$ 11.636,80 |
| 8.3 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 27,81 | R\$ 33,95 | R\$ 944,15 | 18,72 | 0,00 | 46,53 | R\$ 635,54 | R\$ - | R\$ 635,54 | R\$ 1.579,69 |
| 8.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 27,81 | R\$ 75,14 | R\$ 2.089,64 | 18,72 | 0,00 | 46,53 | R\$ 1.406,62 | R\$ - | R\$ 1.406,62 | R\$ 3.496,26 |
| 8.5 | 88649 | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 44,85 | R\$ 90,4 | R\$ 403,64 | 7,20 | 0,00 | 51,85 | R\$ 65,09 | R\$ - | R\$ 65,09 | R\$ 468,72 |
| 9 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 7.792,30 | | | | | | R\$ 872,78 | R\$ 8.665,07 |
| 9.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM CONTRAPISO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 65,80 | R\$ 11,5 | R\$ 756,70 | 7,36 | 0,00 | 72,56 | R\$ 198,87 | R\$ - | R\$ 198,87 | R\$ 1.960,57 |
| 9.2 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE | SINAPI | M2 | 7,36 | R\$ 61,33 | R\$ 451,38 | 7,36 | 0,00 | 7,36 | R\$ 480,83 | R\$ - | R\$ 480,83 | R\$ 4.740,34 |


Fls. 224
 Proc. Nº 224/2023
 Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ATIVO + SUPRESSÃO | | | | CONTRATO + ADITIVO | | | |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO | |
| 9.3 | 5949915 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 8CM | ORSE | m3 | 2,04 | R\$ 660,18 | R\$ 1.346,77 | 0,20 | 0,00 | 2,24 | R\$ 132,04 | R\$ - | R\$ 132,04 | R\$ 1.478,80 | |
| 9.4 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS | SEINFRA | M | 5,70 | R\$ 74,44 | R\$ 424,31 | 0,82 | 0,00 | 6,52 | R\$ 61,04 | R\$ - | R\$ 61,04 | R\$ 485,35 | |
| 10 | | FORRO | | | | R\$ 4.251,04 | | | | | | | R\$ 393,16 | R\$ 4.644,20 | |
| 10.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS | SINAPI | M2 | 65,20 | R\$ 65,20 | R\$ 4.251,04 | 6,03 | 0,00 | 71,23 | R\$ 393,16 | R\$ - | R\$ 393,16 | R\$ 4.644,20 | |
| 11 | | ESQUADRIAS | | | | | R\$ 8.757,53 | | | | | | R\$ 2.389,83 | R\$ 11.147,36 | |
| 11.1 | | PORTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | 503540 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | ORSE | un | 3,00 | R\$ 1.497,93 | R\$ 4.493,79 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.493,79 | |
| 11.1.2 | 503541 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | ORSE | un | 1,00 | R\$ 1.751,21 | R\$ 1.751,21 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 1.751,21 | R\$ - | R\$ 1.751,21 | R\$ 3.502,42 | |
| 11.1.3 | 501756 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | ORSE | un | 1,00 | R\$ 675,40 | R\$ 675,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 675,40 | |
| 11.1.4 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | M2 | 3,15 | R\$ 380,48 | R\$ 1.198,51 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.198,51 | |
| 11.1.5 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 319,31 | R\$ 638,62 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 638,62 | R\$ - | R\$ 638,62 | R\$ 1.277,24 | |
| 11.2 | | JANELAS | | | | | R\$ 2.243,08 | | | | | | R\$ 222,67 | R\$ 2.465,75 | |
| 11.2.1 | 94562 | BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0,80 | R\$ 604,59 | R\$ 483,67 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | R\$ 120,92 | R\$ - | R\$ 120,92 | R\$ 604,59 | |
| 11.2.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 3,96 | R\$ 368,60 | R\$ 1.459,66 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.459,66 | |
| 11.2.3 | 1010410 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25cm | SBC | M | 5,45 | R\$ 55,00 | R\$ 299,75 | 1,85 | 0,00 | 7,30 | R\$ 101,75 | R\$ - | R\$ 101,75 | R\$ 401,50 | |
| 11.3 | | GRADE DE PROTEÇÃO | | | | | R\$ 1.026,14 | | | | | | R\$ 274,35 | R\$ 1.300,50 | |
| 11.3.1 | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS | SEINFRA | M2 | 5,76 | R\$ 178,15 | R\$ 1.026,14 | 1,54 | 0,00 | 7,30 | R\$ 274,35 | R\$ - | R\$ 274,35 | R\$ 1.300,50 | |
| 12 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R\$ 522,08 | | | | | | R\$ - | R\$ 522,08 | |
| 12.1 | | QUADROS E DISJUNTORES | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 157,16 | R\$ 157,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 157,16 | |
| 12.1.2 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 86,88 | R\$ 86,88 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 86,88 | |
| 12.1.3 | C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 114,42 | R\$ 114,42 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 114,42 | |
| 12.1.4 | 18442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 119,10 | R\$ 119,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 119,10 | |
| 12.1.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 9,99 | R\$ 9,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9,99 | |
| 12.1.6 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 11,51 | R\$ 34,53 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34,53 | |
| 12.2 | | PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO | | | | | R\$ 3.376,40 | | | | | | R\$ 173,34 | R\$ 3.549,74 | |
| 12.2.1 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 17,00 | R\$ 36,01 | R\$ 612,17 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | R\$ 36,01 | R\$ - | R\$ 36,01 | R\$ 648,18 | |
| 12.2.2 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 415,92 | R\$ 1.663,68 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.663,68 | |
| 12.2.3 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO [SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA]. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 823,98 | R\$ 823,98 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 137,33 | R\$ - | R\$ 137,33 | R\$ 961,31 | |

Ass: 
 Proc. Nº 24/2023
 R\$ 105.589,17





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Compromisso e Desenvolvimento

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

RDC Técnico N°: 024/2023

TRATADO: 226/2023

01º TERMO DE ADITIVO

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

DATA: 14/05/2024


| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ADITIVO * SUPRESSÃO | | | | CONTRATO * ADITIVO | | | | |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | SUPRESSÃO | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ADITIVO | |
| 12.2.4 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 14,00 | R\$ 118,69 | R\$ 1.661,66 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.661,66 |
| 12.3 | | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | | | R\$ 2.587,10 | | | | R\$ 659,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 659,90 | R\$ 3.247,00 |
| 12.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL | SINAPI | M | 171,00 | R\$ 3,85 | R\$ 658,35 | 129,00 | 0,00 | 300,00 | R\$ 496,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 496,65 | R\$ 1.155,00 |
| 12.3.2 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 44,55 | R\$ 8,42 | R\$ 375,11 | 5,45 | 0,00 | 50,00 | R\$ 45,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,89 | R\$ 421,00 |
| 12.3.3 | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 18,00 | R\$ 9,78 | R\$ 176,04 | 12,00 | 0,00 | 30,00 | R\$ 117,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 117,36 | R\$ 293,40 |
| 12.3.4 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 30,00 | R\$ 25,86 | R\$ 775,80 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 775,80 |
| 12.3.5 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 9,00 | R\$ 9,20 | R\$ 82,80 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 82,80 |
| 12.3.6 | 00798 | CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE | SEINFRA | UN | 100,00 | R\$ 3,76 | R\$ 376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 376,00 |
| 12.3.7 | 009450 | PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA ENTRADA DE ENERGIA | ORSE | un | 1,00 | R\$ 143,00 | R\$ 143,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 143,00 |
| 12.4 | | SISTEMA DE ATERRAMENTO | | | | | R\$ 499,89 | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 499,89 |
| 12.4.1 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2,00 | R\$ 8,42 | R\$ 16,84 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16,84 |
| 12.4.2 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1,50 | R\$ 14,83 | R\$ 22,25 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22,25 |
| 12.4.3 | 503766 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | ORSE | un | 3,00 | R\$ 135,41 | R\$ 406,23 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 406,23 |
| 12.4.4 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 54,57 | R\$ 54,57 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 54,57 |
| 13 | | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | | | | | R\$ 1.006,45 | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.006,45 |
| 13.1 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 118,69 | R\$ 593,45 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 593,45 |
| 13.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 5,00 | R\$ 25,08 | R\$ 125,40 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 125,40 |
| 13.3 | 1375565 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | ORSE | un | 1,00 | R\$ 30,43 | R\$ 30,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30,43 |
| 13.4 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 253,15 | R\$ 253,15 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 253,15 |
| 13.5 | 044112 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | SBC | UN | 1,00 | R\$ 4,02 | R\$ 4,02 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4,02 |
| 14 | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | R\$ 2.336,35 | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.336,35 |
| 14.1 | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | R\$ 2.336,35 | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.336,35 |
| 14.1.1 | 052421 | PONTO DE AGUA FRIA APARENTE TUBOS PVC ROSCAVEIS | SBC | UN | 4,00 | R\$ 92,51 | R\$ 370,04 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 185,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 185,70 | R\$ 555,70 |
| 14.1.2 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 38,44 | R\$ 38,44 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 38,44 |
| 14.1.3 | 00000095 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 10,88 | R\$ 21,76 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 21,76 |




Handwritten signature

01º TERMO DE ADITIVO


| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|---------|---------------|
| | | | | | | UNITÁRIO R\$ | TOTAL R\$ | | | | | | | |
| 14.1.4 | 94482 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 69,74 | R\$ 69,74 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 69,74 |
| 14.1.5 | 103047 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4,00 | R\$ 26,46 | R\$ 105,84 | 0,00 | - R\$ | 4,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 105,84 |
| 14.1.6 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 37,13 | R\$ 37,13 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 37,13 |
| 14.1.7 | 00034636 | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 483,00 | R\$ 483,00 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 483,00 |
| 14.1.8 | 91785 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 9,00 | R\$ 35,77 | R\$ 321,93 | 0,00 | - R\$ | 9,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 321,93 |
| 14.1.9 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 20,00 | R\$ 26,31 | R\$ 526,20 | 0,00 | - R\$ | 20,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 526,20 |
| 14.1.10 | 91788 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 6,00 | R\$ 36,77 | R\$ 220,62 | 0,00 | - R\$ | 6,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 220,62 |
| 14.1.11 | S01169 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM | ORSE | un | 2,00 | R\$ 11,62 | R\$ 23,24 | 0,00 | - R\$ | 2,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 23,24 |
| 14.1.12 | S01167 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM | ORSE | un | 1,00 | R\$ 8,32 | R\$ 8,32 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 8,32 |
| 14.1.13 | S01134 | JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM | ORSE | un | 5,00 | R\$ 7,19 | R\$ 35,95 | 0,00 | - R\$ | 5,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 35,95 |
| 14.1.14 | 00003540 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 4,80 | R\$ 4,80 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 4,80 |
| 14.1.15 | 00001957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 3,00 | R\$ 6,20 | R\$ 18,60 | 0,00 | - R\$ | 3,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 18,60 |
| 14.1.16 | S01079 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 20MM | ORSE | un | 3,00 | R\$ 11,85 | R\$ 35,55 | 0,00 | - R\$ | 3,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 35,55 |
| 14.1.17 | S1040035 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | ORSE | un | 1,00 | R\$ 13,83 | R\$ 13,83 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 13,83 |
| 14.2 | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | R\$ 10.243,57 | R\$ 10.243,57 | | | | R\$ 329,52 | R\$ 329,52 | R\$ | R\$ 10.573,09 |
| 14.2.1 | 053171 | PONTO ESGOTO PRIMÁRIO PVC | SBC | UN | 4,00 | R\$ 118,00 | R\$ 472,00 | 2,00 | - R\$ | 6,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 708,00 |
| 14.2.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 45,05 | R\$ 90,10 | 1,00 | - R\$ | 3,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 135,15 |
| 14.2.3 | 89714 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 12,00 | R\$ 31,20 | R\$ 374,40 | 0,00 | - R\$ | 12,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 374,40 |
| 14.2.4 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 6,00 | R\$ 50,81 | R\$ 304,86 | 0,00 | - R\$ | 6,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 304,86 |
| 14.2.5 | 504883 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M | ORSE | un | 2,00 | R\$ 568,41 | R\$ 1.136,82 | 0,00 | - R\$ | 2,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 1.136,82 |
| 14.2.6 | 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 413,16 | R\$ 413,16 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 413,16 |
| 14.2.7 | C3738 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 48,47 | R\$ 48,47 | 1,00 | - R\$ | 2,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 96,94 |
| 14.2.8 | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1.2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 4.147,76 | R\$ 4.147,76 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 4.147,76 |
| 14.2.9 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 3.096,26 | R\$ 3.096,26 | 0,00 | - R\$ | 1,00 | R\$ | - R\$ | R\$ | R\$ 3.096,26 |


Ass.  2023

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO | |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | UNITÁRIO R\$ | TOTAL R\$ | | | | | | | | |
| 14.2.10 | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 38,10 | R\$ 38,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | - | R\$ | 38,10 | |
| 14.2.11 | C2359 | TÊ PVC BRANCO 2/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 16,65 | R\$ 16,65 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | - | R\$ | 16,65 | |
| 14.2.12 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 13,12 | R\$ 26,24 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | - | R\$ | 26,24 | |
| 14.2.13 | 510318 | JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO | ORSE | un | 2,00 | R\$ 15,06 | R\$ 30,12 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | - | R\$ | 30,12 | |
| 14.2.14 | 00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 2,89 | R\$ 5,78 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | - | R\$ | 5,78 | |
| 14.2.15 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 9,35 | R\$ 9,35 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | - | R\$ | 9,35 | |
| 14.2.16 | 00038423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 33,50 | R\$ 33,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | - | R\$ | 33,50 | |
| 15 | | LOUÇAS-ACCESÓRIOS E METAIS | | | | R\$ 3.617,16 | R\$ 3.617,16 | | | | R\$ 2.553,72 | R\$ | R\$ 2.553,72 | 6.170,88 | |
| 15.1 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 319,31 | R\$ 319,31 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | 319,31 | R\$ | R\$ 319,31 | 638,62 |
| 15.2 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 353,99 | R\$ 353,99 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | 353,99 | R\$ | R\$ 353,99 | 707,98 |
| 15.3 | 00001747 | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 190,64 | R\$ 190,64 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | 190,64 | R\$ | R\$ 190,64 | 381,28 |
| 15.4 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 79,26 | R\$ 79,26 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | 79,26 | R\$ | R\$ 79,26 | 158,52 |
| 15.5 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 729,89 | R\$ 729,89 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | 729,89 | R\$ | R\$ 729,89 | 1.459,78 |
| 15.6 | 86885 | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R\$ 10,84 | R\$ 21,68 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ | 21,68 | R\$ | R\$ 21,68 | 43,36 |
| 15.7 | 102016 | SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR. | ORSE | un | 1,00 | R\$ 178,60 | R\$ 178,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | - | R\$ | R\$ 178,60 | |
| 15.8 | 510759 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | ORSE | m2 | 1,10 | R\$ 443,86 | R\$ 488,25 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | R\$ | - | R\$ | R\$ 488,25 | |
| 15.9 | C4636 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÁ E ACCESÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 497,81 | R\$ 497,81 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | 497,81 | R\$ | R\$ 497,81 | 995,62 |
| 15.10 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO, AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R\$ 361,14 | R\$ 361,14 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ | 361,14 | R\$ | R\$ 361,14 | 722,28 |
| 15.11 | 5869115 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | ORSE | un | 1,00 | R\$ 79,40 | R\$ 79,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | - | R\$ | R\$ 79,40 | |
| 15.12 | 1000708 | TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL REF.2085 | SBC | UN | 1,00 | R\$ 317,19 | R\$ 317,19 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ | - | R\$ | R\$ 317,19 | |
| 16 | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | R\$ 4.749,26 | R\$ 4.749,26 | | | | R\$ 281,74 | R\$ | R\$ 281,74 | 5.031,00 | |
| 16.1 | | PINTURA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 169,92 | R\$ 2,99 | R\$ 508,06 | 10,08 | 0,00 | 180,00 | R\$ | 30,14 | R\$ | R\$ 538,20 | |
| 16.1.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 169,92 | R\$ 13,82 | R\$ 2.348,29 | 10,08 | 0,00 | 180,00 | R\$ | 139,31 | R\$ | R\$ 2.487,60 | |
| 16.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 169,92 | R\$ 11,14 | R\$ 1.892,91 | 10,08 | 0,00 | 180,00 | R\$ | 112,29 | R\$ | R\$ 2.005,20 | |
| 16.2 | | PINTURA EXTERNA | | | | R\$ 1.557,98 | R\$ 1.557,98 | | | | R\$ 350,99 | R\$ | R\$ 350,99 | 1.908,97 | |
| 16.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 110,26 | R\$ 2,99 | R\$ 329,68 | 24,84 | 0,00 | 135,10 | R\$ | 74,27 | R\$ | R\$ 403,95 | |
| 16.2.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 10,26 | R\$ 11,14 | R\$ 1.228,30 | 24,84 | 0,00 | 135,10 | R\$ | 276,72 | R\$ | R\$ 1.505,01 | |
| 16.3 | | PINTURA DE ESQUADRIAS | | | | R\$ 881,68 | R\$ 881,68 | | | | | | | | |
| 16.3.1 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 20,12 | R\$ 19,97 | R\$ 401,80 | 3,67 | 0,00 | 23,79 | R\$ | 75,29 | R\$ | R\$ 475,09 | |
| 16.3.2 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 20,12 | R\$ 14,79 | R\$ 297,57 | 3,67 | 0,00 | 23,79 | R\$ | 54,28 | R\$ | R\$ 351,85 | |
| 16.3.3 | 100754 | PINTURA COM TINTA AGRÍCOLA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 7,49 | R\$ 24,34 | R\$ 182,31 | 3,67 | 0,00 | 11,16 | R\$ | 89,33 | R\$ | R\$ 271,63 | |
| 17 | | BASE PARA CAIXA D'ÁGUA | | | | R\$ 97,54 | R\$ 97,54 | | | | | | | | |
| 17.1 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | | | 97,54 | |



| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | CONTRATQ + ADITIVO | | |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|---------|-------------|
| | | | | | | | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO |
| 17.1.1 | 502497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | ORSE | m3 | 0,30 | R\$ 44,19 | R\$ 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,26 |
| 17.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE | SINAPI | M3 | 0,96 | R\$ 65,86 | R\$ 63,23 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 63,23 |
| 17.1.3 | 0096 | REATERRO APILOADO | SEINFRA | M3 | 0,70 | R\$ 30,07 | R\$ 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21,05 |
| 17.2 | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | | ALICERCE | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.1 | C3529 | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 0,30 | R\$ 214,47 | R\$ 64,34 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 64,34 |
| 17.2.2 | | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 17.2.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 0,64 | R\$ 27,02 | R\$ 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17,29 |
| 17.2.2.2 | 507585 | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 0,64 | R\$ 48,28 | R\$ 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 30,90 |
| 17.2.2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 20,48 | R\$ 12,98 | R\$ 265,83 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 265,83 |
| 17.2.2.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,26 | R\$ 436,85 | R\$ 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 113,58 |
| 17.2.3 | | CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR | | | | | | | | | | | |
| 17.2.3.1 | 507519 | FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 0,86 | R\$ 34,00 | R\$ 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ 29,24 |
| 17.2.3.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 3,16 | R\$ 12,98 | R\$ 41,02 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 41,02 |
| 17.2.3.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 1,26 | R\$ 16,28 | R\$ 20,51 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20,51 |
| 17.2.3.4 | 96555 | MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 0,06 | R\$ 641,05 | R\$ 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 38,46 |
| 17.2.3.5 | 504953 | TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | ORSE | m2 | 1,10 | R\$ 25,84 | R\$ 28,42 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 28,42 |
| 17.2.4 | | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 17.2.4.1 | 507519 | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 0,86 | R\$ 34,00 | R\$ 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ 29,24 |
| 17.2.4.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 3,16 | R\$ 12,98 | R\$ 41,02 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 41,02 |
| 17.2.4.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 1,26 | R\$ 16,28 | R\$ 20,51 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20,51 |
| 17.2.4.4 | 96555 | MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 0,06 | R\$ 641,05 | R\$ 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 38,46 |
| 17.3 | | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | | PILARES | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1.1 | 507463 | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | ORSE | m2 | 1,89 | R\$ 46,16 | R\$ 87,24 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ 87,24 |
| 17.3.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 8,64 | R\$ 11,61 | R\$ 100,31 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 100,31 |
| 17.3.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2,32 | R\$ 13,58 | R\$ 31,51 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 31,51 |
| 17.3.1.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,13 | R\$ 436,85 | R\$ 56,79 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 56,79 |

Ass. 
 Proc. Nº 24/2023
 Fs 10592




01º TERMO DE ADITIVO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ADITIVO + SUPRESSÃO | | | CONTRATO + ADITIVO | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|------------|---------|--------------|--|
| | | | | | | | | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | CONSOLIDADO | ACRÉSSIMO | SUPRESSÃO | ADITIVO | CONSOLIDADO | |
| 17.3.2 | | LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA | | | | R\$ 586,43 | | | | | | R\$ 586,43 | | | |
| 17.3.2.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF. 11/2020 | SINAPI | M2 | 3,14 | R\$ 186,76 | R\$ 586,43 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 586,43 | |
| 17.4 | | ALVENARIA | | | | R\$ 1.134,20 | | | | | | | | R\$ 1.134,20 | |
| 17.4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021 | SINAPI | M2 | 14,83 | R\$ 76,48 | R\$ 1.134,20 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.134,20 | |
| 17.5 | | REVESTIMENTO | | | | R\$ 180,63 | | | | | | | | R\$ 180,63 | |
| 17.5.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014 | SINAPI | M2 | 26,96 | R\$ 6,70 | R\$ 180,63 | 0,00 | 0,00 | 26,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 180,63 | |
| 18 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | R\$ 2.419,67 | | | | | | | | R\$ 2.419,67 | |
| 18.1 | 112737 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | ORSE | m2 | 3,20 | R\$ 635,87 | R\$ 2.034,78 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.034,78 | |
| 18.2 | 503239 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO | ORSE | un | 1,00 | R\$ 267,23 | R\$ 267,23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 267,23 | |
| 18.3 | 99803 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 73,08 | R\$ 1,61 | R\$ 117,66 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 117,66 | |
| VALOR TOTAL SEM DBI | | | | | | | R\$ 139.961,29 | | | | | | | | |
| BDI 22,32% | | | | | | | R\$ 31.239,36 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | R\$ 171.200,65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| VALOR DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO: R\$ 23.228,68 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) | | | | | | | | | | | | | 13,57% | | |
| VALOR DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO: R\$ 13,57% (TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO CENTAVOS) | | | | | | | | | | | | | 0,00% | | |

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CRP 112060/MA

Fls 00593
 Proc. Nº 294/2023
 Ass. [Assinatura]



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO


O Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, convoca a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, representada pelo Sr. Kerlly Kaio de Lima da Conceição, portador do CPF nº021.338.003-01, para assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 226/2023- RDC Eletrônico nº 024/2023.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.


Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinho, 10 de Maio de 2024

Atenciosamente,


Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação





PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 226/2023 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N° 024/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2167/2024. APENSO AO PROC. ADMINISTRATIVO: 3843/2023.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ N° 30.887.156/0001-05, sediada na Avenida Vitorino Freire n° 1045 - Terras Dura, Chapadinho - MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, localizada Rua 16, N° 07, Qda 37 - Residencial Esplanada, CEP: 65.500-000, Chapadinho/MA, neste ato representado por Kerlly Kaio de Lima da Conceição, brasileiro, natural de Chapadinho - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portadora da Carteira de Identidade n° 043133132011-1 SSP-MA e CPF n° 053.823.563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, N° 937, Bairro: Areal, Chapadinho - MA, Cep: 65.500-00, doravante denominada **CONTRATADA**, ao final assinado, ajustar entre si o presente Termo Aditivo de valor do Contrato n° 226/2023, de acordo com o que prescreve o Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, decorrente do Regime Diferenciado de Contratação n° 024/2023, oriunda do processo Administrativo n° 3843/2023, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 Constitui objeto do presente instrumento aditivar em aproximadamente em **13,57% (treze virgula cinquenta e sete por cento)** do Contrato n° 226/2023, para execução dos **serviços de construção predial da Unidade Escolar de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinho.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ATUALIZADO.

3.1. A alteração resultante constante desta Cláusula corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto será de aproximadamente **13,57% (treze virgula cinquenta e sete por cento)** da quantidade inicial do contrato n° 226/2023, que passa a ser **23.228,68 (vinte e três mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos)**. Sendo esse valor pago de acordo com a execução dos serviços demonstrados conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

4.1 Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO.

5.1. Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 02.12.04 | FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA |
| 12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - E. F. 30% |




44.90.51.00

Obras e Instalações


CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

6.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de contratação original que não tenham sido alteradas. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Chapadinha - MA, 10 de Maio de 2024.


NARA DA SILVA MACEDO

Representante legal da CONTRATANTE




KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO

Representante legal da CONTRATADA

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação


2



**EXTRATO TERMO ADITIVO**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE QUANTITATIVO. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2023/PMCH. REF. RDC ELETRÔNICO Nº 024/2023. PROC. ADM. 2167/2024 (APENSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3843/2023) — PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 39.590.842/0001-86. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento aditiva o valor do Contrato nº 226/2023, para Contratação de empresa especializada nos serviços de construção Predial da Unidade Escolar de 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinho. Aditivo de Valor total R\$23.228,68. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA; 12.361.0016.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%; 44.90.51.00 Obras e Instalações. BASE LEGAL: Art. art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93 SIGNATÁRIOS: Chapadinho/MA, 10 de Maio de 2024. Nara da Silva Macedo, Secretária Municipal de Educação.

Chapadinho/MA, 10 de Maio de 2024

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de EducaçãoPrefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 39.590.842/0001-86
Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA CELINA ARAUJO 937 / AREAL / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 14/05/2024 a 12/06/2024

Certificação Número: 2024051407475967041131

Informação obtida em 14/05/2024 11:34:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Mem. N° 068/2024


Chapadinho/MA, 15 de Maio de 2024

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Compras

Assunto: Encaminhamento de Ofício

Com os cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar o ofício abaixo relacionado para análises e devidas providências.


- **OFC – 251/2024 – GAB SINURB**, referente a eventual contratação de Empresa Especializada para Serviços de Construção da U.E. de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, no Município de Chapadinho-MA.
- **RDC N° 024/2023 Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.**



Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Antônia Alves
Prefeitura Mun. de Chapadinho
Assessora de Gabinete



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEGUNDA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3357 – PÁGINAS: 07

ATOS MUNICIPAIS

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **T. L. DOS SANTOS E CIA LTDA**, CNPJ: **10.942.196/0001-97**, doravante denominada **CONTRATADA, RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo de acréscimo no quantitativo, oriundo do Contrato nº 319/2023 do Pregão Eletrônico nº 027/2023-SRP, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato de acordo com o Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, consubstanciado nas seguintes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**. 1.1 O presente Termo Aditivo terá o acréscimo de 25% nos itens do contrato, ficando o aditivo no valor total de **R\$ 31.062,50 (trinta e um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**. **CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**. Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**. As despesas decorrentes deste aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02.33.00 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO |
| 08.181.0003.2011.0000 | Manutenção da Guarda Municipal |
| 02.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SEG. PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO |
| 26.782.0006.2148.0000 | MANUTENÇÃO e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo. |

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação. **CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO**. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. Chapadinha - MA, 13 de Março de 2024. **VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA**/Secretária Adjunta de Administração/CONTRATANTE

EXTRATO TERMO ADITIVO

PROC. ADM Nº 1194/2024

APENSO AO PROCESSO ADM. Nº 4557/2023 – PMCH

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 129/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) E ÓLEOS LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **T. L. DOS SANTOS E CIA LTDA**, CNPJ: **10.942.196/0001-97**, por intermédio do proprietário e representante legal o Sr. **Shicleiton de Sousa Silva**, empresário, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 017074082001-0 SSP-MA e CPF: 006.890.903-90, doravante denominada **CONTRATADA, RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo de acréscimo no quantitativo, oriundo do Contrato nº 129/2023 do Pregão Eletrônico nº 027/2023-SRP, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato de acordo com o Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, consubstanciado nas seguintes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**. 1.1 O presente Termo Aditivo terá o acréscimo de 25% nos itens do contrato, ficando o aditivo no valor total de **R\$ 175.875,00 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais)**. **CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**. Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**. As despesas decorrentes deste aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 02.07.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo |

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação. **CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO**. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. Chapadinha - MA, 13 de Março de 2024. **VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA**/Secretária Adjunta de Administração/CONTRATANTE.

EXTRATO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2023 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2167/2024. APENSO AO PROC. ADMINISTRATIVO: 3843/2023.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, doravante denominada **CONTRATADA**, ao final assinado, ajustar entre si o presente Termo Aditivo de valor do Contrato nº 226/2023, de acordo com o que prescreve o Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, decorrente do Regime Diferenciado de Contratação nº 024/2023, oriunda do processo Administrativo nº 3843/2023, que passa a ter a seguinte redação, permanecendo as demais estipulações: **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**. 1.1 Constitui objeto do presente instrumento aditivo em aproximadamente em **13,57% (treze virgula cinquenta e sete por cento)** do Contrato nº 226/2023, para execução dos **serviços de construção predial da Unidade Escolar de 01 sala**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58

Página 4 de 7



Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3357 – PÁGINAS: 07

ATOS MUNICIPAIS

de aula e demais dependências no Povoado Poço de Pedra, zona rural de Chapadinha. **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ATUALIZADO.** 3.1. A alteração resultante constante desta Cláusula corresponde a um acréscimo do quantitativo do objeto será de aproximadamente **13,57% (treze virgula cinquenta e sete por cento)** da quantidade inicial do contrato nº 226/2023, que passa a ser **23.228,68 (vinte e três mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos)**. Sendo esse valor pago de acordo com a execução dos serviços demonstrados conforme planilha em anexo. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.** 4.1 Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. **CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO.** 5.1. Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 02.12.04 | FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA |
| 12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30% |
| 44.90.51.00 | Obras e Instalações |

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 6.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do instrumento de contratação original que não tenham sido alteradas. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. Chapadinha - MA, 10 de Maio de 2024. NARA DA SILVA MACEDO/Representante legal da CONTRATANTE.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 1607/2024-SRP. Processo Adm. nº 1607/2024. Objeto: **Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos hospitalares, sendo eles: Mamógrafo Digital; Mamógrafo Analógico e Digitalizador de imagens de Mamografia de interesse da Rede Municipal de Saúde de Chapadinha**; Abertura: **31/05/2024 às 08:30h**; Endereço Eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chapadinha, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha- MA – CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadinha2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce> e <https://app.tcema.tc.br/sistemacontratamaterial/procedimento>. Chapadinha/MA, 15 de Maio de 2024. Luciano de Souza Gomes – Pregoeiro.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CHAPADINHA

PORTARIA Nº47/2024

Dispõe sobre a retificação de aposentadoria nº 02/2012 da senhora **JACINTA CUNHA ALMEIDA FERRERIA** Cargo Professora, Classe II, referência 12 dá outras providências.

MARIA COELHO PIMENTEL GOMES DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CHAPADINHA - ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art.1º Fica aposentada por tempo de contribuição a servidora **JACINTA CUNHA ALMEIDA FERRERIA** Cargo Professora, Classe II, referência 12, do quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais, nos termos do art. 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c o §5º do Art. 40 da Constituição Federal, c/c dispositivo da Lei do Município de Chapadinha – Ma, Lei nº 1.000/05, tendo em vista o Processo nº 45/2011 conforme discriminação das seguintes parcelas:

- I – Vencimento do Cargo de Professora - R\$ 761,82 (setecentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos);
- II – Quinquênio 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o vencimento do cargo efetivo - R\$ 190,46 (cento e noventa reais e quarenta e seis centavos) de acordo com o art. 290 da lei 472/78 – Estatuto do Servidor Público;
- III – Titulação- 10% (dez por cento) calculado sobre o vencimento do cargo efetivo – R\$ 76,18 (setenta e seis reais e dezoito centavos) de acordo com o art. 35 "b", seção II, subseção I da lei 1.099/2009;
- IV – Incentivo 15% (quinze por cento) calculado sobre o vencimento do cargo efetivo – R 114,27 (cento e quatorze reais e vinte e sete centavos; de acordo com o art. 37, inciso I da lei 1.099/2009
- V - Remuneração total de R\$ 1.142,73 (mil cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se a portaria nº 02/2012

Chapadinha – MA, 17 de junho de 2024

MARIA COELHO PIMENTEL GOMES

Diretora Presidente do IPC
